หน่วยที่ 10

การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผล เพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย



ชื่อ อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย

วุฒิ กส.บ. (กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Agricultural Economics) University of Kentucky
M.S. (Statistics) Iowa State University
Ph.D. (Economics) Iowa State University

ตำแหน่ง อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 10

แผนการสอนประจำหน่วย

ชุดวิชา หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 10 การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตอนที่

10.1 การนิเทศและการติดตามเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
10.2 การประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
10.3 ตัวชี้วัดในการประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

แนวคิด

1. การติดตามและการนิเทศงานเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ผู้บริหารองค์การหรือบริหารงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะต้องทำความเข้าใจและดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
2. การประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ซึ่งจะต้องมีรูปแบบการประเมินผลที่เป็นระบบ มีตัวชี้วัดและกรอบเวลาที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ทำการประเมินผล ผู้รับการประเมินผล และผู้ใช้ประโยชน์จากการประเมินผล
3. ตัวชี้วัดในการประเมินผลการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร เป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของการดำเนินงานขององค์การเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยตัวชี้วัดจะมีลักษณะต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดที่เป็นค่าเฉลี่ย สัดส่วน ร้อยละ อัตราส่วนหรือคะแนน เป็นต้น ทั้งนี้การสร้างตัวชี้วัดให้เหมาะสมตรงประเด็นและสอดคล้องกับสถานการณ์และลักษณะของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะประเมิน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ต้องกำหนดให้มีตัวชี้วัดในทุกกิจกรรมของการดำเนินงานหรืออย่างน้อยในกิจกรรมที่สำคัญ และถ้าเป็นการประเมินผลโครงการที่มีขอบเขตกว้างขวางก็จะต้องจัดทำเป็นโครงการประเมินผลอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาหน่วยที่ 10 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายแนวคิดและกระบวนการนิเทศและการติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
2. อธิบายถึงกระบวนการในการประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
3. อธิบายถึงการสร้างตัวชี้วัดในการประเมินผลกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรได้

กิจกรรมระหว่างเรียน

1. ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 10.1–10.3
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์
5. ชมรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษา (ถ้ามี)
6. ทำกิจกรรมประจำชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
8. ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 10

สื่อการสอน

1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ถ้ามี)
4. รายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษา (ถ้ามี)
5. กิจกรรมประจำชุดวิชา (ถ้ามี)

การประเมินผล

1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากกิจกรรมประจำชุดวิชา (ถ้ามี)
4. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจำภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 10 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป

บทนำ

ในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้บริหารองค์การหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในการบริหารงานเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะมีบทบาทและภารกิจไม่แตกต่างไปจากการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การ ทั้งองค์การภาครัฐหรือองค์การภาคเอกชน โดยจะต้องทำหน้าที่ในการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) หรือเรียกย่อๆ ว่า "POCCC" ซึ่งในภารกิจทั้ง 5 ประการดังกล่าวนี้ ในการบริหารงานนั้นผู้บริหารสูงสุดขององค์การจะต้องดำเนินการให้มีการจัดทำแผนเพื่อใช้เป็นทิศทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ซึ่งแผนที่จัดทำขึ้นในขั้นตอนของผู้บริหารระดับสูงนี้จะเรียกว่า แผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ซึ่งผู้บริหารในระดับรองลงมาจะต้องนำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป ซึ่งในแผนปฏิบัติการนั้นอาจเป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติงานตามปกติเป็นประจำขององค์การ (routine work) หรือเป็นลักษณะแผนงานหรือโครงการ (project) ที่มีกรอบเวลาที่แน่นอนก็ได้ ซึ่งงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรส่วนใหญ่มักจะอยู่ในลักษณะของแผนงานหรือโครงการ เช่น แผนงานพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกร เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามปกติหรืองานที่มีสภาพเป็นแผนงานหรือโครงการก็ตาม ผู้บริหารองค์การจะต้องกำหนดให้มีกิจกรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรมที่สำคัญ คือ การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผล ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานขององค์การที่กำหนดไว้ ซึ่งก่อนการดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ผู้บริหารจะต้องมีการจัดองค์การให้เหมาะสมทั้งโครงสร้างองค์การและอัตรากำลัง รวมทั้งงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินงาน มีการสั่งการหรือมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่อง และมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกโครงการ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด โดยใช้ผลของการดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมที่กล่าวมาแล้วเป็นข้อพิจารณาในการดำเนินการหรือสั่งการ ทั้งนี้ขั้นตอนและกระบวนการของทั้ง 3 กิจกรรมนี้จะมีทั้งส่วนคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานตามปกติหรือการบริหารแผนงานโครงการก็ตาม สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะได้กล่าวอย่างละเอียดในแต่ละเรื่องในแต่ละตอนต่อไป

ตอนที่ 10.1
การนิเทศและการติดตามเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง

10.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
10.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

แนวคิด

1. เพื่อให้การบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จำเป็นจะต้องมีการนิเทศงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน
2. การติดตามเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารงานส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร เพราะจะทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบงานนี้จะต้องกำหนดให้มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นและหากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 10.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญและกระบวนการนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
2. อธิบายความหมาย ความสำคัญและกระบวนการติดตามในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

เรื่องที่ 10.1.1
แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การนิเทศเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้บริหารองค์การที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเกษตรหรือด้านอื่นๆ ก็ตาม โดยเฉพาะองค์การที่มีขนาดใหญ่ มีบุคคลจำนวนมากและมีระบบการบังคับบัญชาหลายระดับชั้น มีการสั่งการผ่านกันเป็นทอดๆ ทำให้มีช่องว่างในการรับรู้แตกต่างระหว่างต้นทางกับปลายทาง (information gap) เช่น ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย ดังนั้นผู้บริหารองค์การหรือผู้บริหารงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญของกิจกรรมการนิเทศงาน

ความหมายของการนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

คำว่า “การนิเทศ” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายคนในหลายๆ ด้าน ในส่วนของการนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้น เอ็นนู ซื่อสุวรรณ (2554) ได้ประมวลคำนิยามของคำว่า “การนิเทศ” จากหลายๆ แหล่ง อาทิ บุญธรรม จิตต์อนันต์ (2536) ทำนอง สิงคาลวณิช (2526) นที ขลิบทอง (2526) สุรพล จันทราปัตย์ (2536) และสรุปได้ว่า การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรมีความหมายครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. เป็นกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่เน้นบุคคลที่เกี่ยวข้องมากกว่างานที่ปฏิบัติ
2. เป็นการติดตามให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. ช่วยประสานความร่วมมือและความสามัคคีให้เกิดขึ้นทุกฝ่าย เพราะไม่ใช่สั่งการหรือจับผิด
4. สร้างขวัญกำลังใจและจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
5. พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
6. เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ

ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ซึ่งหมายถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจงานส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเจตนารมณ์ขององค์การ

วัตถุประสงค์ของการนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

วัตถุประสงค์ของการนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมีดังนี้

1. เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่เข้าใจในภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน
3. เพื่อให้ผู้บริหารทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามแผน
4. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเพียงลำพัง
5. เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตื่นตัวอยู่เสมอ ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้
6. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่อาจขาดการปฏิสัมพันธ์หรืออยู่ห่างไกลจากส่วนกลางที่เป็นผู้มอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ความสำคัญของการนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การนิเทศเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในด้านการเกษตรและนอกการเกษตรควรนำไปปฏิบัติ สำหรับการนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมีความสำคัญดังนี้

1. ช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่อาจจะไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
2. สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากผู้นิเทศได้รับทราบข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยตนเอง
3. ผู้นิเทศได้รับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การในการนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ปฏิบัติงาน
4. ผู้รับการนิเทศได้รับการพัฒนาและเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
5. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

องค์ประกอบของการนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วย ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ และประเด็นที่จะนิเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้นิเทศ ผู้ทำหน้าที่นิเทศงานอาจเป็นบุคคลเดียวหรือเป็นคณะบุคคลก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น เนื้อหาของการนิเทศ ความเป็นเอกภาพ และจำนวนผู้เข้ารับการนิเทศ เป็นต้น เช่น ถ้ามีเนื้อหาที่ต้องนิเทศมาก ผู้นิเทศต้องมีลักษณะเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญแต่ละเรื่อง หรือถ้ามีผู้เข้าร่วมรับการนิเทศมากและอยู่กระจัดกระจายก็จะต้องให้มีผู้นิเทศหลายคน โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีหลายคนมากเกินไปอาจขาดความเป็นเอกภาพระหว่างผู้นิเทศเองก็ได้

1.1 คุณสมบัติของผู้นิเทศ การนิเทศงานจะเกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้นิเทศงานต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะทำการนิเทศอย่างถ่องแท้

1.1.2 มีความอาวุโสในตำแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าผู้รับการนิเทศและมีภาวะผู้นำเพื่อสามารถโน้มน้าวให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติตามตามคำแนะนำ

1.1.3 มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับการนิเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับการนิเทศได้รับประโยชน์จากการนิเทศงานมากกว่าการมาจับผิดผู้ปฏิบัติงาน

1.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย ทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา เพื่อที่จะสามารถสื่อสารข้อเท็จจริง ปัญหาและข้อเสนอแนะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตรงกับความเป็นจริง

1.2 บทบาทและหน้าที่ของผู้นิเทศ ผู้ทำการนิเทศมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

1.2.1 พัฒนาความรู้ให้กับผู้รับนิเทศในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

1.2.2 ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

1.2.3 ช่วยเหลือ สนับสนุนและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับนิเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.2.4 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช่มุ่งหวังที่จะจับผิด

2. ผู้รับการนิเทศ อาจเป็นบุคคลเดียวหรือเป็นทีมก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น ความสามารถและรวดเร็วของการนิเทศ หรือความคล้ายคลึงของประเด็นที่จะนิเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการนิเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้ารับการนิเทศอาจเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยตรง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่ต้องออกไปติดตามงานด้วยก็ได้

3. ประเด็นที่จะนิเทศ ในการดำเนินการนิเทศนั้นก่อนที่จะทำการนิเทศจริง ผู้นิเทศจะต้องเตรียมการกำหนดประเด็นนิเทศให้ชัดเจนด้วย ทั้งประเด็นด้านวิชาการและบริหารจัดการ หรือแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการนิเทศงานตามภารกิจปกติหรือตามแผนงาน/โครงการก็ได้

ขั้นตอนและกระบวนการนิเทศ

การนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานสำหรับผู้นิเทศ ดังนี้

1. วางแผนการนิเทศให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการนิเทศงานครั้งแรกควรดำเนินการก่อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละเรื่องอาจมีการนิเทศมากกว่า 1 ครั้งก็ได้

2. ศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่จะไปทำการนิเทศ เพื่อพิจารณาเลือกประเด็นสำคัญที่จะต้องไปทำการนิเทศ

3. ประสานงานกับผู้รับการนิเทศก่อนดำเนินการนิเทศ เพื่อให้การนิเทศเป็นไปตามแผนทั้งในเรื่องเวลา สถานที่ และบุคคลเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกรภายใต้โครงการ เป็นต้น

4. ดำเนินการนิเทศในพื้นที่ตามวิธีการที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นที่สำนักงานของผู้รับการนิเทศหรือสถานที่อื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม เช่น พื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

5. กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าผู้นิเทศสามารถแก้ไขได้ให้ดำเนินการได้เลย แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หากไม่สามารถแก้ไขโดยผู้นิเทศเองก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาได้ทราบอย่างรวดเร็ว

6. รายงานผลการนิเทศให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบและสั่งการให้แก้ไขปัญหาหรือแจ้งให้หน่วยงานรับนิเทศทราบข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รูปแบบของการนิเทศ

การนิเทศอาจมีได้หลายรูปแบบ อาทิ

1. การชี้แจงแบบไม่เป็นทางการระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับนิเทศโดยตรง ซึ่งเหมาะสมกับกรณีผู้รับนิเทศมีจำนวนไม่มาก

2. การนิเทศแบบกลุ่ม ซึ่งเหมาะสมกับกรณีผู้รับการนิเทศมีจำนวนมากและมีประเด็นที่ต้องการนิเทศค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในขั้นตอนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีการเริ่มปฏิบัติงานจริง

3. การใช้สื่อ ซึ่งมีได้หลายรูปแบบ เช่น จัดทำเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้การนิเทศทำได้รวดเร็วและกว้างขวาง โดยสามารถทำได้ทั้งแบบสื่อสารทางเดียว หรือสื่อสารสองทาง เช่น e-conference แต่ก็มีข้อจำกัดเพราะบางแห่งขาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์

4. การสาธิต ซึ่งการนิเทศบางประเด็นอาจมีความยุ่งยากต่อการทำความเข้าใจทางผู้ปฏิบัติงาน ผู้นิเทศต้องแสดงให้ผู้รับนิเทศได้เห็นเสมือนสถานการณ์จริงๆ

5. สถานที่สำหรับการนิเทศนั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม อาจเป็นในสำนักงาน ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ หรือในไร่นาของเกษตรกรก็ได้ เพื่อให้เห็นสถานการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

6. สาระในการนิเทศควรจะต้องครอบคลุมทุกประเด็นทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการในพื้นที่

ประโยชน์ของการนิเทศงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ประโยชน์ของการนิเทศงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มีดังนี้

1. ลดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามแผน

2. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

3. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง

4. เป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการใฝ่หาความรู้ ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนงานต่างๆ ขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กล่าวโดยสรุป การนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หมายถึง การให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมในพื้นที่ เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การนิเทศเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบของการนิเทศประกอบด้วย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งกระบวนการนิเทศอาจทำได้หลายรูปแบบ เช่น การชี้แจงระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับนิเทศโดยตรงตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม การใช้สื่อต่างๆ ในรูปของเอกสารหรือระบบออนไลน์ รวมทั้งการสาธิต ซึ่งประโยชน์ของการนิเทศก็คือ ลดปัญหาอุปสรรคการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างราบรื่น

กิจกรรม 10.1.1

1. จงอธิบายความหมายของการนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
2. ขั้นตอนและกระบวนการนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสำหรับผู้นิเทศมีอะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 10.1.1

1. การนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หมายถึง กระบวนการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเจตนารมณ์ขององค์การ

2. ขั้นตอนและกระบวนการนิเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มีกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1) วางแผนการนิเทศให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการนิเทศงานครั้งแรกควรดำเนินการก่อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตามในแต่ละเรื่องอาจมีการนิเทศมากกว่า 1 ครั้งก็ได้

2) ศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่จะไปทำการนิเทศ เพื่อพิจารณาเลือกประเด็นสำคัญที่จะไปทำการนิเทศ

3) ประสานงานกับผู้รับการนิเทศก่อนดำเนินการนิเทศ เพื่อให้การนิเทศเป็นไปตามแผนทั้งในเรื่องเวลา สถานที่ และบุคคลเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

4) ดำเนินการนิเทศในพื้นที่ตามวิธีการที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นที่สำนักงานของผู้รับการนิเทศหรือสถานที่อื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม เช่น พื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

5) กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าผู้นิเทศสามารถแก้ไขได้ให้ดำเนินการได้เลย แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หากไม่สามารถแก้ไขโดยผู้นิเทศเองก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาได้ทราบอย่างรวดเร็ว

6) รายงานผลการนิเทศให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบและสั่งการให้แก้ไขปัญหาหรือแจ้งให้หน่วยงานรับนิเทศทราบข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เรื่องที่ 10.1.2
แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร นอกจากต้องมีการนิเทศงานแล้วยังต้องมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และอาจจะกระทำควบคู่กันไปก็ได้ แม้จะมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างกันก็ตาม แต่มีเป้าหมายสุดท้ายเหมือนกัน คือ ให้งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุประสงค์ขององค์การ

ความหมายของการติดตามในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเฝ้าระวัง (watch) การตรวจสอบ (check) สถานการณ์อย่างระมัดระวังในแต่ละช่วงเวลา เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงบางประการ (https://dictionary.cambridge.com)

การติดตาม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ จากโครงการหรือแผนงาน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผนที่กำหนดไว้หรือค่ามาตรฐาน โดยมีจุดเน้นคือ ได้มีการทำอะไรไปแล้วบ้างและทำอย่างไร การติดตามควรรวมถึงข้อมูลที่ได้จากผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ซึ่งการติดตามโดยปกติแล้วจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงเอง (www.cid.org.nz)

ศูนย์ประเมินผล (2554) ได้มีการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ แล้วสรุปว่าจากความหมายต่างๆ ของการติดตามดังกล่าว พบว่า มีคำที่สำคัญๆ คือ การตรวจสอบ กำกับควบคุม ทบทวน ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา ทำให้โครงการสำเร็จได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายของคำว่า ติดตามและประเมินไว้ว่า “การติดตาม” และ “การประเมิน” เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินมาประสาน

ใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถกำกับ ทบทวนและพัฒนางาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (input) การดำเนินการ (process) และผลการดำเนินงาน (output) เกี่ยวกับโครงการเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback system) สำหรับการกำกับ ทบทวน และแก้ปัญหาขณะดำเนินโครงการ

กล่าวโดยสรุป การติดตาม หมายถึง กระบวนการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนหรือโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูล สังเกต และสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเป็นผู้ดำเนินการเองและผู้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องในระหว่างการดำเนินงานตามแผนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผน ซึ่งตามความหมายดังกล่าวเป็นความหมายโดยทั่วไปแต่ก็สามารถประยุกต์ใช้กับงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้ เพราะการติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปกติแล้วจะไม่แตกต่างกับการติดตามงานอื่นๆ มากนัก เพียงแต่การติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นการติดตามในพื้นที่นอกสำนักงานแทนที่จะเป็นการติดตามโดยพิจารณาจากเอกสารในสำนักงานแต่เพียงอย่างเดียว

วัตถุประสงค์ของการติดตามในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การติดตามงานเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่จำเป็นต้องมีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะๆ ทั้งงานประจำขององค์การหรืองานภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินงานค่อนข้างยาว ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการติดตามในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มีดังนี้

1. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา หรือข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน
3. เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

ความสำคัญของการติดตามในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การติดตามในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนับเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทราบว่าการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ผลจากการติดตามจะได้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ระบบการติดตามจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในการติดตามงานปกติหรืองานภายใต้แผนงาน/โครงการ โดยเฉพาะในวงจรบริหารแผนงานและโครงการนั้นจะประกอบด้วย การ

วางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็จะขาดประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการทั้งหมด ซึ่งการติดตามสามารถใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ เพื่อให้มีข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา และบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวโดยสรุป การติดตามมีความสำคัญดังนี้

1. ช่วยให้ผู้บริหารองค์การหรือผู้บริหารที่เป็นเจ้าของแผนงานหรือโครงการทราบถึงสถานการณ์ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

2. ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งในประเด็นด้านวิชาการ ด้านบริหาร และด้านการเงิน

3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตื่นตัวและเร่งรัดปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เรียบร้อยเป็นไปตามแผน

ขั้นตอนและกระบวนการติดตามในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

กระบวนการติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วย

1. วางแผนการติดตาม ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้

2. จัดทำประเด็นการติดตาม และกำหนดตัวชี้วัดและรูปแบบในการติดตามงาน โดยมีประเด็นในการติดตามที่ครบถ้วน ทั้งด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านการเงิน

3. ดำเนินการติดตาม ซึ่งควรกำหนดให้มีระยะเวลาติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่เว้นระยะยาวมากเกินไป เพราะอาจแก้ไขปัญหาไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

4. รายงานผลการติดตาม ให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบการดำเนินงานให้ทราบโดยเร็วที่สุดตามช่วงเวลาที่มีการติดตาม

รูปแบบของการติดตามในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การติดตามในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมี 3 รูปแบบ คือ

1. ติดตามจากรายงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดให้มีการรายงานให้ผู้บริหารได้ทราบเป็นระยะ ซึ่งการรายงานอาจดำเนินการได้หลายวิธีทั้งด้วยวาจาหรือเป็นเอกสารและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการรายงานในรูปเอกสารควรมีการกำหนดแบบฟอร์มที่ต้องรายงานพร้อมคำนิยามและขอบเขตของการรายงานให้ชัดเจน โดยอาจมีการเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลาด้วย

2. ติดตามในพื้นที่โครงการ โดยการสำรวจ สังเกต หรือสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้แผนงานหรือโครงการ เช่น ในฟาร์มของเกษตรกรหรือพื้นที่ดำเนินงานภายใต้แผนงานหรือโครงการ

3. รูปแบบผสม คือ ติดตามทั้งจากเอกสารและติดตามในพื้นที่

ประเภทของการติดตามในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การติดตามสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. ติดตามความก้าวหน้าทางด้านกายภาพหรือด้านกระบวนการ (Physical progress monitoring) โดยเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่วางไว้ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก


2. ติดตามด้านวิชาการ (Technical monitoring) โดยตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักวิชาการที่กำหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาด้านวิชาการอะไรบ้าง

3. การติดตามด้านการเงิน (Financial monitoring) เป็นการติดตามว่าการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่ ล่าช้า พอดี หรือเร็วกว่าแผน เป็นต้น

4. การติดตามผลกระทบ (Impact monitoring) เป็นการติดตามหลังจากการดำเนินการตามไปได้ระยะหนึ่งแล้วว่ามีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลนำมาปรับปรุงแก้ไขผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นให้หายไปหรือน้อยลง การติดตามผลกระทบอาจต้องรอระยะเวลาหนึ่งจึงจะทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น

ความเหมือนและแตกต่างระหว่างการนิเทศงานกับการติดตามงาน

จากที่ได้กล่าวถึงการนิเทศและการติดตามมาแล้วข้างต้น อาจมีผู้สงสัยว่าการนิเทศและการติดตามนั้นแตกต่างกันอย่างไร และมีนักวิชาการบางท่านใช้ทั้ง 2 คำนี้ในความหมายในทำนองเดียวกัน คือ การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนเช่นเดียวกัน ซึ่งความจริงแล้วทั้ง 2 คำนี้มีส่วนที่เหมือนและต่างกันด้วยทั้งในด้านวัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินงาน (ภาพที่ 10.1) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

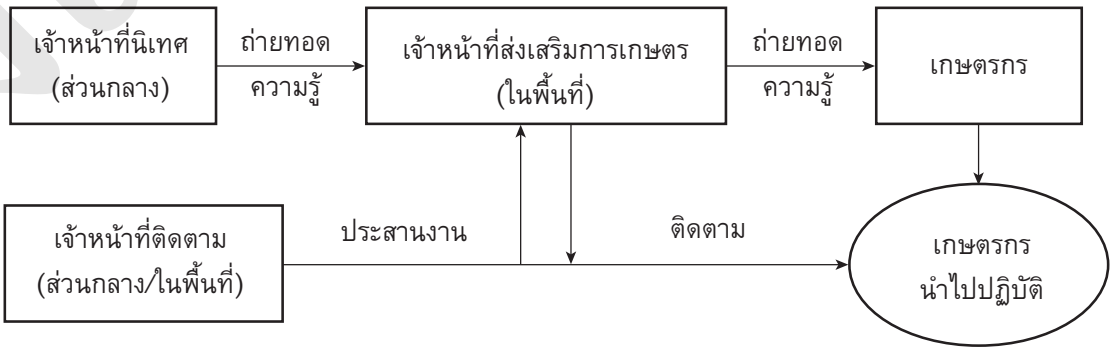

ภาพที่ 10.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศและการติดตาม

1. ความเหมือน ด้านวัตถุประสงค์ ทั้งการนิเทศและการติดตามต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นเดียวกัน

ด้านวิธีการดำเนินงานมีบางส่วนคล้ายคลึงกัน คือ มีการวิเคราะห์เพื่อหาประเด็นสำคัญในการนิเทศงานหรือประเด็นสำคัญในการติดตามงาน และทั้ง 2 กิจกรรมต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เหมือนกัน

2. ความแตกต่าง ในส่วนที่แตกต่างกันระหว่างการนิเทศกับการติดตามงานก็คือ การนิเทศมักจะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับนิเทศอย่างใกล้ชิด เช่น การฝึกอบรม หรือให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ส่วนการติดตามจะมีการปฏิสัมพันธ์กันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย แต่จะน้อยกว่าการนิเทศ เช่น การติดตามจากรายงานหรือมีการสอบถามข้อมูลบางประการเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องบ้างเล็กน้อย หรือมีการประสานงานเพื่อกำหนดนัดหมายบางกรณีที่ต้องการไปพบผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกรหรือสถานที่ดำเนินการ (ภาพที่ 10.1) และมักจะไม่มีการให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมากนัก

กล่าวโดยสรุป การติดตาม หมายถึง กระบวนการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารองค์การทราบถึงสถานการณ์ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีรูปแบบการติดตามทั้งจากเอกสารของผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามในพื้นที่โครงการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง

กิจกรรม 10.1.2

1. จงอธิบายความหมายของการติดตามในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
2. ขั้นตอนและกระบวนการติดตามในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมีอะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 10.1.2

1. ความหมายของการติดตามในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หมายถึง กระบวนการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนหรือโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูล สังเกต และสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเป็นผู้ดำเนินการเองและผู้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องในระหว่างการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผน ซึ่งตามความหมายดังกล่าวเป็นความหมายโดยทั่วไปแต่ก็สามารถประยุกต์ใช้กับงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

2. ขั้นตอนและกระบวนการติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วย

1) วางแผนการติดตามให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้

2) จัดทำประเด็นการติดตามและกำหนดตัวชี้วัดและรูปแบบในการติดตามงาน โดยมีประเด็นในการติดตามที่ครบถ้วน ทั้งด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านการเงิน

3) ดำเนินการติดตาม ซึ่งควรกำหนดให้มีระยะเวลาติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่เว้นระยะยาวมากเกินไป เพราะอาจแก้ไขปัญหาไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

4) รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบการดำเนินงานให้ทราบโดยเร็วที่สุดตามช่วงเวลาที่มีการติดตาม

ตอนที่ 10.2
การประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง

10.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

10.2.2 ขั้นตอน แผนแบบ และประเด็นในการประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

แนวคิด

1. การประเมินผลเป็นกิจกรรมหนึ่งในการบริหารงานการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้ทราบผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติว่ามีความก้าวหน้าหรือมีความสำเร็จมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ ซึ่งการประเมินผลโดยปกติจะมีรูปแบบในเชิงวิชาการและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากกว่าการติดตาม
2. การประเมินผลจะต้องมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของทั้งผู้รับการประเมินผล ผู้ทำการประเมินผล และผู้ใช้ประโยชน์จากการประเมินผล

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 10.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
2. อธิบายขั้นตอนและกระบวนการประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

เรื่องที่ 10.2.1
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้น ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับการประเมินผล โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ถ้าเป็นงานปกติก็มักจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินงานเอง แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่รับผิดชอบดำเนินงานเรื่องนั้นๆ โดยตรง ถ้าเป็นงานหรือโครงการที่มีขอบเขตกว้างขวางก็อาจจะมอบหมายหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานเป็นผู้ดำเนินการเพื่อป้องกันความเอนเอียง เนื่องจากผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) แม้ผู้บริหารจะไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการประเมินผลเอง แต่ผู้บริหารจะต้องเข้าใจกระบวนการประมวลผลบ้างพอสมควร และรู้ประเด็นที่ต้องการประเมินเพื่อให้การประเมินผลเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การอย่างแท้จริง

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือองค์การต่างๆ ที่บางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อจับผิดหรือหาข้อผิดพลาดของผู้ดำเนินงาน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา แต่ที่ถูกต้องแล้วแนวคิดของการประเมินผลก็คือ การดำเนินการเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขให้การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเป็นหลัก โดยมีการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับแผนงาน ระดับโครงการ และระดับหน่วยงาน โดยเฉพาะในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าองค์การภาครัฐหรือองค์การภาคเอกชนก็ตาม ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานย่อมต้องการทราบว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายและกำลังดำเนินการอยู่นั้น มีแนวโน้มว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ หรือพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ควรจะปรับปรุงเพื่อดำเนินการต่อไป หรือยุติสิ่งที่ดำเนินการนั้นเลยทันที ถ้าเป็นการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นภารกิจตามแผนแล้ว ก็จะต้องทราบว่าการปฏิบัติงานนั้นๆ มีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด เพื่อนำข้อมูลจากการประเมินผลนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต คำถามเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารองค์การจะต้องทราบระหว่างการดำเนินการ หรือหลังจากการดำเนินการไปแล้ว โดยนำข้อมูลจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งที่กำลังดำเนินการหรือดำเนินการไปแล้ว และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคตให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

ความหมายของการประเมินผล

นักวิชาการด้านการประเมินผลได้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้หลายความหมาย ซึ่งในที่นี้จะนำเสนอที่สำคัญๆ ดังนี้

ศูนย์ประเมินผล (2551, น. 3) ได้ให้ความหมายของการประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของแผนงานหรือโครงการด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด

ซัชแมนและคณะ (Suchman, 1967; Stufflebeam & Shinkfield, 1990, p. 93 อ้างถึงใน ศูนย์ประเมินผล, 2551, น. 4) ให้ความหมายของการประเมินผลโครงการ หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลของกิจกรรมที่วางไว้ในโครงการประสบผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่

จากความหมายของการประเมินผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกระดับ โดยเฉพาะระดับผู้บริหารได้ทราบถึงผลที่เกิดจากการดำเนินงานว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีผลกระทบตามที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ เพื่อตัดสินใจจะดำเนินงานตามแผนหรือปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ชะลอ หรือยกเลิกการดำเนินงานตามแผน การประเมินผลไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็จะมีความหมายเช่นเดียวกันกับด้านอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของการประเมินผล

การประเมินผลก็คือ กระบวนการวิเคราะห์ผลของการดำเนินงานในเรื่องที่สำคัญ 3 เรื่องด้วยกัน คือ ความถูกต้องและตรงประเด็น (validity and relevance) ประสิทธิผล (effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency) ของการดำเนินงานว่าเป็นอย่างไร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินผล คือ

1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการตัดสินคุณค่าของการดำเนินงาน
2. เพื่อค้นหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน
3. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการทำงาน ปัญหาอุปสรรค บทเรียนไว้ใช้ในการปรับปรุง แก้ไขงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่จะดำเนินการในอนาคต
4. เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการประเมินผลก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงานหรือหลังการดำเนินงาน

ความสำคัญของการประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ความสำคัญของการประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็จะคล้ายกับการประเมินผลในงานด้านอื่นๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินผลในขั้นก่อนการดำเนินงานจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบว่างานที่จัดทำขึ้นนั้นมีความจำเป็นมากน้อย หรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีความคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปมากน้อยเพียงใด และเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่คุ้มค่าหรือมีปัญหาอุปสรรคมากจนอาจนำไปสู่ความล้มเหลวก็ไม่ควรมีการดำเนินการอีกต่อไป

2. ผลจากการประเมินผลระหว่างการดำเนินงานจะช่วยให้ทราบว่างานดังกล่าวยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเรื่องใดบ้างหรือไม่ อย่างไร ต้องปรับปรุงหรือจะยุติการดำเนินงานทันที

3. ผลจากการประเมินผลภายหลังสิ้นสุดการดำเนินงานจะเป็นข้อมูลไปใช้วางแผนการดำเนินงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในโอกาสต่อไป

4. เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้ให้เงินทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

ขอบเขตของการประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เมื่อพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานแล้วเห็นว่ามีขอบเขตที่กว้างขวางและลึกซึ้งกว่าเมื่อเทียบกับการติดตามงาน โดยเฉพาะในงานหรือโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะมีขอบเขตของการประเมินผลที่ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ขนาดกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน โดยทั่วไปการประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้ (ปรับปรุงจาก บันเทิง มาแสง, 2530, น. 44–49)

1. การประเมินวัตถุประสงค์ การประเมินผลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ผลของการดำเนินงานว่าตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ และทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินงานนั้นมีเพียงพอหรือไม่ โดยทั่วไปการประเมินผลจะครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ในส่วนที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ความสำคัญของงานที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและนโยบายการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรและลำดับความสำคัญต่อองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผน

1.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่ตั้งไว้นั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหรือไม่

1.3 ทบทวนถึงนโยบายและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางอย่างไม่สามารถควบคุมได้แต่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จของการดำเนินงาน

1.4 ชี้ให้เห็นว่าวิธีการดำเนินงานนั้น ทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร

1.5 ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมในการดำเนินงานนั้นก่อให้เกิดผลตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่

1.6 วิเคราะห์ว่าทรัพยากรที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตามแผนนั้นเหมาะสม เพียงพอหรือไม่

2. การประเมินผลการดำเนินงาน การประเมินผลในเรื่องนี้จะเน้นถึงกระบวนการเปลี่ยนปัจจัยนำเข้า (inputs) มาเป็นผลได้หรือผลผลิต (outputs) สำหรับขอบเขตของการประเมินผลการดำเนินงานในงานส่งเสริมการเกษตร โดยทั่วไปจะครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดังนี้

2.1 ประเมินถึงการจัดหาหรือส่งปัจจัยการผลิตว่ามีความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนนั้นดำเนินการไปได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (ถ้ามี) ทั้งในเรื่องปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาส่งมอบ

2.2 วิเคราะห์ถึงการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทของการประสานงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน

2.3 วิเคราะห์ถึงกระบวนการติดตามงานและเอาข้อเสนอแนะจากการประเมินผลที่ผ่านมาว่าได้มีการนำมาปรับปรุงการดำเนินงานด้วยแล้วหรือไม่

2.4 ประเมินผลด้านเทคนิคและปัญหาในการจัดการ ตลอดจนปัญหาที่จะเกิดกับกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคต

3. การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness evaluation) และการใช้ประโยชน์จากผลได้เบื้องต้น โดยทั่วไปจะหมายถึงผลประเมินหลังสิ้นสุดการดำเนินงาน ซึ่งการประเมินผลจะเน้นถึงกิจกรรมที่ดำเนินการที่จะต้องให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย และกิจกรรมดังกล่าวเป็นหลักสำคัญที่ทำให้การดำเนินการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การประเมินผลนี้ ประกอบด้วย

3.1 เปรียบเทียบผลได้เบื้องต้นที่ได้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

3.2 วิเคราะห์ถึงความสำคัญของผลได้เบื้องต้นที่ได้จากการดำเนินงานว่าจะมีศักยภาพที่จะทำให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในระยะยาวของการดำเนินงานได้หรือไม่

3.3 วิเคราะห์ถึงการใช้ประโยชน์จากผลได้เบื้องต้นว่ามีการใช้กว้างขวางเพียงใด

4. การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency evaluation) การประเมินผลในเรื่องนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงขบวนการการเปลี่ยนปัจจัยนำเข้า (inputs) มาเป็นผลได้ (outputs) ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เป็นการใช้ต้นทุนต่ำสุดหรือไม่ การวิเคราะห์สามารถคิดในรูปของเวลาและค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย

5. การประเมินผลกระทบของการดำเนินงาน ประเด็นสำคัญของการประเมินผลในส่วนนี้ คือ วิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (effects) และผลกระทบระยะยาว (impacts) ของการดำเนินงานที่จะเกิดแก่กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ผู้ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน ซึ่งการวิเคราะห์จำเป็นที่จะต้องกำหนดตัวชี้วัดและศึกษาหาความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สำหรับขอบเขตของการประเมินผลกระทบของโครงการสามารถพิจารณาได้เป็น 2 วัตถุประสงค์ คือ

5.1 วัดและวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง ความสำคัญในเรื่องนี้คือจะทำการวัดและวิเคราะห์อะไร ใช้อะไรเป็นตัวบ่งชี้ (indicators) และจะเก็บข้อมูลอย่างไร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบกับคนกลุ่มไหน ขนาดของผลกระทบมีมากน้อยเพียงใด

5.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน การประเมินผลกระทบของการดำเนินงานนี้มีเทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ที่สำคัญ ได้แก่

5.2.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบของการดำเนินงาน โดยการเปรียบเทียบกลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์กับกลุ่มที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน

5.2.2 การศึกษาเฉพาะกรณีโดยการคัดเลือกกลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานมาทำการศึกษาให้ละเอียดทุกแง่ทุกมุม วิธีการนี้เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีการแรก

5.2.3 การตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการและการสุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานมาทำการสัมภาษณ์ วิธีการนี้ใช้กันมากเพราะจะได้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์อีกทางหนึ่ง

5.2.4 ระบบการติดตามโครงการซึ่งถ้าหากได้มีการวางระบบการติดตามไว้ดีแล้วก็จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาใช้ประกอบการประเมินผลได้

6. การประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมทั้งหมดพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ การประเมินผลในลักษณะนี้ทำพร้อมกันในหลายๆ เรื่อง โดยการหาข้อเท็จจริงและจัดทำข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติการประเมินผลจะมีขอบเขต ดังนี้

6.1 วิเคราะห์ผลของการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับผลได้และผลกระทบเบื้องต้นของโครงการ โดยพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ

- วัตถุประสงค์และการวางแผนการดำเนินงาน
- กระบวนการดำเนินงานตามแผน

6.2 ระบุถึงบทเรียนและประเด็นสำคัญ และข้อมูลที่ได้อาจนำไปใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

- เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
- นำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติไม่มีรายงานการประเมินผลใดที่จะครอบคลุมหัวข้อการประเมินผลนี้ได้ทั้งหมด เพราะขอบเขตของการประเมินผลตามที่กล่าวมาแล้วนั้นกว้างขวางมาก ตัวอย่างเช่น ในการประเมินผลระหว่างการดำเนินงานถ้ามีลักษณะเป็นโครงการแล้วนั้นจะมีขอบเขตระยะเวลาที่ชัดเจน แต่การวิเคราะห์ผลได้ (Output) ของการดำเนินงานและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน (Outcome) จะทำได้เฉพาะในบางเรื่องเท่านั้น และถ้าจะทำการประเมินหลังสิ้นสุดการดำเนินงานก็จะให้ความสำคัญเฉพาะด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานและผลได้ (Output) หรือการวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น (Effect) เท่านั้น ส่วนผลกระทบระยะยาว (Impact) มักจะไม่มีการดำเนินการเลย เพราะต้องใช้เวลานานกว่าจะทราบผล

ประเภทของการประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ในการดำเนินงานใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานตามปกติหรือการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการก็ตามจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลอยู่หลายกลุ่ม เช่น ผู้บริหารองค์การหรือผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณและอื่นๆ หน้าที่ของบุคคลเหล่านี้มีความต้องการข้อมูลที่อาจแตกต่างกันในระยะเวลาที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในการดำเนินงาน หากต้องการให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้นั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี เพื่อให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมและความต้องการที่แท้จริง ขณะเดียวกันแม้ว่าจะได้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ในช่วงระหว่างการดำเนินงานอาจจะมีปัญหาหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดไว้เกิดขึ้น ทำให้ผลลัพธ์ของการดำเนินงานมีโอกาสเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน การประเมินผลจึงถูกนำมาใช้ในช่วงเวลาต่างๆ ของโครงการ ดังนี้

1. การประเมินผลก่อนการดำเนินงาน (Ex-ante evaluation หรือ Pre-evaluation) ลักษณะของการประเมินผลเป็นการประเมินก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมของงานที่จะดำเนินการว่ามีความจำเป็นหรือมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด โดยผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจอนุมัติจะต้องทราบล่วงหน้าเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ทั้งบุคลากรและงบประมาณได้อย่างเหมาะสม การประเมินผลประเภทนี้ ได้แก่ การประเมินความต้องการจำเป็น (needs assessment) ในเบื้องต้นก่อนที่จะดำเนินงานและการประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study: FS) ของโครงการ หรือสิ่งที่จะดำเนินการ โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จำเป็นต่อความสำเร็จในด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 ด้านเทคนิค (technical aspects) ศึกษาถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานที่จะทำ ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่และของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการหรือไม่ เช่น โครงการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร จะต้องทำการศึกษาถึงปัจจัยในการผลิต กรรมวิธีในการผลิต คุณภาพของผลผลิต ความพร้อมของเกษตรกร เป็นต้น

1.2 ด้านสังคม (social aspects) วิเคราะห์ดูว่าโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินงานจะให้ผลดีต่อสังคมอย่างไร ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับของชุมชนหรือไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะมีการสำรวจความเห็นหรือการจัดประชาพิจารณ์ (public hearing) ก่อนการดำเนินงานก็ได้

1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม (environmental aspects) ศึกษาว่างานที่จะทำนั้นจะมีผลกระทบในด้านลบกับกลุ่มบุคคลหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่อย่างไร

1.4 ด้านการเงิน (financial aspects) วิเคราะห์ว่างานที่จะดำเนินการนั้นเหมาะสมที่จะลงทุนมีผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุนหรือไม่ อย่างไร โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดต่างๆ เช่น

1.4.1 ต้นทุนต่อหน่วยในการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบชลประทาน (บาท/ไร่) การฝึกอบรมเกษตรกร (บาท/คน)

1.4.2 ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น (กก./ไร่) หรือมีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้นมาก (multiple cropping index) ขึ้น

1.4.3 ผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน ตัวอย่างเช่น รายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อไร่ (บาท/ไร่) รายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน) และกำไรสุทธิ/เงินลงทุน (ร้อยละ) ต้องคุ้มกับการลงทุน

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาความเหมาะสมของงานที่จะทำนั้น ถ้าเป็นงานหรือโครงการของรัฐบาล ประเด็นการตัดสินใจไม่ใช่อยู่ที่ความเหมาะสมทางการเงินอย่างเดียว ต้องพิจารณาในประเด็นอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งผลประโยชน์

ที่จะได้รับจากการดำเนินงานอาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ (intangible benefit) หรือไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ บางครั้งภาครัฐก็อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการถ้าเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญมากพอ แม้จะวัดในเชิงปริมาณไม่ได้ก็ตาม

1.5 ด้านการตลาด (marketing aspects) ในกรณีงานที่จัดทำขึ้นเป็นการพัฒนาหรือขยายการผลิต จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยว่า เมื่อมีผลผลิตออกมาแล้วจะขายที่ไหนในราคาเท่าใด

1.6 ด้านเศรษฐกิจ (economic aspects) วิเคราะห์ว่างานที่จะดำเนินการนั้นจะก่อให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมอย่างไร เนื่องจากการลงทุนในโครงการโดยเฉพาะกรณีโครงการขนาดใหญ่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่องบประมาณและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศด้วย เพราะจะเสียโอกาสในการลงทุนในงานอื่นๆ แต่กรณีเป็นโครงการขนาดเล็กอาจไม่จำเป็นต้องพิจารณาในประเด็นนี้ก็ได้

1.7 ด้านบริหารงาน (management aspects) ต้องมีการพิจารณาถึงรูปแบบการบริหารงานว่าจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องใด ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล และโครงสร้างปกติของหน่วยงานเอื้ออำนวยหรือไม่ ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานอย่างยั่งยืน โดยปกติแล้วถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ผู้บริหารองค์การอาจมีการจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการขึ้นมาเป็นเฉพาะก็ได้

ผลที่ได้จากการประเมินผลก่อนการดำเนินการตามแผนในบางประเด็นยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) ไว้เปรียบเทียบการประเมินผลหลังการดำเนินงานตามก็ได้

2. การประเมินผลระหว่างการดำเนินงาน (Ongoing evaluation) การประเมินผลขั้นตอนนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การประเมินความก้าวหน้า ลักษณะสำคัญของการประเมินผลประเภทนี้ เพื่อทราบความก้าวหน้าหรือปัญหาในการดำเนินงาน เพื่อนำผลไปใช้แก้ไข ปรับปรุงงานให้สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้

2.1 ประเมินในขณะที่โครงการดำเนินอยู่ ซึ่งอาจเป็นการดำเนินงานครั้งแรกหรือเป็นงานต่อเนื่อง หรืองานประจำแต่ละปีงบประมาณ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ เช่น โครงการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ ตามหลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มจะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ โอกาสจะยุติโครงการมีน้อย การประเมินจึงเป็นการประเมินความก้าวหน้า

2.2 ประเมินเพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่ากิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนหรือไม่ ทั้งในระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย ปัญหาต่างๆ เพื่อนำผลมาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในระยะหรือช่วงต่อๆ ไป

2.3 ประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ สารสนเทศที่ได้จากการประเมินผลในขั้นตอนนี้จะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลือ หรือยุติการดำเนินงานหากพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคมากไม่อาจแก้ไขได้


2.4 ประเมินเพื่อเน้นตรวจสอบความก้าวหน้าของผลดำเนินโครงการ นอกจากจะประเมินตามข้อ 1-3 แล้ว จะมีการตรวจสอบถึงผลที่จะได้ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร โดยอาจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อปรับการดำเนินงานให้เอื้อต่อความสำเร็จของโครงการ

3. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการดำเนินงาน (Ex-post evaluation หรือ Post-evaluation) เป็นการประเมินผลหลังจากการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อตัดสินว่าการดำเนินงานประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีผลลัพธ์ ผลกระทบทั้งทางบวกทางลบอย่างไร มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ หรือความคุ้มค่าเพียงใด นอกจากนี้ผลการประเมินผลจะช่วยในการตัดสินใจ เลิก หยุด หรือดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือดำเนินการโครงการใหม่ๆ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกับงานที่ได้ทำการประเมินผลแล้วในโอกาสต่อไป ซึ่งผลการประเมินผลนี้สามารถนำไปเปรียบกับการประเมินผลก่อนเริ่มโครงการก็ได้ (ถ้ามี)

กล่าวโดยสรุป จะเห็นว่าการประเมินผลมีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินงานตามช่วงเวลา คือ เริ่มตั้งแต่ก่อนการดำเนินงานจะมีการประเมินผลเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ระหว่างการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะมีการประเมินผลเพื่อดูความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแล้วนำไปแก้ไขการดำเนินงาน และหลังสิ้นสุดการดำเนินงานจะประเมินผลเพื่อที่ตัดสินว่าการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด

ความเหมือนและความแตกต่างของการติดตามและการประเมินผล

จากความหมายและวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปถึงความเหมือนและความแตกต่างของการติดตามและประเมิน ผลดังนี้ (ภาพที่ 10.2)



ภาพที่ 10.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามกับการประเมินผล

1. ความเหมือนของการติดตามและประเมินผล การติดตามและการประเมินผลจะต้องดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เหมือนกัน แต่จะมีรายละเอียดและความถี่ในการดำเนินงานแตกต่างกัน

2. ความแตกต่างของการติดตามและประเมินผล การติดตามเน้นข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และมักจะมีความถี่ในการติดตามมากกว่าการประเมินผล ทั้งนี้เพื่อจะนำมาแก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์ ในขณะที่การประเมินผลเน้นการตัดสินคุณค่าของโครงการหรือแผนงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

การติดตามจะดำเนินงานเฉพาะในช่วงเวลาที่โครงการหรือแผนงานกำลังดำเนินงานอยู่เท่านั้น (on-going) ส่วนการประเมินผลสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หรือหลังมีการดำเนินงานตามแผนแล้วก็ได้

การติดตามและการประเมินผลมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด บางครั้งกล่าวรวมเป็นคำเดียวกัน คือ การติดตามประเมินผล เนื่องจากทั้งการติดตามและการประเมินผลต่างก็เป็นกลไกของการพัฒนาที่สามารถใช้ร่วมกันได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าการติดตามเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสนับสนุนการประเมินผล ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตามจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศในการประเมินผลเพื่อนำมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น งานหรือกิจกรรมที่มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอจะทำให้การประเมินผลทำได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่างานที่ไม่มีการติดตาม หรือติดตามอย่างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ซึ่งความแตกต่างระหว่างการติดตามงานและการประเมินผล สรุปได้ตามตารางที่ 10.1

ตารางที่ 10.1 ความแตกต่างระหว่างการติดตามและการประเมินผล

ประเด็น	การติดตาม (Monitoring)	การประเมินผล (Evaluation)
ความถี่	เป็นงานปกติและมีกำหนดสม่ำเสมอเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง	มีการกำหนดเป็นช่วงๆ เป็นช่วงก่อน/ระหว่าง/หลังการดำเนินงานตามแผน
วัตถุประสงค์หลัก	- ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม - เพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้น	- ประเมิน (assess) ความสำเร็จของงานหรือโครงการในแต่ละช่วงเวลา - เพื่อปรับปรุงงานในระยะยาวหรือในอนาคต
จุดเน้น	ความสอดคล้องกับแผนหรือข้อกำหนดที่วางไว้	ประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามแผน
แหล่งข้อมูล	จากรายงานความก้าวหน้าหรือจากการสังเกตในพื้นที่	มีระบบและวิธีการที่เป็นวิชาการและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ผู้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานเอง หรือเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางภายในองค์การ	ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติงานที่ทำการประเมินผล
การรายงาน	รายงานผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การด้วยก็ได้	ต้องรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์การ

จรรยาบรรณของนักประเมินผล

กระบวนการประเมินผลมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของคุณค่า ค่านิยม การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ รวมทั้งการที่จะบรรลุผลการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานด้านคุณค่าการนำไปใช้ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความแม่นยำถูกต้อง ด้วยเหตุนี้นักประเมินผลจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทางด้านการประเมินผลมาโดยตรง จรรยาบรรณที่สำคัญซึ่งนักประเมินผลพึงยึดถือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติมีดังต่อไปนี้

1. ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ นักประเมินผลต้องใช้หลักวิชาการอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อมูล ไม่ใช้ความรู้สึกตัดสิน ไม่อ้างผลเกินความจริง ไม่คาดว่าผลจะต้องเป็นผลบวกเสมอไป ในขณะเดียวกันต้องไม่มีอคติหรือความลำเอียงต่อโครงการ

2. มีความรับผิดชอบ นักประเมินผลต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน ต้องอุทิศเวลาและทำหน้าที่เต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงผลได้ผลเสียของทุกฝ่าย ไม่ควรทำการติดตามและประเมินผลเพียงเพื่อเอาใจผู้บริหารหรือเพื่อให้บรรลุนโยบายเท่านั้น แต่ต้องปกป้องมิให้มีการนำผลไปใช้ในทางที่ผิด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง นอกจากนั้นควรตรงต่อเวลาและรายงานผลให้ตรงตามกำหนด เพื่อประโยชน์ในการนำสารสนเทศการประเมินผลไปใช้ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของเวลาหรือสถานการณ์

3. รักษาความลับอย่างเคร่งครัด นักประเมินผลอาจต้องเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งต้องระมัดระวังเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนไม่อาจเปิดเผยได้ จำเป็นต้องเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

4. ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ในการติดตามรวบรวมข้อมูลไม่ควรเรียกร้องหรือขู่เข็ญผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ แต่ควรมีการเห็นพ้องต้องกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งข้อจำกัดต่างๆ เป็นหลัก ถ้าเป็นโครงการที่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินงาน ก็ควรจะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นจากกลุ่มบุคคลที่สมัครใจ

5. มีคุณธรรม นักประเมินผลต้องมีคุณธรรม กล่าวคือ ควรทำการประเมินโครงการที่จะก่อให้เกิดคุณค่า ไม่ควรทำการประเมินผลใดๆ เพื่อเห็นแก่สินจ้างรางวัลโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนและการสิ้นเปลืองงบประมาณ ในทางตรงกันข้ามจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องรายงานผลตามความเป็นจริง พร้อมทั้งชี้ให้เห็นข้อจำกัดประเด็นปัญหา โดยนำมาอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ต่องานและสังคม

6. ความเป็นอิสระในการประเมินผล นักประเมินผลจะต้องมีความอิสระในด้านความคิดและกระบวนการประเมินผล ไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องมีความเป็นเอกภพที่จะประเมินผลโครงการโดยปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลภายในและภายนอกองค์การ

กล่าวโดยสรุป การประเมินผล หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการตัดสินคุณค่าของการดำเนินงานทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการปรับปรุงแก้ไขงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่จะดำเนินการในอนาคต ซึ่งการประเมินผลมี 3 ประเภท คือ การประเมินผลก่อนการดำเนินงาน โดยอาจเรียกว่าการศึกษา

ความเป็นไปได้ก็ได้ การประเมินผลระหว่างการดำเนินงาน และการประเมินผลหลังการดำเนินงาน โดยผู้บริหารอาจเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 2 หรือ 3 ประเภทก็ได้

กิจกรรม 10.2.1

1. จงอธิบายความหมายของการประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
2. การประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 10.2.1

1. ความหมายของการประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกระดับ โดยเฉพาะระดับผู้บริหารได้ทราบถึงผลที่เกิดจากการดำเนินงานว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีผลกระทบตามที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ เพื่อตัดสินใจจะดำเนินงานตามแผนหรือปรับเปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง ชะลอ หรือยกเลิกการดำเนินงานตามแผน การประเมินผลไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็จะมีความหมายเช่นเดียวกันกับด้านอื่นๆ

2. การประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มี 3 ประเภท ประกอบด้วย
   1) การประเมินผลก่อนการดำเนินงาน (Ex-ante evaluation หรือ Pre-evaluation)
   2) การประเมินผลระหว่างการดำเนินงาน (Ongoing evaluation)
   3) การประเมินผลหลังสิ้นสุดการดำเนินงาน (Ex-post evaluation หรือ Post-evaluation)

เรื่องที่ 10.2.2
ขั้นตอน แผนแบบ และประเด็นในการประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ขั้นตอนการประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ขั้นตอนประเมินผลการดำเนินงานในงานส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลก่อน ระหว่าง หรือสิ้นสุดการดำเนินงาน โดยทั่วไปจะมี 6 ขั้นตอน โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินผล ผู้ประเมินผลจำเป็นต้องรู้ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลการประเมินว่าต้องการทราบอะไรบ้าง ผลการศึกษาความต้องการของผู้ใช้เพื่อป้องกันการหลงประเด็นที่จะส่งผลให้เมื่อประเมินผลแล้วไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ ในฐานะผู้บริหารงานส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ใช้ผลการประเมินผลจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้ทำการประเมินผลว่าต้องการให้มีการประเมินประเด็นใดบ้างและเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่

2. ศึกษารายละเอียดของงานที่จะประเมินผล ในขั้นตอนนี้ผู้ทำหน้าที่ในการประเมินจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบให้ทำการประเมินอย่างลึกซึ้งเสียก่อน โดยเริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมา หลักการและเหตุผลในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีดำเนินงานพร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา การดำเนินงานสภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เป็นต้น ผลจากการศึกษาดังกล่าวก็เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่จะนำไปสู่การกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ ประเด็นการประเมิน และกำหนดตัวชี้วัดในขั้นตอนต่อไป

3. จัดทำข้อเสนอโครงการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย

3.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมินผล ในขั้นตอนนี้การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมินผลจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะประเมินผลอะไรบ้าง มีขอบเขตแค่ไหน เช่น พื้นที่ (โครงการ/อำเภอ/จังหวัด/ประเทศ) บุคคลเป้าหมาย ห้วงเวลา (ปี-เดือน-ฤดูกาล) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นทิศทางในการออกแบบการประเมินและการกำหนดประเด็นและตัวชี้วัดในขั้นตอนต่อไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประเมินผลอาจได้จากวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินผลหรือผู้ร้องขอให้ประเมินผล หรือผู้บังคับบัญชาหรือจากประสบการณ์ของผู้ประเมินผลเอง ฯลฯ

3.2 กรอบแนวคิดและแผนแบบการประเมินผล เมื่อได้วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินผลแล้วนำมาประมวลเป็นกรอบแนวคิดและแผนแบบการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมินผล

3.3 ตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินหรือเปรียบเทียบ สิ่งที่ผู้ประเมินผลจะต้องให้ความสำคัญในการกำหนดตัวชี้วัดนั้น คือ ตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดนั้นต้องสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการประเมินผลได้

และต้องกำหนดเกณฑ์การตัดสินหรือเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบอย่างชัดเจนหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตามความเป็นจริงและสามารถใช้เป็นตัวแทนของภาพรวมทั้งหมดภายใต้ขอบเขตของการประเมินผลได้ ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ผู้ประเมินต้องให้ความสำคัญในการเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความสอดคล้องกัน และต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะประเมินผล

4. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลังโครงการประเมินผลได้รับอนุมัติแล้ว ในขั้นตอนนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดำเนินการตามวิธีการที่ได้กำหนดแล้วในขั้นตอนที่ 3.4 สำหรับขั้นตอนนี้จะเป็นการปฏิบัติงานจริงในภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสำรวจด้วยตัวอย่าง การทำสำมะโน (การสำรวจจากทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรม) โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ถ้าเป็นกรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพก็อาจใช้เทคนิคต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (focus group interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participation observation) แต่ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รับผิดชอบในการประเมินผลจะต้องสร้างความเข้าใจหรือชี้แจงให้รายละเอียดของงานที่จะประเมินผล วัตถุประสงค์ของการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นแหล่งข้อมูล และที่สำคัญคือแบบสัมภาษณ์หรือแบบสังเกตให้แก่ทีมผู้ออกเก็บรวมรวบข้อมูลก่อน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันและในประเด็นที่ตรงต่อความต้องการนำมาใช้

5. ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลจะดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติอย่างง่าย เช่น จำนวนนับ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอ้างอิง ซึ่งอาจจะยากขึ้นอีกระดับคือสถิติที่ใช้ทดสอบ ซึ่งมักจะเป็นการทดสอบที (t-test) การประมาณยอดรวม ค่าเฉลี่ยและเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น logic model เป็นต้น เทคนิคเหล่านี้ผู้ประเมินผลจะต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมเพื่อการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยไม่มีอคติหรือความลำเอียง

6. จัดทำรายงานการประเมินผล รายงานการประเมินผลจะมีโครงสร้างคล้ายกับรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ แต่จะมีข้อแตกต่างที่สำคัญก็คือ การรายงานผลการประเมินผลจะเสนอแก่ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานที่ประเมินผลมากกว่าเผยแพร่แก่บุคคลหรือหน่วยงานทั่วไป เหมือนกับรายงานผลการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้การเขียนรายงานการประเมินผลจะต้องอาศัยความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าช่วย เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องนำผลการประเมินผลไปใช้จริง

ดังนั้น ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอการประเมินผลนี้จึงเป็นขั้นตอนที่ผู้ที่รับผิดชอบในการประเมินผลจะต้องนำเสนอผลการประเมินผลให้เห็นภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานตามแผน รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือข้อเสนอแนะที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่ามีประโยชน์ต่อการดำเนินงาน กล่าวคือ สามารถแก้ไขปัญหาหรือจุดบกพร่องของการดำเนินงาน และที่สำคัญต้องสามารถนำข้อเสนอแนะนั้นไปใช้ปฏิบัติจริงได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่จะถูกนำไปใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การ

สรุป กระบวนการประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนอาจจะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มลดได้ตามความเหมาะสมกับงานที่จะประเมิน ขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ ศึกษาความต้องการใช้ของผู้ใช้ผลการประเมินผล เช่น ผู้บริหารองค์การศึกษารายละเอียดของงาน จัดทำโครงการประเมินผลที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมิน กรอบแนวคิดและแผนแบบการประเมินผล กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินหรือเปรียบเทียบ กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการประเมินผล

แผนแบบการประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

แผนแบบ (design) การประเมินผล หมายถึง การจำกัดขอบเขตและวางรูปแบบการประเมินผลเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือปัญหา ผลจากการออกแบบ การประเมินผลจะได้แบบการประเมินผลที่จะนำไปสู่ประชากรเป้าหมาย วิธีการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

แผนแบบการประเมินผลถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการกำหนดคุณภาพของผลการประเมินผล ซึ่งแผนแบบการประเมินผลมีหลายแบบ บางแบบมีจุดมุ่งหมายจะวัดและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพียงหยาบๆ แต่บางแบบมีวิธีมีจุดมุ่งหมายที่จะวัดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด ดังนั้นการเลือกแผนแบบการประเมินจึงต้องพิจารณาให้ดี ทั้งประเด็นด้านเทคนิค ด้านบริหารจัดการ และด้านการปฏิบัติการ นอกจากนี้การเลือกใช้แผนแบบประเมินผลแบบใดแบบหนึ่งจะเป็นปัจจัยที่กำหนดชนิด แหล่งที่มา วิธีการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยทั่วไปแผนแบบการประเมินผลโครงการทางการเกษตร สามารถแบ่งออกได้ 2 วิธี คือ การประเมินผลโดยใช้แผนแบบทดลอง และการประเมินผลโดยไม่ใช้แผนแบบทดลอง (บันเทิง มาแสง, 2530, น. 63-67) สรุปได้ดังนี้

1. การประเมินผลโดยมีแผนแบบทดลอง แผนแบบทดลองจะเป็นเครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซึ่งในที่นี้คือ ผลได้ ผลกระทบ และผลกระทบต่อเนื่อง การประเมินผลวิธีนี้นักประเมินผลได้ประยุกต์แผนแบบทดลอง (experimental design) ซึ่งใช้ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประเมินผลโครงการ ในแผนการเปรียบเทียบจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ กลุ่ม (group) กลุ่มอาจเป็นกลุ่มของบุคคลหรืออาจเป็นพื้นที่ เช่น หมู่บ้านหรือตำบล แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกหรือคนในกลุ่ม

1.1 แผนแบบที่ใช้ในการประเมินผล โดยทั่วไปจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองหรือกลุ่มในโครงการกับกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มนอกโครงการ

1.1.1 กลุ่มในโครงการหรือกลุ่มทดลอง สมาชิกในกลุ่มทดลองจะได้รับกิจกรรมการพัฒนาตามโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการพัฒนาถั่วเหลือง สมาชิกในกลุ่มจะได้รับเมล็ดพันธุ์ดี เชื้อไรโซเบียม และได้รับการอบรมในเรื่องการปลูกและการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง

1.1.2 กลุ่มนอกโครงการหรือกลุ่มควบคุม สมาชิกในกลุ่มนี้จะไม่ได้รับกิจกรรมการพัฒนาใดๆ ในการประเมินผลการกำหนด กลุ่มนอกโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เปรียบเทียบผลได้ ผลกระทบ และผลกระทบต่อเนื่องของโครงการกับกลุ่มในโครงการหรือกลุ่มทดลอง กลุ่มนอกโครงการนี้สมาชิก

ในกลุ่มจะมีลักษณะต่างๆ คล้ายกับกลุ่มในโครงการ เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อม เป็นต้น

1.2 การดำเนินงานประเมินผล จะแยกออกเป็น 3 แบบย่อย ได้แก่

1.2.1 แผนแบบวัดก่อนและหลังไม่มีกลุ่มควบคุม (Pretest-Posttest design without control group) แผนแบบนี้จะใช้ในกรณีที่ต้องการการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างก่อนโครงการและหลังโครงการ (before and after comparison) เช่น การเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ หรือรายได้ทางการเกษตรระหว่างก่อนและหลังโครงการ (pretest-posttest) จะเป็นแผนแบบอันหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์หรือตอบคำถาม โดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างก่อนและหลังโครงการ แผนแบบนี้จะมีวิธีการเก็บข้อมูลอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ในช่วงก่อนและหลังโครงการ ประชากรของก่อนและหลังโครงการจะเป็นประชากรกลุ่มเดียวกัน ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บข้อมูลก่อนโครงการก็คือควรจะเก็บในช่วงของการดำเนินกิจกรรมหลักของโครงการ เช่น การก่อสร้าง เป็นต้น เพราะว่าถ้าเก็บก่อนการทำกิจกรรมหลักนานเกินไปแล้วจะทำให้ช่วงระยะเวลานั้นห่างเกินไป ส่วนการเก็บข้อมูลในช่วงหลังนั้นควรทิ้งระยะพอสมควรที่ให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์จากผลได้เบื้องต้นของโครงการก่อน

แผนแบบนี้มีจำกัดอยู่หลายประการ เช่น การเก็บข้อมูลก่อนและหลังโครงการนั้นถ้าการเก็บข้อมูลเกิดขึ้นในปีที่ผิดปกติ เช่น การเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ก่อนโครงการ (ปีปกติ) กับผลผลิตต่อไร่หลังโครงการ (ปีผิดปกติ) จะนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ผิดพลาดได้ ในทางปฏิบัติการใช้การใช้แผนแบบนี้ควรจะได้เก็บข้อมูลเป็นระยะสม่ำเสมอ แต่การเก็บข้อมูลจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้วย และถ้าจะให้แผนแบบนี้ใช้ได้ผลดีจะต้องวางระบบการเก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่ต้น และแผนแบบนี้ไม่มีกลุ่มควบคุมผลกระทบอื่นๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนภายนอก เช่น เกิดโรคระบาด ฝนแล้ง น้ำท่วม แผนแบบนี้กำจัดออกไม่ได้

ข้อดีของแผนแบบนี้คือเสียค่าใช้จ่ายน้อย สามารถที่จะใช้วิเคราะห์ถึงผลกระทบและความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลกระทบนั้นๆ และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้น แต่ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการวางระบบการเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ซึ่งวิธีการนี้สามารถทำให้เราประมาณค่าผลกระทบของโครงการได้ และสามารถทดสอบสมมติฐานได้

1.2.2 แผนแบบวัดก่อนและหลังมีกลุ่มควบคุม (Pretest-Posttest design with control group) แนวความคิดและวิธีการของแผนแบบนี้คือ กำหนดให้เรื่องที่ต้องการศึกษา วิเคราะห์ หรือประเมินผลอยู่ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มในโครงการหรือกลุ่มทดลอง (experimental group) จะใส่กิจกรรมของโครงการเข้าไปในกลุ่มนี้ เช่น โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าว จะใส่กิจกรรมแนะนำเรื่องพันธุ์ข้าว และการใช้ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้สูงขึ้น ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนอกโครงการ (control group) ซึ่งจะใช้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ โดยที่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเดิม (endogenous change) กลุ่มที่เลือกให้เป็นตัวเปรียบเทียบนี้จะต้องมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับกลุ่มทดลองตามที่ได้กล่าวไว้แล้วแต่ต้น ตามแผนแบบนี้มีการเก็บข้อมูล 2 ระยะ คือ ระยะแรกหรือระยะก่อนการดำเนินโครงการและระยะสิ้นสุดโครงการ

ปัญหาที่สำคัญของการใช้แผนแบบการทดลองนี้คือ ความยากในการที่จะหาตำบลหรือหมู่บ้านที่จะใช้เป็นพื้นที่ควบคุม ยิ่งไปกว่านั้นการใช้แผนแบบการทดลองนี้จะต้องเก็บข้อมูลกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การที่จะนำแผนแบบการทดลองนี้ไปใช้จะต้องคิดกันอย่างรอบคอบ แต่ก็มีข้อดีตรงที่มีความถูกต้องสูงทั้งทางปฏิบัติและวิชาการ สามารถแยกผลกระทบภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกแผนแบบแบบวัดก่อนและหลังมีกลุ่มควบคุมเพื่อประเมินโครงการนั้น ผู้ประเมินผลจะต้องทำการวางแผนการประเมินผลโครงการก่อนที่จะดำเนินการโครงการ คือ คัดเลือกพื้นที่นอกโครงการ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพื้นที่ในโครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือเปรียบเทียบ จากนั้นจึงสุ่มตัวอย่างเกษตรกรในโครงการและนอกโครงการ หลังจากที่โครงการได้ดำเนินการเสร็จแล้วระยะหนึ่ง จึงทำการเก็บข้อมูลอีกครั้งโดยการสุ่มตัวอย่างเกษตรกรในโครงการและนอกโครงการ

1.2.3 แผนแบบวัดหลังมีกลุ่มควบคุม (Posttest only design with control group) แผนแบบการทดลองนี้ยังคงแบ่งประชากรออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มในโครงการและนอกโครงการ ประชากรของกลุ่มในโครงการกับนอกโครงการจะเป็นคนละกลุ่มกัน การเก็บข้อมูลหรือการสำรวจข้อมูลทำครั้งเดียวทั้ง 2 กลุ่ม คือ หลังสิ้นสุดโครงการเท่านั้น

แผนแบบการทดลองนี้สามารถนำมาใช้กับการประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรได้หลายประเภท เช่น โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเทคโนโลยีโดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนพันธุ์ เพราะการเปลี่ยนพันธุ์นั้น นักประเมินผลสามารถที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ใหม่กับพันธุ์เก่าได้ ถ้าเป็นพืชล้มลุกก็จะสามารถเห็นผลของความแตกต่างได้ภายในปีเดียว ผลดีของแผนแบบนี้ที่สำคัญก็คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะมีการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ความแตกต่างได้ และลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น ดินฟ้าอากาศ สำหรับสิ่งที่จะเป็นจุดอ่อนของแผนแบบนี้ก็คือการคัดเลือกกลุ่มควบคุมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มทดลอง ซึ่งถ้าการคัดเลือกตัวกลุ่มควบคุมไม่ถูกต้องตามหลักการแล้วจะเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญของแผนแบบนี้ เช่น กลุ่มนอกโครงการอาจเอาอย่างกลุ่มในโครงการโดยไม่ได้ตั้งใจ (spillover effect) ทำให้การเปรียบเทียบคลาดเคลื่อนได้


แผนแบบนี้เป็นอีกแผนแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในการเปรียบเทียบผลได้ของกลุ่มในโครงการกับกลุ่มนอกโครงการ เพราะว่าเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนแบบแรก เนื่องจากเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว การใช้แผนแบบนี้เราสามารถที่จะประเมินผลโครงการที่ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลก่อนโครงการไว้ สำหรับประชากรในโครงการกับนอกโครงการจะเป็นคนละพวกกัน

2. การประเมินผลแบบไม่มีแผนแบบทดลอง การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตรอีกวิธีหนึ่งคือการประเมินผลที่ไม่ใช้แผนแบบทดลอง (non-experimental design) การประเมินผลโดยวิธีนี้จะต่างจากการประเมินผลโดยใช้แผนแบบทดลอง คือ จะไม่มีกลุ่มควบคุมเหมือนวิธีแรก เช่น ประเมินผลผลการดำเนินงานโครงการโดยการเปรียบเทียบผลได้ของโครงการกับผลได้ของโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือเปรียบเทียบผลได้ของโครงการกับเป้าหมาย โดยจะไม่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดก่อนและหลังโครงการหรือในและนอกโครงการ

สรุป แผนแบบการประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมี 2 วิธี คือ การประเมินผลโดยใช้แผนแบบทดลอง และการประเมินผลโดยไม่ใช้แผนแบบทดลอง ซึ่งจะต่างจากการประเมินผลโดยใช้แผนแบบทดลอง คือ จะไม่มีกลุ่มควบคุมเหมือนวิธีแรก เช่น ประเมินผล ผลการดำเนินงานโครงการโดยการเปรียบเทียบผลได้ของโครงการกับผลได้ของโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือเปรียบเทียบผลได้ของโครงการกับเป้าหมาย โดยจะไม่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดก่อนและหลังโครงการ หรือในและนอกโครงการ สำหรับการประเมินผลโดยใช้แผนแบบทดลองแบ่งเป็น 3 แบบ คือ แผนแบบวัดก่อนและหลังไม่มีกลุ่มควบคุม แผนแบบวัดก่อนและหลังมีกลุ่มควบคุม และแผนแบบวัดหลังมีกลุ่มควบคุม

ประเด็นหลักในการประเมินผล

ในการประเมินผลมีประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการหลายประเด็น ตั้งแต่เริ่มต้น การดำเนินงาน และสิ้นสุดการดำเนินงาน อาจรวมถึงการประเมินผลหลังสิ้นสุดการดำเนินงานแล้วระยะหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและความต้องการของผู้บริหารงาน (ภาพที่ 10.3)

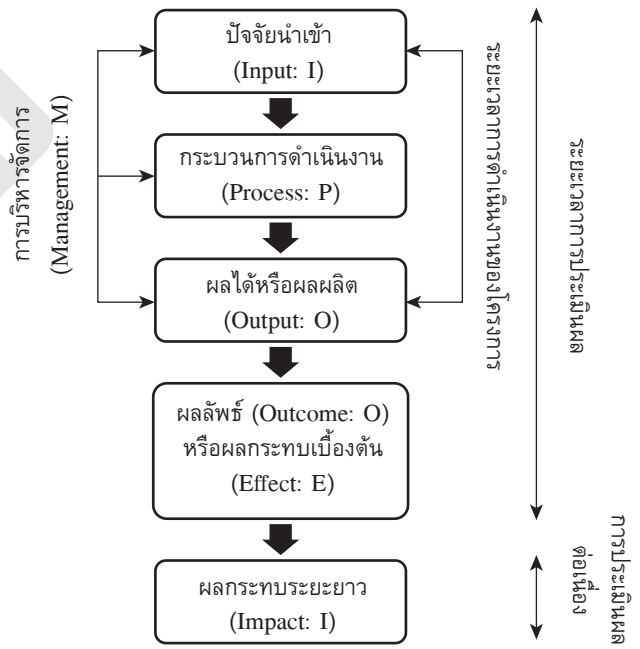


ภาพที่ 10.3 ขั้นตอนและประเด็นหลักในการประเมินผล

จากภาพที่ 10.3 จะเห็นว่าการประเมินผลในช่วงระหว่างดำเนินการตามโครงการจะมี 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ปัจจัยนำเข้า (Input) 2) กระบวนการดำเนินงาน (Process) 3) ผลได้หรือผลผลิต (Output) 4) ผลกระทบเบื้องต้น (Effect) หรือผลลัพธ์ (Outcome) และ 5) การบริหารจัดการ (Management) ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการประเมินผลอาจเลือกประเด็นไม่ครบทุกประเด็นก็ได้ เช่น การประเมินผลปัจจัยนำเข้า

(บุคลากร งบประมาณ และสิ่งของ) การประเมินผลกระบวนการดำเนินงาน (การฝึกอบรม การสาธิต) และการประเมินผลผลได้ (จำนวนคนที่ผ่านการอบรม เนื้อที่ปลูกที่ได้รับการส่งเสริม) ซึ่งเป็นการประเมินผล 3 ประเด็น หรืออาจเพิ่มอีก 1-2 ประเด็น เช่น การประเมินผลกระทบเบื้องต้นหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น) และการประเมินผลการบริหารภาพรวมทั้งโครงการ (ประสิทธิภาพประสิทธิผล)

อย่างไรก็ตาม ถ้าประเมินผลเฉพาะผลกระทบ ไม่ประเมินผลปัจจัยนำเข้าหรือกระบวนการดำเนินงานก็อาจจะไม่ทราบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์เพราะสาเหตุอะไร เช่น ปัจจัยนำเข้าไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือกระบวนการดำเนินงานไม่เหมาะสม เป็นต้น และทั้ง 5 ประเด็นที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการประเมินผลถึงช่วงสิ้นสุดโครงการเท่านั้น หากต้องการประเมินผลกระทบระยะยาว (Impact) ที่เกิดขึ้น เช่น เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และเกษตรกรทั่วไปบริเวณข้างเคียงมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกตามแนวทางที่ส่งเสริมเพิ่มขึ้นหรือไม่ (spillover effect) เป็นต้น จะต้องดำเนินการภายหลังสิ้นสุดโครงการแล้วสักระยะหนึ่ง เช่น 1-3 ปี เป็นต้น

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวปีงบประมาณ 2559 ของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แสดงไว้ในภาพที่ 10.4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

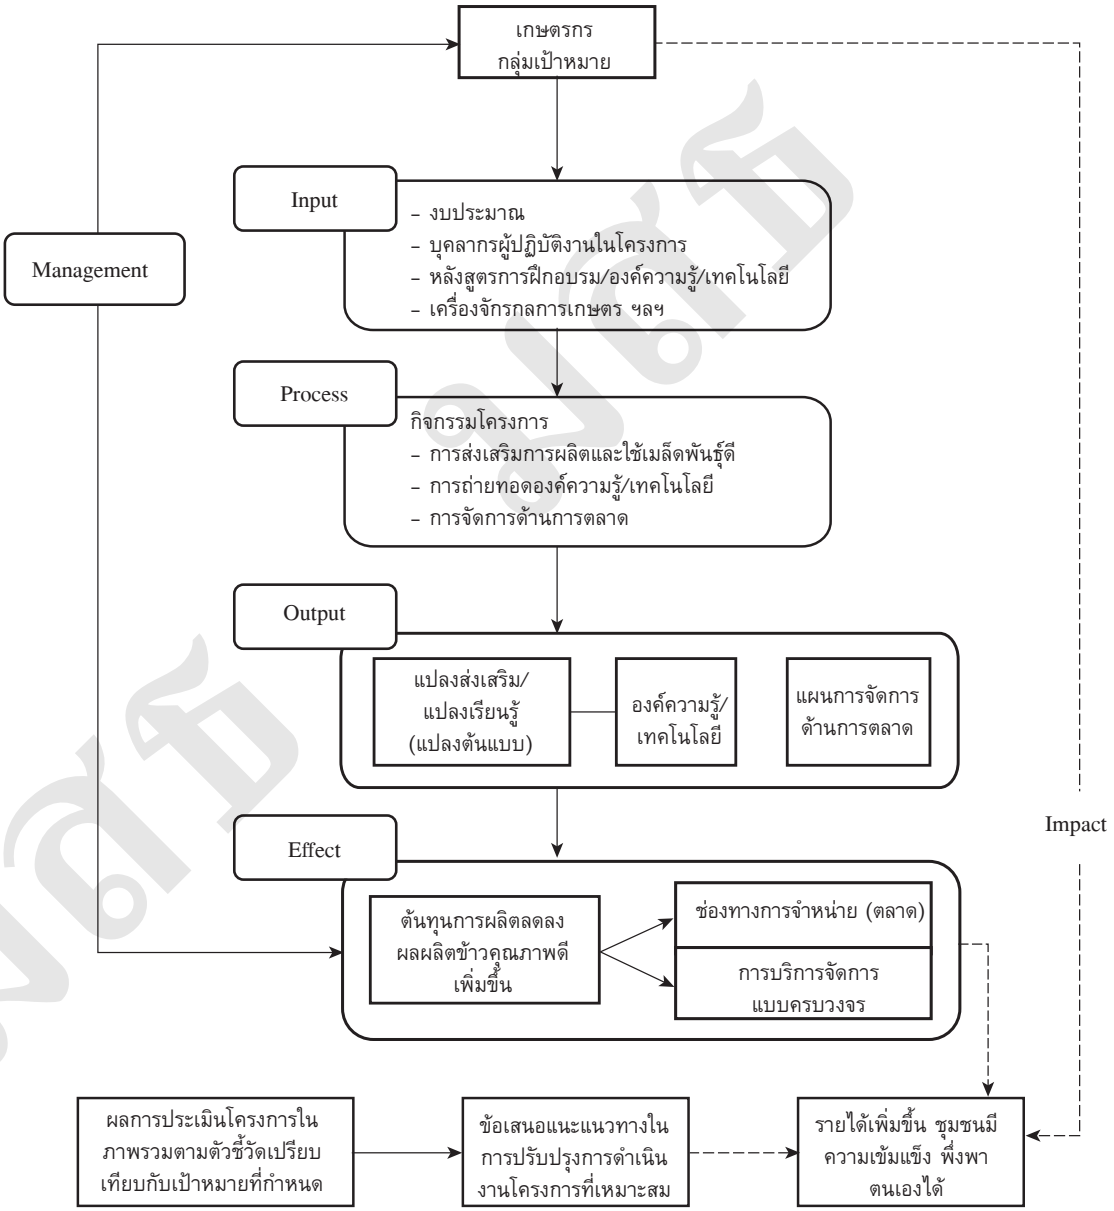

ภาพที่ 10.4 กรอบแนวคิดการประเมินผล โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปีงบประมาณ 2559

ที่มา: ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2560)

กล่าวโดยสรุป การประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินผล 2) ศึกษารายละเอียดของงานที่จะประเมินผล 3) จัดทำข้อเสนอโครงการประเมินผล 4) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 5) ดำเนินการประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูล และ 6) จัดทำรายงานการประเมินผล ส่วนแผนแบบการประเมินผลมี 2 แบบใหญ่ๆ คือ มีแผนแบบทดลองและแบบไม่มีแผนแบบทดลอง ในส่วนของประเด็นหลักในการประเมินผลมี 5 ประเด็น คือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน ผลได้หรือผลผลิต ผลลัพธ์หรือผลกระทบเบื้องต้น และผลกระทบระยะยาว

กิจกรรม 10.2.2

1. ขั้นตอนการประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง จงอธิบาย
2. แผนแบบการประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมีอะไรบ้าง จงอธิบาย

แนวตอบกิจกรรม 10.2.2

1. ขั้นตอนการประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
   1) ศึกษาความต้องการใช้ผลการประเมินผล
   2) ศึกษารายละเอียดของงานที่จะประเมินผล
   3) จัดทำข้อเสนอการประเมินผล
   4) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
   5) ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
   6) จัดทำรายงานการประเมินผล
2. แผนแบบการประเมินผล มีดังนี้
   1) การประเมินผลโดยมีแผนแบบการทดลอง ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 แบบ
      1.1) แผนแบบวัดก่อนและหลังไม่มีกลุ่มควบคุม
      1.2) แผนแบบวัดก่อนและหลังมีกลุ่มควบคุม
      1.3) แผนแบบวัดหลังมีกลุ่มควบคุม
   2) การประเมินผลแบบไม่มีแผนแบบทดลอง

ตอนที่ 10.3
ตัวชี้วัดในการประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง

10.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

10.3.2 ลักษณะของตัวชี้วัดในการประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

10.3.3 การจัดทำข้อเสนอโครงการประเมินผล การจัดทำรายงานการประเมินผล และตัวอย่างตัวชี้วัดในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

แนวคิด

1. การประเมินผลไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานปกติหรืองานตามแผนงานโครงการก็ตาม ต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดตัวชี้วัดขึ้นมาทั้งสิ้น
2. ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี คือ ตรงประเด็น มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกองค์การน้อย มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดีและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ทั้งผู้รับการประเมินผล ผู้ทำการประเมินผลและผู้ใช้ประโยชน์จากการประเมินผล
3. ในทุกแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินงาน จะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนและจัดทำโครงการประเมินผล เพื่อให้ผู้บริหารองค์การหรือผู้บริหารที่เป็นเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบผลการดำเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการตามตัวอย่างท้ายเรื่อง

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 10.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. สร้างตัวชี้วัดในการประเมินผลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
2. จัดทำข้อเสนอโครงการประเมินผลได้
3. จัดทำรายงานผลการประเมินผลได้

เรื่องที่ 10.3.1
แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตัวชี้วัด (Indicator) เป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์การหรือการบริหารโครงการภายใต้องค์การ ทั้งองค์การภาคเอกชนและภาครัฐ การบริหารงานที่ขาดตัวชี้วัดหรือมีตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ผู้บริหารไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวของการดำเนินงานได้ ดังนั้นในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการหรือตามภารกิจประจำขององค์การจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องและผลที่ได้จากการดำเนินงานเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์หรือใช้ผลประเมินที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป ตัวชี้วัดสามารถนำมาใช้ได้กับทุกระดับตั้งแต่ระดับโครงการแผนงาน หน่วยงานไปจนถึงระดับประเทศ

โดยทั่วไปแล้วการสร้างตัวชี้วัดไม่ได้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนแต่อย่างใด แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความสำคัญเท่าใดนัก จึงไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดก่อนการดำเนินงาน แต่จะมากำหนดในภายหลัง ซึ่งความเป็นจริงแล้วก่อนจะลงมือทำอะไรจะต้องถามตนเองก่อนว่า “จะวัดผลอย่างไร” เพราะถ้ามากำหนดในภายหลังก็อาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามถ้าจะให้ได้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมและตรงประเด็นมากที่สุดนั้น ผู้กำหนดตัวชี้วัดจะต้องเป็นผู้ที่รู้เรื่องหรือรู้วัตถุประสงค์สิ่งที่จะวัดเป็นอย่างดีด้วย

ความหมายของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึง เครื่องมือหรือสิ่งที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล บางครั้งเรียกว่า “เครื่องชี้” หรือ “เครื่องชี้วัด” ตัวชี้วัดอาจเป็นตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น มาก น้อย ดีมาก ดี หรือต้องปรับปรุง แต่ตัวชี้วัดที่ดีต้องเป็นตัวชี้วัดที่สามารถแสดงเป็นตัวเลขเชิงปริมาณ (Quantitative) ได้ เพราะง่ายต่อการพิจารณาตัดสินใจ ไม่ต้องใช้ดุลยพินิจมาก โดยจะมีค่าที่มีลักษณะหรือหน่วยวัดแตกต่างออกไป หรือไม่มีหน่วยก็ได้ เช่น จำนวน (Number) สัดส่วน (Proportion) ร้อยละ (Percentage) อัตราส่วน (Ratio) ค่าเฉลี่ย (Mean หรือ Average) และเลขดัชนี เป็นต้น ตัวอย่างตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ร้อยละของเกษตรกรที่มีการทำการเกษตรอินทรีย์ อัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของสหกรณ์การเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าค่าของตัวชี้วัดเหล่านี้อาจมีหน่วยวัดที่แตกต่างกัน เช่น ครัวเรือน บาทต่อครัวเรือน หรือไม่มีหน่วยเลยก็ได้ เช่น ดัชนีซึ่งมีรายละเอียดลักษณะตัวชี้วัดในรูปแบบดัชนี

อย่างไรก็ดีมีนักวิชาการหลายท่านไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่าง “ตัวชี้วัด” กับ “ดัชนี” อย่างชัดเจน แต่เรียกรวมๆ เป็นคำเดียวกัน คือ “ดัชนีชี้วัด” หรือ “เครื่องชี้วัด” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ดัชนี (Index) เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ คือ ไม่มีหน่วยเพื่อใช้ประโยชน์ในการวัดภาพรวมหรือเปรียบเทียบ โดยจะมีการคำนวณต่อเนื่องจากตัวชี้วัดตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้ เช่น ในกรณีของราคาสินค้า จะใช้ราคาหรือราคาเฉลี่ยของสินค้าแต่ละชนิดเป็นตัวชี้วัดโดยตรงก็ได้ เช่น บาท/กิโลกรัม แต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบว่าราคาสินค้าชนิดนั้นๆ ขึ้นหรือลงมากน้อยคิดเป็นร้อยละเท่าใดก็สามารถคำนวณเป็นดัชนีราคาได้ โดยกำหนดให้ราคา ณ จุดใดจุดหนึ่งเป็นฐานและเทียบจุดที่เป็นฐานให้เท่ากับ “100” ส่วนราคา ณ จุดอื่นๆ ก็คำนวณเป็นเลขดัชนีโดยการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ หรือในบางกรณีถ้าต้องการทราบภาพรวมของสินค้าในหมวดใดหมวดหนึ่ง เช่น หมวดอาหารที่มีสินค้าอยู่หลายชนิดว่าราคาสินค้าหมวดดังกล่าวนั้นขึ้นหรือลง ซึ่งตามข้อเท็จจริงมักปรากฏว่าสินค้าบางชนิดราคาสูงขึ้น บางชนิดราคาลดลง บางชนิดซื้อขายกันน้อย บางชนิดซื้อขายกันมาก และหน่วยที่ใช้วัดก็ไม่เหมือนกัน เช่น บาทต่อกิโลกรัม บาทต่อผล บาทต่อตัว เป็นต้น จึงไม่สามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการคำนวณค่า “ดัชนี” โดยมีการถ่วงน้ำหนัก (Weight) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย ซึ่งจะกำจัดเรื่องหน่วยวัดออกไป เพราะโดยปกติแล้วมูลค่าการซื้อขายสินค้าแต่ละชนิดมักจะไม่เท่ากันผลการคำนวณจะได้ค่าดัชนีราคาที่เป็นตัวเลขออกมาเพียงค่าเดียว และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้ในปีฐาน โดยให้ปีฐานเท่ากับ 100 ก็จะทราบจากค่าดัชนีที่คำนวณได้ว่าราคาภาพรวมของสินค้าหมวดนั้นของปีนั้นๆ สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาปีฐานอยู่เท่าใด เป็นต้น ดังนั้นในกรณีนี้ค่าดัชนีราคาอาจมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่า 100 ก็ได้

2. ดัชนีรวม (Composite Index) เป็นดัชนีที่ได้จากการเฉลี่ยเลขดัชนีหลายดัชนี ซึ่งการหาค่าเฉลี่ยนั้นอาจเป็นการเฉลี่ยเลขคณิตธรรมดาไม่มีการถ่วงน้ำหนักหรือมีการถ่วงน้ำหนัก ถ้าเห็นว่าดัชนีแต่ละตัวมีความสำคัญไม่เท่ากัน เช่น กรณีการวัดผลสำเร็จในบางเรื่องอาจมีหลายมิติ (Dimension) หรือหลายประเด็นย่อยหรือประกอบไปด้วยหลายดัชนี ดังนั้นถ้าต้องการสรุปในภาพรวมจำเป็นต้องสร้างดัชนีรวมขึ้นมา เพื่อให้เหลือเพียงดัชนีหรือตัวเลขเพียงตัวเดียว เช่น การวัดผลการพัฒนามนุษย์ (Human Development) ของ UNDP (United Nations Development Programme) จะมีการวัดอยู่ 3 มิติ คือ มิติด้านการมีชีวิตสุขภาพที่ยืนยาว (A long and healthy life) มิติด้านความรู้ (Knowledge) และมิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ (A decent standard of living) โดยในด้านการมีชีวิตสุขภาพที่ยืนยาวมี 1 ตัวชี้วัด และแปลงเป็นดัชนีได้ 1 ดัชนี ด้านความรู้มี 2 ตัวชี้วัด คืออัตราผู้ใหญ่ที่อ่านออกเขียนได้ (Adult Literacy Rate) และอัตราส่วนการศึกษาต่อ (Gross Enrollment Ratio) ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดนำมาสร้างเป็นดัชนีจะได้ 2 ดัชนี และทั้ง 2 ดัชนีก็จะนำมาคำนวณเป็นดัชนีรวมของมิติด้านความรู้ ซึ่งมีค่า 1 ค่า ส่วนมิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ ตัวชี้วัดที่ใช้ คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ต่อหัว หรือ GDP per capita ซึ่งสามารถแปลงเป็น GDP Index ได้เช่นเดียวกัน และจากดัชนีทั้ง 3 มิติ (รวม 4 ตัวชี้วัด และแปลงเป็น 4 ดัชนี) นำมาคำนวณเป็นดัชนีรวมของการพัฒนาคน (Human Development Index: HDI) ได้ 1 ตัว หรือ 1 ค่า อย่างไรก็ตามในการวัดผลการดำเนินงานโดยใช้ค่าดัชนีหรือดัชนีรวม แม้จะสะดวกต่อการเปรียบเทียบระหว่างกรณีต่างๆ เช่น เปรียบเทียบ

กับอดีต เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่หรือระหว่างประเทศก็ตาม แต่ก็มีจุดอ่อนเพราะค่าของดัชนีโดยตัวมันเองจะไม่มีความหมายมากนัก เนื่องจากไม่มีหน่วย ดังนั้นถ้าจะศึกษาพิจารณาให้ถ่องแท้ต้องมีตัวชี้วัดระดับย่อยด้วย ถึงแม้ว่าจะมีมิติเดียวก็ตาม เช่น มิติด้านเศรษฐกิจหรือการเงินก็อาจจะต้องใช้ตัวชี้วัดหลายตัวจึงจะทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด เช่น แทนที่จะมีเฉพาะตัวชี้วัดผลกำไรเพียงอย่างเดียวจะต้องมีตัวชี้วัดอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น หนี้สินและทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น หรือกรณีของดัชนีราคาผู้บริโภค การที่ดัชนีราคาสูงขึ้นก็ไม่ได้บอกสินค้าอะไรหรือหมวดใดสูงขึ้นมากน้อยอย่างไร ดังนั้นต้องไปดูที่ดัชนีหรือตัวชี้วัดย่อยด้วย เช่น ราคาของสินค้าแต่ละตัวหรือแต่ละหมวด เป็นต้น

ความสำคัญของตัวชี้วัด

ในการดำเนินกิจกรรมขององค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือองค์การภาคเอกชนก็ตาม ผู้ที่รับผิดชอบในฐานะผู้บริหารขององค์การจะต้องมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้กิจกรรมเหล่านั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการติดตามประเมินผลก็คือ “ตัวชี้วัด” การบริหารงานที่ไม่มีการติดตามหรือขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจนย่อมไม่เป็นผลดีต่อองค์การ เพราะไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใด ลูกค้าหรือประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่ ความสำคัญของการมีตัวชี้วัดในกรณีส่วนบุคคลเปรียบเสมือนการตรวจเลือดเป็นระยะๆ ซึ่งจะมีค่าต่างๆ เช่น ปริมาณไขมันในเลือด ปริมาณน้ำตาลในเลือด ที่จะเป็นตัวชี้วัดสุขภาพอย่างหนึ่งของมนุษย์ ในกรณีของรถยนต์มาตรวัดความร้อนหรือปริมาณน้ำมันในถังก็จะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ ในกรณีขององค์การตัวชี้วัดจึงเป็นเสมือนเครื่องชี้วัดสุขภาพขององค์การ การบริหารงานที่ไม่มี “ตัวชี้วัด” เหมือนคนเดินป่าหรือเดินเรือในทะเลปราศจากเข็มทิศ (ในปัจจุบันนิยมใช้ Global Positioning System: GPS ด้วย เพราะจะรู้ตำแหน่งต่างๆ บนโลกได้อย่างแม่นยำ) ย่อมจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางหรือถ้าไปถึงเป้าหมายได้ก็อาจจะล่าช้าไม่ทันต่อเวลา

ในหลายกรณีการมีตัวชี้วัดที่ถูกต้องชัดเจนจะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นก็จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการบริหารองค์การสมัยใหม่ได้มีการนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารงานกันมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องมีตัวชี้วัดประกอบการดำเนินงานด้วย เช่น การใช้กระบวนการเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) โดยการเปรียบเทียบวิธีการที่องค์การของเราปฏิบัติอยู่กับวิธีการที่ได้ชื่อว่าเป็นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ดีที่สุด (Best practice) ขององค์การอื่น โดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติของเราให้ดีเท่ากับหรือว่าดีกว่าองค์การที่เราใช้เปรียบเทียบ หรือการใช้เทคนิคการวัดผลการดำเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard: BSC) ที่มีตัวชี้วัดที่สำคัญครอบคลุมทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโตขององค์การมาเป็น

เครื่องมือในการประเมินผลองค์การแทนที่จะใช้เฉพาะตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงินอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์การให้ดีขึ้นเช่นเดียวกัน

องค์ประกอบในการจัดทำตัวชี้วัด

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันทั้งฝ่ายที่ถูกประเมินและผู้ประเมินในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายหรือผู้บริหารไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาคำนวณเป็นตัวชี้วัด รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการติดตาม กำกับดูแลโดยผู้บริหารและการประสานงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจัดทำเป็นตารางสรุปองค์ประกอบในการจัดทำตัวชี้วัดโดยมีรายการต่างๆ ดังนี้ (ตารางที่ 10.2)

1. มิติ (Dimension) ในกรณีการติดตามประเมินผลมีขอบเขตกว้างขวาง การกำหนดตัวชี้วัดสามารถแบ่งออกเป็นมิติต่างๆ ก่อนก็ได้ เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2. ประเด็น (Issue) ในแต่ละมิติอาจมีเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามประเมินผลหลายเรื่อง เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีประเด็นย่อย เช่น ประเด็นรายได้ ประเด็นการจ้างงาน มิติด้านสังคม อาจมีประเด็นย่อย คือ ประเด็นการศึกษา ประเด็นสุขภาพอนามัย และประเด็นชีวิตครอบครัว เป็นต้น

3. ตัวชี้วัด (Indicator) ในแต่ละประเด็นต้องกำหนดตัวชี้วัด/ดัชนีขึ้นมา โดยระบุสูตรคำนวณที่ชัดเจน (ถ้ามี) และในแต่ละประเด็นอาจมีตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัวก็ได้ เช่น ประเด็นรายได้ ตัวชี้วัดอาจจะเป็นรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนและจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน เป็นต้น

4. ตัวแปร (Variable) ในการคำนวณตัวชี้วัดแต่ละตัว อาจมีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวก็ได้ เช่น กรณีของตัวชี้วัดที่เป็นอัตราส่วน ซึ่งมีตัวแปรตัวหนึ่งเป็นเศษและอีกตัวหนึ่งเป็นส่วน ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวชี้วัด คือ หนี้สินต่อทรัพย์สิน ตัวแปรที่เป็นเศษคือหนี้สิน ตัวแปรที่เป็นส่วนคือทรัพย์สิน เป็นต้น โดยในแต่ละตัวแปรต้องมีคำนิยามให้ชัดเจนด้วย

5. แหล่งข้อมูลและวิธีการได้มาของข้อมูล ในแต่ละตัวแปรต้องกำหนดแหล่งหรือวิธีการได้มาของข้อมูลให้ชัดเจน รวมทั้งความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลด้วย เช่น ข้อมูลรายได้จะได้จากการสำรวจรายได้ของครัวเรือน โดยจะทำปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น

6. เกณฑ์การพิจารณา แต่ละตัวชี้วัดต้องกำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะให้คะแนนอย่างไรหรือจะเปรียบเทียบกับอะไร มีเกณฑ์การตัดสินอย่างไร และถ้าต้องการคำนวณค่าดัชนีรวมก็ต้องกำหนดน้ำหนัก (Weight) ของตัวชี้วัดแต่ละตัวด้วย เช่น ตัวชี้วัดรายได้ของโครงการแห่งหนึ่งอาจกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ว่า ถ้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สุทธิของครอบครัวต่ำกว่า 10,000 บาท จะให้คะแนนเท่ากับ 1 ถ้ามีรายได้สุทธิตั้งแต่ 10,000 แต่ไม่เกิน 20,000 บาท จะให้คะแนนเท่ากับ 2 และถ้ามีรายได้สุทธิตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จะให้คะแนนเท่ากับ 3 ซึ่งสามารถนำไปจัดกลุ่มและจัดทำเป็นดัชนีรวมได้ หรือเปรียบเทียบรายได้ของครอบครัวกับเกณฑ์ที่กำหนดว่าต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ โดยเกณฑ์อาจเป็นระดับรายได้เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือเส้นความยากจน เป็นต้น

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการคำนวณตัวชี้วัดแต่ละตัวต้องระบุให้ชัดเจนว่า หน่วยงานใดหรือใครเป็นคนรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและคำนวณตัวชี้วัดอะไร ซึ่งปกติแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินผล (Evaluation Unit) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดและต้องเป็นอิสระจากหน่วยปฏิบัติงาน (Operation Unit) ที่จะถูกประเมิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ยกเว้นเป็นข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเข้ามาตามระบบบริหารงานภายในองค์การอยู่แล้ว ซึ่งถ้าใช้ระบบรายงานอาจต้องมีการสุ่มตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลที่รายงานมานั้นเป็นข้อเท็จจริงตามที่รายงานหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเอนเอียงในการรายงานข้อมูล

องค์ประกอบในการจัดทำตัวชี้วัดดังกล่าวนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานทุกด้าน รวมทั้งงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตารางที่ 10.2 องค์ประกอบในการจัดทำตัวชี้วัด

มิติและประเด็น	ตัวชี้วัด/ดัชนี พร้อมสูตรคำนวณ (ถ้ามี)	ตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ	แหล่งข้อมูล/วิธีการได้มาของข้อมูล	เกณฑ์การพิจารณา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. มิติ.....					
1.1 ประเด็น.....	1).....	1).....	.....	.....	.....
1.2 ประเด็น.....	1).....	1).....	.....	.....	.....
		2).....	.....	.....	.....
2. มิติ.....					
2.1 ประเด็น.....	1).....	1).....	.....	.....	.....
	2).....	1).....	.....	.....	.....
2.2 ประเด็น.....	1).....	1).....	.....	.....	.....
ฯลฯ		2).....			

หมายเหตุ: 1 ประเด็นอาจมีมากกว่า 1 ตัวชี้วัดก็ได้
1 ตัวชี้วัดอาจมีตัวแปรที่ใช้คำนวณมากกว่า 1 ตัวก็ได้

ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัด

การจัดทำตัวชี้วัดโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์วัตถุประสงค์ขององค์การ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมขององค์การให้ชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์อะไร เป้าหมายที่เป็นผลผลิต (Outputs) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ในระยะสั้นหรือระยะยาวคืออะไร

ในกรณีที่ต้องการวัดผลเฉพาะระดับโครงการหรือบางกิจกรรมก็จะพิจารณาเฉพาะวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น

2. กำหนดประเด็น ประมวลเป็นประเด็นที่ต้องติดตามประเมินผลให้ครบทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการใช้ปัจจัย (Input) ที่ใช้ในการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน (Process) ไปจนถึงผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ในระยะสั้น (Outcome/Effect) และผลกระทบในระยะยาวที่จะเกิดขึ้น (Impact) ถ้าวัดเฉพาะผลผลิตหรือผลลัพธ์โดยไม่ได้วัดปัจจัยก็อาจจะไม่ทราบถึงสาเหตุว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใด เช่น ได้รับงบประมาณหรือมีบุคลากรเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น

3. เลือกประเด็นสำคัญ ในแต่ละประเด็นเลือกเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ/ไม่สำเร็จของการดำเนินงาน (Critical Success Factor: CSF) หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานมากที่สุดมาเป็นประเด็นที่ต้องติดตามหรือประเมินผล

4. กำหนดตัวชี้วัด กำหนดตัวชี้วัดโดยเลือกตัวชี้วัดที่ตรงประเด็นมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อประหยัดงบประมาณและเวลาในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ซึ่งในแต่ละประเด็นอาจมีมากกว่า 1 ตัวชี้วัดก็ได้ ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องจัดทำเป็นดัชนี (Index) ขึ้นมาด้วย โดยเฉพาะกรณีที่มีตัวชี้วัดหลายตัวหรือมีเรื่องที่เกี่ยวข้องหลายประเด็นหรือหลายมิติ จะต้องจัดทำเป็นดัชนีรวม (Composite Index) เพื่อให้สามารถสรุปเป็นภาพรวมในประเด็นนั้นๆ ได้ด้วย

ในการกำหนดตัวชี้วัดขององค์การ โดยทั่วไปแล้วจะต้องกำหนดจากระดับบนลงมาถึงระดับล่าง กรณีขององค์การภาครัฐตัวชี้วัดอาจเริ่มจากกระทรวง กรม ไปจนถึงกอง/ฝ่ายต่างๆ หรือในกรณีของโครงการต้องกำหนดตัวชี้วัดภาพรวมของโครงการก่อนตัวชี้วัดของกิจกรรมย่อย (กำหนดเป้าใหญ่ก่อน) แต่ในทางการคำนวณตัวชี้วัดภาพรวมระดับบน บางกรณีอาจจะต้องเริ่มจากระดับย่อยก่อน เช่น ระดับบุคคล/ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ไปจนถึงระดับโครงการหรือระดับพื้นที่ เช่น ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดหรือดัชนีขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละระดับ โดยตัวชี้วัดระดับล่างต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับบนด้วย ในการคำนวณจากระดับย่อยมาเป็นระดับบนที่กว้างขวางขึ้น สำหรับตัวชี้วัดบางตัวอาจจะต้องมีการถ่วงน้ำหนัก (Weight) ด้วย แทนที่จะเป็นการรวมหรือหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตธรรมดา ทั้งนี้เนื่องจากในแต่ละประเด็นย่อยหรือพื้นที่ย่อยอาจมีความสำคัญไม่เท่ากัน เพราะถ้าไม่ถ่วงน้ำหนักในการคำนวณแล้วค่าดัชนีรวมอาจเอนเอียงได้

ในบางกรณีตัวชี้วัดภาพรวมอาจไม่จำเป็นต้องมาจากตัวชี้วัดระดับย่อย แต่จะวัดจากผลผลิตขั้นสุดท้ายของโครงการหรือขององค์การที่เกิดจากการทำงานอย่างบูรณาการของทุกระดับในหลายหน่วยงานภายในองค์การ เช่น ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรที่ต้องทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน โดยตัวชี้วัดระดับกระทรวงอาจจะเป็นจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน (มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) ซึ่งเป้าหมายคือ จะต้องมีจำนวนลดลง ตัวชี้วัดระดับกรมจะไม่ใช่จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจนที่แต่ละกรมเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา เพราะอาจจะเกิดการนับซ้ำซ้อน เนื่องจากการทำการเกษตรของแต่ละครัวเรือนมากจะมีหลายกิจกรรม ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือทำการประมง การแก้ไขปัญหาต้องทำอย่างบูรณาการของหลายหน่วยงาน ทั้งทางตรง เช่น สนับสนุนปัจจัยการผลิต การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และทางอ้อม เช่น การพัฒนาระบบชลประทาน การปรับปรุงบำรุงดิน

ดังนั้นตัวชี้วัดระดับกรมในกรณีนี้จะต้องเป็นตัวชี้วัดกิจกรรมของแต่ละกรมที่จะมีส่วนแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร

กรณีตัวชี้วัดเป็นรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรระดับประเทศ การคำนวณอาจได้จากการเฉลี่ย (ถ่วงน้ำหนัก) ตัวชี้วัด รายได้เฉลี่ยระดับย่อยลงมา เช่น ระดับภาค และ/หรือระดับจังหวัด เป็นต้น

5. วางระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล กำหนดรายละเอียดข้อมูลที่จะจัดเก็บในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม เช่น ก่อน หลังโครงการ หรือระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาได้

ค่าของตัวชี้วัดแต่ละตัวอาจมาจากหลายตัวแปร (Variable) ทั้งที่เป็นตัวแปร สต๊อก (Stock หรือ Inventory) ที่อ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น จำนวนปศุสัตว์ ณ วันที่ 1 มกราคม และตัวแปรกระแส (Flow) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคาบเวลา เช่น ผลผลิตข้าวในรอบ 1 ปีเพาะปลูก จำนวนปศุสัตว์ที่ผลิตได้ในรอบปีปฏิทิน เป็นต้น ดังนั้นต้องกำหนดคำนิยามให้ชัดเจนด้วย

ในกรณีที่ตัวชี้วัดที่เป็นอัตราส่วน (ratio) ที่มีลักษณะเป็นเศษส่วน ตัวแปรที่เป็นเศษอาจได้ข้อมูลมาจากแหล่งหนึ่ง ตัวแปรที่เป็นส่วนอาจได้ข้อมูลมาจากอีกแหล่งหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งบางรายการอาจเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) และบางรายการเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ซึ่งผู้ประเมินต้องจัดเก็บเอง โดยสำรวจจากทุกรายหรือสุ่มตัวอย่างบางรายในบางพื้นที่โดยวิธีการต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตหรือการวัดโดยใช้อุปกรณ์บางชนิดและดำเนินการเป็นการเฉพาะเรื่อง หรือบูรณาการให้อยู่ในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดำเนินการเป็นปกติอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีการกำหนดแหล่งข้อมูลและช่วงเวลาที่อ้างอิงให้ชัดเจนด้วย เช่น ในรอบปีหมายถึงปีปฏิทิน (ม.ค.–ธ.ค.) ปีงบประมาณ (ต.ค.–ก.ย.) ปีเพาะปลูก (เม.ย.–มี.ค.) หรือช่วงเวลาอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงความถูกต้องและความรวดเร็วของการได้มาซึ่งข้อมูล รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วย

กรณีที่ต้องใช้วิธีการสำรวจด้วยตัวอย่าง (sample survey) จะต้องมีการกำหนดแผนแบบการสุ่มตัวอย่าง (sampling design) และจำนวนตัวอย่าง (sample size) ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ตัวแทน (ตัวอย่าง) ที่ดี ผลการคำนวณตัวชี้วัดที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือและไม่เกิดความเอนเอียง (Biased) ในทางสถิติ

กล่าวโดยสรุป ตัวชี้วัด หมายถึง เครื่องมือหรือสิ่งที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จ หรือไม่สำเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อการบริหารองค์การ หรือแผนงาน/โครงการต่างๆ โดยมีองค์ประกอบในการจัดตัวชี้วัด 7 ด้าน คือ 1) มิติ 2) ประเด็น 3) ตัวชี้วัด 4) ตัวแปร 5) แหล่งข้อมูลและวิธีการได้มาของข้อมูล 6) เกณฑ์การพิจารณา และ 7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำหรับขั้นตอนจัดทำตัวชี้วัด มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์ข้อมูล 2) กำหนดประเด็น 3) เลือกประเด็นสำคัญ 4) กำหนดตัวชี้วัด และ 5) วางระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล

กิจกรรม 10.3.1

1. องค์ประกอบในการจัดทำตัวชี้วัดมีอะไรบ้าง
2. ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดมีอะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 10.3.1

1. องค์ประกอบในการจัดทำตัวชี้วัดมี 7 องค์ประกอบ ได้แก่
   1) มิติ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
   2) ประเด็น เช่น รายได้ การจ้างงาน การศึกษา และสุขอนามัย เป็นต้น
   3) ตัวชี้วัด เช่น เนื้อที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
   4) ตัวแปรที่ใช้ประกอบการคำนวณตัวชี้วัด
   5) แหล่งข้อมูลและวิธีการได้มาของข้อมูล
   6) เกณฑ์การพิจารณา เพื่อกำหนดว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่
   7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องระบุว่าตัวชี้วัดแต่ละตัวจะมีหน่วยงานใดรับผิดชอบ
2. ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดมี 5 ขั้นตอน ได้แก่
   1) วิเคราะห์ข้อมูล
   2) กำหนดประเด็น
   3) เลือกประเด็นสำคัญ
   4) กำหนดตัวชี้วัด
   5) วางระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล

เรื่องที่ 10.3.2
ลักษณะของตัวชี้วัดในการประเมินผลเพื่อการบริหารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ลักษณะทั่วไปของตัวชี้วัด

สำหรับลักษณะของตัวชี้วัดที่นำเสนอในที่นี้เป็นเพียงบางส่วนของตัวชี้วัดจริงๆ และเป็นตัวชี้วัดอย่างง่ายๆ เท่านั้น เช่น

1. ตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ตัวชี้วัดบางตัวอาจใช้ข้อมูลดิบจากการสำรวจ/รวบรวมโดยตรงได้เลย เช่น จำนวน (Number) หรือรายได้ของครัวเรือน เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีการประมวลผลอีก เช่น

1.1 จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน (จำนวนครัวเรือนที่มีฐานะยากจน) จะได้จากการสำรวจรายได้ของครัวเรือนเกษตรและนำมาเปรียบเทียบกับค่าของเส้นความยากจนตามเกณฑ์ที่กำหนด และนำมาจำแนกพร้อมกับนับจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนออกมา

สำหรับเส้นความยากจน (Poverty Line) นี้เป็นเกณฑ์ที่คำนวณมาจากความต้องการบริโภคอาหารและสินค้าที่จำเป็นพื้นฐานเพียงพอต่อการดำรงชีพของแต่ละคน มีหน่วยเป็นบาท/คน/เดือน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในปี 2560 เส้นความยากจนเฉลี่ยทุกอาชีพทั่วประเทศเท่ากับ 2,686 บาท/คน/เดือน (มีข้อมูลระดับภาคและจังหวัดด้วย) และจำนวนคนจน (อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน) เท่ากับ 5.325 ล้านคน หรือเท่ากับ 7.87% ของประชากรทั้งหมด

1.2 รายได้ของครัวเรือนเกษตร ค่าของตัวชี้วัดนี้อาจจะได้จากการสำรวจ หรือการลงบัญชีของครัวเรือนเกษตร โดยเป็นข้อมูลดิบ ไม่ต้องมีการคำนวณอะไรอีก ซึ่งจะเป็นข้อมูลของแต่ละครัวเรือนทุกครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรในขอบเขตที่ต้องการประเมิน

2. ตัวชี้วัดที่เป็นค่าเฉลี่ย (Average) เป็นการหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลดิบ ซึ่งอาจเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตธรรมดา (Arithmetic Mean) ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เช่น

2.1 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเกษตร เป็นการหาค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องมีข้อมูลรายได้รวมของทุกครัวเรือนหารด้วยจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ในทางปฏิบัติถ้าไม่สามารถสำรวจได้จากทุกครัวเรือน (Complete Enumeration) เพราะจะเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายสูง ก็อาจดำเนินการโดยการสำรวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey) และใช้วิธีการทางสถิติประมาณการ (Estimate) เป็นค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งหมดก็ได้

2.2 จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนเกษตร

ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง การคำนวนตัวชี้วัดจำนวนหนี้สินต่อครัวเรือนเกษตร ดังตัวอย่างกรณี 1 และกรณี 2 ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนเงินที่เกษตรกรกู้ยืมทั้งหมดรวมทุกครัวเรือน (บาท)}}{\text{จำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมด (ครัวเรือน)}} \quad \text{กรณี 1}$$

$$= \frac{\text{จำนวนเงินที่เกษตรกรกู้ยืมทั้งหมดรวมทุกครัวเรือน (บาท)}}{\text{จำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมด (ครัวเรือน)}} \quad \text{กรณี 2}$$

หน่วยเป็น บาท/ครัวเรือน

จากตัวอย่างตัวชี้วัด กรณี 1 และกรณี 2 เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตธรรมดาทั้งคู่ แต่ความหมายของจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนเกษตร กรณี 1 และกรณี 2 จะไม่เหมือนกัน และส่วนใหญ่จะมีค่าไม่เท่ากัน เนื่องจากตัวหาร (ส่วน) ที่เป็นรากฐานในการคำนวณอาจมีค่าไม่เท่ากัน เพราะบางครัวเรือนอาจไม่มีการกู้ยืมเงินเลยก็ได้ การที่จะเลือกใช้ตัวใดเป็นตัวฐานในการคำนวณนั้นขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ประเมิน เพียงแต่แปลความหมายให้ถูกต้องตามฐานที่ใช้ในการคำนวณเท่านั้น

ในบางกรณีการใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัดอาจไม่เหมาะสมก็ได้ เช่น รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนโดยเฉพาะกรณีที่มีครัวเรือนที่ยากจนจำนวนมาก แต่มีครัวเรือนที่มีรายได้มากจำนวนน้อย การที่เอารายได้ของครัวเรือนที่รายได้มากมารวมกับครัวเรือนที่ยากจนแล้วหาค่าเฉลี่ย ซึ่งจะได้ค่าเฉลี่ยสูง อาจทำให้เข้าใจว่าภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้สูง เป็นต้น ซึ่งไม่ถูกต้อง ดังนั้นอาจต้องใช้คู่กับตัวชี้วัดอื่นด้วย เช่น จำนวนครัวเรือนที่ยากจน หรือใช้ค่าฐานนิยาม (Mode) ของรายได้ซึ่งเท่ากับรายได้ที่มีความถี่ของจำนวนครัวเรือนมากที่สุดของประชากรหรือใช้ค่ามัธยฐาน (Median) ของรายได้ซึ่งเท่ากับรายได้ของครัวเรือนที่อยู่ตรงกลางของครัวเรือนทั้งหมด เมื่อมีการจัดเรียงครัวเรือนตามรายได้ของครัวเรือนแล้ว

2.3 ราคาเฉลี่ยสินค้าเกษตร เป็นตัวอย่างตัวชี้วัดที่ใช้ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก เช่น ถ้าต้องการหาราคาเฉลี่ยทั้งปี ซึ่งเป็นการเฉลี่ยข้อมูลราคารายเดือน โดยใช้ปริมาณผลผลิตที่มีการซื้อขายในแต่ละเดือนเป็นค่าที่ใช้ถ่วงน้ำหนัก กรณีที่ไม่มีข้อมูลปริมาณการซื้อขายรายเดือนก็อาจจะใช้ปริมาณผลผลิตรายเดือนเป็นค่าที่ใช้ถ่วงน้ำหนักเป็นตัวแทนของปริมาณการซื้อขาย หรือราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ย้อนหลัง 4 เดือน เช่น เริ่มจากราคาเฉลี่ยระหว่างมกราคมถึงเมษายน ค่าเฉลี่ยถัดไปก็จะตัดเดือนมกราคมทิ้งและเพิ่มเดือนพฤษภาคมเข้าไป คือ ค่าเฉลี่ยระหว่างกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม และถัดไปก็เป็นค่าเฉลี่ยของเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน เป็นต้น

3. ตัวชี้วัดที่เป็นค่าสัดส่วน (Proportion) ตัวชี้วัดที่เป็นสัดส่วน หมายถึง ค่าที่ได้จากการคำนวณค่าของตัวแปร (Variable) สองตัว โดยตัวหนึ่งเป็น “เศษ” (Numerator) อีกตัวหนึ่งเป็น “ส่วน” (Denominator) โดยตัวที่เป็นเศษเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเซทย่อย (Subset) ของตัวที่เป็นส่วน เช่น ตัวที่

เป็นส่วนคือเนื้อที่การเกษตรทั้งหมด ตัวที่เป็นเศษคือเนื้อที่ทำนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อที่การเกษตรทั้งหมด หรือตัวที่เป็นส่วนคือจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ส่วนตัวที่เป็นเศษคือจำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนทั้งหมด เป็นต้น ซึ่งค่าสัดส่วนนี้ปกติจะมีค่าต่ำกว่า “1” และสูงสุดเท่ากับ “1” ตัวอย่างของตัวชี้วัดที่มีลักษณะเป็นสัดส่วน ได้แก่

3.1 สัดส่วนของครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ตัวชี้วัดนี้ใช้เปรียบเทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมด

$$= \frac{\text{จำนวนครัวเรือนเกษตรที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน (ครัวเรือน)}}{\text{จำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมด (ครัวเรือน)}}$$

3.2 สัดส่วนของผู้ใหญ่ที่สามารถอ่านออกเขียนได้

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ใหญ่ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ (คน)}}{\text{จำนวนผู้ใหญ่ทั้งหมด (คน)}}$$

ตัวชี้วัดในการอ่านออกเขียนได้นี้ บางครั้งอาจวัดในเชิงตรงกันข้ามก็ได้ คือ อัตราผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และการคำนวณสัดส่วนของผู้ใหญ่ที่อ่านออกเขียนได้นี้ ต้องกำหนดคำนิยามของประชากรที่ศึกษาให้ชัดเจนว่า “ผู้ใหญ่” ในที่นี้หมายถึงคนที่มีอายุเท่าใด เช่น ระหว่าง 15 ปีขึ้นไป หรือระหว่าง 15–56 ปี เป็นต้น ซึ่งการที่ต้องกำหนดอายุขั้นต่ำเอาไว้จะมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ถ้ารวมเด็กอายุน้อยๆ เข้าไป ซึ่งยังไม่ได้เข้าเรียนหรือยังไม่จบหลักสูตรพื้นฐานแล้ว ค่าที่วัดออกมาอาจไม่สื่อความหมายอะไร และการที่นับรวมคนที่มีอายุมากๆ เข้าไปในฐานสำรวจและคำนวณด้วยนั้นก็อาจไม่จำเป็นเช่นเดียวกัน เพราะคนที่อยู่ในวัยชราอาจไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเท่าใดนักหรืออยู่เลยวัยการทำงานแล้ว นอกจากนี้ต้องระบุเป็นคำนิยามให้ชัดเจนด้วยว่า คนที่อ่านออกเขียนได้จะวัดด้วยอะไรคงไม่ต้องมาทดสอบความรู้เหมือนกับเด็กนักเรียน แต่อาจจะวัดโดยอ้อม เช่น วุฒิการศึกษา หรือจำนวนปีที่ศึกษา เป็นต้น

4. ตัวชี้วัดที่เป็นค่าร้อยละ (Percentage) ตัวชี้วัดที่เป็นร้อยละมีที่มา 2 ทาง คือ

4.1 ทางแรก มาจากค่าที่เป็น “สัดส่วน” แล้วคูณด้วย “100” ในกรณีนี้ค่าของร้อยละสูงสุดจะไม่เกิน “100”

4.2 ทางที่สอง มาจากการคำนวณแบบเศษส่วนเช่นเดียวกัน แต่ตัวแปรที่เป็น “เศษ” อาจไม่ได้เป็นเซทย่อยของส่วน เช่น “เศษ” คือ ผลงานที่ทำได้ “ส่วน” คือ เป้าหมาย โดยที่ผลงานในบางกรณีอาจจะมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดก็ได้ ดังนั้น เศษอาจมากกว่าส่วน ผลจากการคำนวณเศษส่วนจึงมีค่ามากกว่า “1” เมื่อคูณด้วย “100” ก็จะมากกว่า “100”

ตัวอย่างตัวชี้วัดที่เป็นร้อยละ ได้แก่

- ร้อยละของครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ตัวชี้วัดที่เป็นร้อยละจะได้จากการคูณตัวชี้วัดที่เป็นสัดส่วนด้วย “100”
- ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรม

$$= \frac{\text{จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม}}{\text{จำนวนเกษตรเป้าหมาย}} \times 100$$

การกำหนดเป้าหมายอาจกำหนดจากจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด หรือกำหนดจากบางส่วนของเกษตรกรทั้งหมดก็ได้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของโครงการ ซึ่งบางครั้งผลงานที่ทำได้อาจมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดก็ได้ ทำให้ค่าของตัวชี้วัดกรณีนี้เกิน “100” ได้ หรือเรียกว่าทำได้เกินเป้าหมายนั่นเอง

5. ตัวชี้วัดที่เป็นอัตราส่วน (Ratio) ตัวชี้วัดที่มีลักษณะที่เป็นอัตราส่วน (Ratio) จะเป็นตัวชี้วัดที่ได้จากสองตัวแปร คือ เศษและส่วน เช่นเดียวกันกับการคำนวณตัวชี้วัดแบบสัดส่วน แต่ต่างกันตรงที่ตัวชี้วัดแบบอัตราส่วนนี้มีความหมายที่กว้างกว่าสัดส่วน โดยตัวแปรที่เป็น “เศษ” อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่เป็นเซทย่อยของ “ส่วน” เลยก็ได้ และบางครั้งอาจเรียกว่า “อัตรา” (Rate) ก็ได้ นอกจากนี้อัตราส่วนบางตัวอาจมีความหมายเฉพาะก็ได้ โดยอาจเรียกว่า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ หรือตัวชี้วัดประสิทธิผลก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ตัวแปรใดเป็น “เศษ” และ “ส่วน” ซึ่งจะได้กล่าวในตอนหลัง ตัวอย่างตัวชี้วัดอัตราหรืออัตราส่วน ได้แก่

5.1 อัตราส่วนการเข้าเรียนหนังสือต่อของเด็กที่จบชั้นมัธยมปลาย

$$= \frac{\text{จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลายที่เข้าเรียนต่อ (คน)}}{\text{จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลายทั้งหมด (คน)}} \times 100$$

ซึ่งอาจจะเรียกเป็น “สัดส่วน” หรือร้อยละก็ได้ ถ้าคูณด้วย 100

5.2 อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยต่อไร่ในการปลูกข้าวของเกษตรกร

$$= \frac{\text{ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวรวมทั้งหมดของเกษตรกรทุกครัวเรือน (กก.)}}{\text{เนื้อที่ปลูกข้าวรวมทั้งหมดของเกษตรกรทุกครัวเรือน (ไร่)}}$$

(มีหน่วยเป็น กก.)

5.3 อัตราส่วนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นชายต่อหญิง

$$= \frac{\text{จำนวนเกษตรกรชายที่เข้ารับการฝึกอบรม}}{\text{จำนวนเกษตรกรหญิงที่เข้ารับการฝึกอบรม}}$$

5.4 อัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของบริษัท

$$= \frac{\text{หนี้สิน (บาท)}}{\text{ทรัพย์สิน (บาท)}} \qquad \text{(ไม่มีหน่วย)}$$

การกำหนดตัวชี้วัดโดยใช้ข้อมูลดิบหรือใช้ค่าเฉลี่ยในบางกรณีจะไม่เห็นภาพที่ชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการวัด จึงใช้ตัวชี้วัดที่เป็นอัตราหรืออัตราส่วนแทนจะเหมาะสมกว่า เช่น การศึกษาภาวะหนี้สินของเกษตรกร ถ้าวัดด้วยจำนวนเงินที่เกษตรกรเป็นหนี้สินเพียงอย่างเดียว แล้วสรุปว่าเกษตรกรรายนั้นมีปัญหาถ้ามีหนี้สินมากซึ่งความจริงแล้วอาจไม่เป็นปัญหาก็ได้ เพราะเกษตรกรบางรายกู้มาแล้วยังไม่ครบกำหนดเวลาชำระคืนหรือบางรายอาจกู้มาลงทุนหรือมาซื้อทรัพย์สิน ทำให้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ดังนั้นต้องมีตัวชี้วัดตัวอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สิน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในเชิงเปรียบเทียบ (Relative) กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรมีหนี้สิน 10,000 บาท แต่มีทรัพย์สินเพียง 50,000 บาท หรือ 20% ของทรัพย์สิน เกษตรกรรายนี้อาจจะมีปัญหามากกว่าเกษตรกรที่มีหนี้สิน 100,000 บาท แต่มีทรัพย์สิน 10,000,000 บาท หรือ 1% ของทรัพย์สิน ดังนั้นตัวชี้วัดที่เป็นสัดส่วนหรืออัตราส่วน ในกรณีนี้จึงวัดได้ดีกว่าใช้ข้อมูลดิบแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การเลือกใช้ข้อมูลก็ควรเลือกระยะเวลาที่อ้างอิงให้ถูกต้องด้วย เช่น การวัดข้อมูลหนี้สินในช่วงที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ อาจไม่สื่อความหมายมากนักเมื่อเทียบกับการวัดข้อมูลเฉพาะหนี้สินที่ครบกำหนดแล้วแต่ไม่สามารถชำระคืนได้ เป็นต้น กล่าวโดยสรุปในบางกรณีการใช้อัตราส่วนเป็นตัวชี้วัดจะทำให้มองเห็นภาพบางอย่างชัดเจนกว่าการใช้ข้อมูลดิบแต่เพียงอย่างเดียว เพียงแต่จะต้องพิจารณาดูว่าจะใช้อะไรเป็นฐาน (ส่วน) จึงจะตรงประเด็นกับสิ่งที่เราต้องทราบ

ข้อสังเกตในการเลือกตัวชี้วัดที่มีการคำนวณแบบเศษส่วนนี้ การเรียกตัวชี้วัดอาจทำให้เกิดความสับสนได้ในบางครั้ง เช่น บางครั้งควรจะเรียกเป็น “สัดส่วน” หรือ “ร้อยละ” แต่เรียกเป็น “อัตรา” หรืออัตราส่วน เช่น อัตราการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความนิยม ซึ่งปกติแล้วการเรียก “อัตราส่วน” นั้น ใช้ในความหมายที่กว้างกว่า “สัดส่วน” เพราะค่าสัดส่วนนั้น “เศษ” และ “ส่วน” จะมีหน่วยเดียวกันเสมอ จึงไม่มีหน่วยและมีค่าอยู่ระหว่าง 0–1 (หรือ 0–100 ในกรณีเป็นร้อยละ) เสมอ ส่วน “อัตรา” หรือ “อัตราส่วน” นั้นจะมีทั้งที่เป็นแบบ “ไม่มีหน่วย” ถ้าทั้งเศษและส่วนเป็นหน่วยเดียวกัน (ตัดทิ้งกันไปได้) หรือกรณีที่มี “หน่วย” เช่น บาท/ครัวเรือน ต้น/ไร่ เพราะหน่วยของเศษและส่วนอาจไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามจะเรียกอย่างไรก็ได้ ขอให้ดูสูตรคำนวณตัวชี้วัดให้ถูกต้องเหมาะสมก็พอ

6. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Efficiency) การวัดประสิทธิภาพเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างผลได้ (Output) เมื่อเทียบกับปัจจัย (Input) หรือทรัพยากร (Resource) ที่ใช้ ซึ่งตัวชี้วัดจะมีลักษณะเป็นแบบอัตราส่วน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การทำงานที่มีต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำที่สุด หรือกระบวนการผลิตที่ได้ผลผลิตสูงสุดภายใต้ต้นทุนหรือทรัพยากรที่กำหนด ซึ่งลักษณะของตัวชี้วัดจะมี 2 กรณี ดังนี้

6.1 กรณีแรก เป็นการวัดประสิทธิภาพในลักษณะต้นทุนการผลิตต่อหน่วย โดยมีสูตรคำนวณ

$$= \frac{\text{ต้นทุนทั้งหมด (Total cost)}}{\text{ผลผลิตที่ผลิตได้ทั้งหมด (Output)}}$$

มีหน่วยวัดเป็นมูลค่า (บาท) ต่อ 1 หน่วยผลผลิต เช่น บาท/กิโลกรัม หรือบาท/ไร่ เป็นต้น

ค่าที่ได้นี้ใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่มีการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน (แต่อาจจะใช้วิธีการผลิตแตกต่างกัน) ถ้าต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณได้ต่ำ ถือว่ากระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพหรือดีกว่ากระบวนการผลิตที่มีต้นทุนสูงต่อหน่วยสูง

ตัวอย่างเช่น การพัฒนาพื้นที่แห่งหนึ่งที่มีเนื้อที่ 2,000 ไร่ ต้องใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งจะได้ค่าต้นทุนการพัฒนาต่อไร่ หรือประสิทธิภาพ (การพัฒนาพื้นที่)

$$= \frac{10{,}000{,}000 \text{ (บาท)}}{2{,}000 \text{ (ไร่)}} = 5{,}000 \text{ บาท/ไร่}$$

6.2 กรณีที่สอง เป็นการวัดประสิทธิภาพในลักษณะเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ (Output) ต่อปัจจัยการผลิต (Input) ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งเรียกว่า ผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งเท่ากับผลผลิต (Output)/ปัจจัยการผลิต (Input)

ตัวอย่างเช่น การผลิตในโรงงานแห่งหนึ่งมีคนงาน 200 คน ผลิตสินค้าได้ 1,000 ชิ้นต่อวัน ประสิทธิภาพ (การผลิต) = 1,000/200 = 5 ชิ้น/คน/วัน หรือเรียกว่า ผลิตภาพแรงงาน (Productivity of Labor) เท่ากับ 5 ชิ้น/คน/วัน

กรณีของ “ผลิตภาพ” ผลงานที่ได้มักจะคิดเป็นมูลค่า เพราะง่ายต่อการเปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆ เช่น ใน 1 ชั่วโมง หรือ 1 วัน จะผลิตได้คิดเป็นมูลค่าเท่าใด เมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงงานหรือเปรียบเทียบกรณีที่มีผลผลิตมากมายหลายชนิดที่มีมูลค่าต่างกัน

ในกรณีการเปรียบเทียบโดยใช้ปริมาณผลผลิตที่ไม่ใช้หน่วยวัดเป็นมูลค่าต้องเปรียบเทียบเฉพาะกรณีผลผลิตที่ได้คุณภาพเท่ากันเท่านั้น

7. ตัวชี้วัดประสิทธิผล (Effectiveness) การวัดประสิทธิผลเป็นการวัดผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ (เชิงคุณภาพ) หรือเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) หรือไม่ ในกรณีมีเป้าหมายที่เป็นตัวเลขเชิงปริมาณ ลักษณะของตัวชี้วัดจะเป็นแบบอัตราส่วนและนิยมคิดเป็น “ร้อยละ”

$$= \frac{\text{ผลงานที่ทำได้ (Output)}}{\text{เป้าหมาย (Target)}} \times 100 \qquad \text{..... (1)}$$

ตัวอย่างเช่น เป้าหมายการฝึกอบรมเกษตรกรในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีกำหนดไว้ 50,000 คน เมื่อสิ้นเวลาที่กำหนดปรากฏว่าทำได้ 40,000 คน ประสิทธิผลการทำงาน

$$= \frac{40{,}000}{50{,}000} \times 100 = 80\%$$

(อาจมีค่าเกิน 100% ก็ได้ ถ้าปฏิบัติได้จริงเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้)

การวัดประสิทธิผล เป็นการวัดวัตถุประสงค์ (End) ขณะที่การวัดประสิทธิภาพเป็นการวัดวิธีการทำงาน (Mean) จุดอ่อนของตัวชี้วัดประสิทธิผลก็คือ ไม่ได้บอกถึงต้นทุนที่ใช้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การทำงานที่มีประสิทธิผลแต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพก็ได้ กล่าวคือ มุ่งเพียงให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงต้นทุน ในทำนองเดียวกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพอาจไม่มีประสิทธิผล คือ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายก็ได้ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ที่เป็นเชิงคุณภาพ เช่น การฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการแห่งหนึ่ง ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างประหยัด (ค่าใช้จ่ายต่อหัวถูก) แต่เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมอาจไม่มีคุณภาพหรือไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ แสดงว่าการอบรมดังกล่าวไม่มีประสิทธิผล ดังนั้นการวัดผลงานที่ดีจะต้องวัดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในบางกรณีการกำหนดค่าเป้าหมายผลการทำงานนั้นจะเป็นการกำหนดในเชิงลบหรือมีลักษณะตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ คือมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี เช่น อัตราการว่างงานของประชากร อัตราการเกิดโรค (บางชนิด) เช่น เป้าหมายการพัฒนาประเทศต้องการให้มีคนว่างงานไม่เกินร้อยละ 4 และผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด พบว่ามีอัตราการว่างงานร้อยละ 5 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายแต่ไม่พึงประสงค์ เพราะต้องการให้ได้เท่ากับร้อยละ 4 หรือต่ำกว่า ดังนั้นเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับดัชนีอื่นที่กำหนดในทางบวก คือค่ายิ่งมากยิ่งดี การวัดประสิทธิผลการทำงานในลักษณะนี้ (ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี) จึงเป็นส่วนกลับของสูตร (1) คือ

$$\text{ดัชนีวัดประสิทธิผล} = \frac{\text{เป้าหมาย}}{\text{ผลงานที่ทำได้}} \times 100 \qquad \text{..... (2)}$$

ตามตัวอย่างในกรณีของอัตราการว่างงานข้างต้น

$$\text{ดัชนีวัดประสิทธิผล} = (\frac{4}{5}) \times 100 = 80\%$$

8. ตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นคะแนน (Score) ตัวชี้วัดที่มีลักษณะเป็นคะแนนนั้นผู้ต้องการวัดผลอาจกำหนดขึ้นเองเป็นอย่างไรก็ได้ เช่น 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 1–100 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูลหรือการให้คะแนน

ตัวอย่างในการสำรวจข้อคิดเห็นของประชาชนอาจกำหนดเป็นคะแนนตามความเห็น เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนน = 5 เห็นด้วยให้คะแนน = 4 ไม่มีความเห็น (เป็นกลาง) ให้คะแนน = 3 ไม่เห็นด้วยให้คะแนน = 2 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนน = 1 เป็นต้น ซึ่งอาจกำหนดแบบตรงกันข้ามก็ได้ เช่น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้ 5 คะแนน และเห็นด้วยอย่างยิ่งให้ 1 คะแนน แต่ต้องระมัดระวังในการตีความเท่านั้น

ตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นคะแนนนี้ นอกจากจะใช้แบ่งกลุ่มเพื่อนับจำนวนหรือหาสัดส่วนของแต่ละกลุ่มแล้วยังสะดวกในการนำไปคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเพื่อวัดค่าภาพรวมของแต่ละเรื่องได้ ในกรณีที่มีตัวชี้วัดหลายตัว

ในบางกรณีตัวชี้วัดแบบให้คะแนนอาจกำหนดเป็นสองขั้นตอนก็ได้ โดยขั้นตอนแรกเป็นข้อมูลดิบ เช่น รายได้ของครัวเรือน และขั้นที่สองกำหนดว่า ถ้ารายได้ของครัวเรือนน้อยกว่า 5,000 บาท/ปี ให้คะแนนเท่ากับ "1" ถ้ามีรายได้มากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ให้คะแนนเท่ากับ "2" และถ้ามีรายได้เกินกว่า 10,000 บาทขึ้นไป จะให้คะแนนเท่ากับ "3" เป็นต้น ซึ่งการกำหนดให้เป็นคะแนนในลักษณะสองขั้นตอนนี้ จะสะดวกในการนำไปจัดกลุ่มหรือคำนวณการสร้างดัชนีรวม กรณีที่มีตัวชี้วัดหลายตัว โดยแต่ละตัวจะมีเกณฑ์การให้คะแนนต่างกันไป

การกำหนดให้คะแนนที่เป็นค่า เช่น 1, 2, 3, 4 และ 5 นี้ นอกจากให้คะแนนโดยตรงหรือทำแบบสองขั้นตอนตามตัวอย่างข้างต้นแล้ว ในการวัดความสำเร็จของงานในบางลักษณะที่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน การให้คะแนนอาจกำหนดโดยเทียบกับผลสำเร็จว่าทำได้ถึงขั้นตอนไหน เช่น ถ้าเสร็จขั้นตอนที่ 1 ก็จะให้ 1 คะแนน ถ้าทำเสร็จถึงขั้นตอนที่ 2 ก็จะให้ 2 คะแนนไปจนถึงขั้นสุดท้าย (ทำเสร็จทุกขั้นตอน) ก็จะให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 เป็นต้น และเรียกการให้คะแนนแบบนี้ว่า การให้คะแนนตามขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone) ซึ่งเสมือนกับ "หลักกิโลเมตร (ไมล์)" ที่บอกว่าขณะนี้เราอยู่ ณ จุดใดของถนนเส้นนั้นๆ

ในกรณีที่ต้องการหาค่าดัชนีรวมโดยการหาค่าเฉลี่ยจากดัชนีย่อยรายตัวที่ได้คะแนนไม่เท่ากัน ค่าดัชนีที่ได้อาจจะไม่เป็นเลขจำนวนเต็ม เช่น อาจจะมีค่า 2.5, 3.7 หรือ 4.2 เป็นต้น ในการนำค่าเฉลี่ยมาใช้ประโยชน์ในการจัดกลุ่ม เช่น ดีมาก ดี ปานกลาง ฯลฯ จะต้องกำหนดคะแนนของแต่ละกลุ่มเป็นช่วง (Interval) เช่น 4.1–5.0 เท่ากับดีมาก 3.1–4.0 เท่ากับดี เป็นต้น

การกำหนดจำนวนกลุ่มว่าจะเป็นเท่าใดนั้น มีหลักพิจารณา คือ ถ้าต้องการเพียงแบ่งกลุ่มเท่านั้นอาจจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มก็พอ เช่น กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย (No) ซึ่งอาจให้คะแนนเท่ากับ "0" กับกลุ่มที่เห็นด้วย "Yes" และให้คะแนนเท่ากับ "1" ทั้งนี้การให้คะแนนอาจเป็นอย่างอื่นก็ได้ เช่น "2" กับ "1" เป็นต้น ในการกำหนดลักษณะนี้จะไม่ทราบ "ระดับ" (Level) ของความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมากน้อยเพียงใด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มจำนวนกลุ่มตามระดับความเห็น เช่น 5 กลุ่ม โดยมีหลักการ คือ จำนวนกลุ่มต้องเป็น "เลขคี่" โดยมีตัวเลขที่อยู่ตรงกลางไว้สำหรับกลุ่มที่เป็นกลางหรือไม่มีความเห็น อย่างไรก็ตามการกำหนดจำนวนกลุ่มมากเกินไปในบางกรณีอาจมีปัญหาสำหรับผู้ตอบคำถามได้ แต่ข้อดีก็คือมีรายละเอียดของข้อมูลมาก และถ้าจำเป็นก็สามารถยุบรวมให้เหลือน้อยกลุ่มในภายหลังได้ ส่วนกรณีการวัดเป็นคะแนนโดยไม่มุ่งหวังเพื่อจัดกลุ่มเป็นหลัก แต่เป็นการวัดเพื่อจัด "ระดับ" สำหรับการเปรียบเทียบก็อาจกำหนดเป็นคะแนนกี่ระดับก็ได้ เช่น 1–10 หรือ 1–20 ก็ได้

ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี

ตัวชี้วัดที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้

1. ตรงประเด็น (Relevant) เป็นตัวชี้วัดที่สามารถบ่งบอกถึงสิ่งที่เราต้องการทราบได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งในหลายๆ กรณีก็ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ประการใด เช่น ถ้าวัตถุประสงค์ของโครงการ คือต้องการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ตัวชี้วัดที่ตรงประเด็นที่สุดก็คือรายได้หรือรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรนั่นเอง หรือถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ตัวชี้วัดที่ตรง

ประเด็นที่สุดก็คือ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจไม่ง่ายนัก เช่น วัตถุประสงค์คือต้องการวัดคุณภาพชีวิตหรือความผาสุกของประชาชน การที่จะหาตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งให้ตรงประเด็นเลยทำได้ยากมาก จำเป็นจะต้องใช้ตัวชี้วัดทางอ้อมและวัดหลายมิติ เช่น วัดจากรายได้ สภาพของที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย แล้วสร้างเป็นดัชนีรวมขึ้นมา เป็นต้น

2. มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เป็นตัวชี้วัดที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการหรือสูตรคำนวณที่แน่นอน คำนิยามของตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณต้องชัดเจนว่าจะรวมหรือไม่รวมอะไรบ้าง มีการกำหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ล่วงหน้า มีการใช้ดุลพินิจหรือความรู้สึกของผู้ประเมินน้อย

3. มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกน้อย เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้ถูกประเมินการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานควรมีตัวแปรเฉพาะที่ผู้ถูกประเมินสามารถควบคุมได้เท่านั้น เช่น ถ้าตัวชี้วัด คือผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการใช้พันธุ์ดีของเกษตรกรภายใต้โครงการหนึ่ง ซึ่งปลูกในเขตน้ำฝน อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติได้ เพราะการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ใช่พันธุ์อย่างเดียว แต่ขึ้นกับดินฟ้าอากาศด้วย ซึ่งปกติเราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งฝนแล้งหรือน้ำท่วม กรณีนี้ตัวชี้วัดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อาจไม่เหมาะสมเท่าใดนัก ยกเว้นเป็นงานทดลองในสถานีทดลองที่สามารถควบคุมปัจจัยอื่นๆ ได้ หรือถ้ายังต้องการใช้ตัวชี้วัดนี้ก็อาจต้องระบุเงื่อนไขไว้ด้วย เช่น ภายใต้สภาวะดินฟ้าอากาศเป็นปกติ เป็นต้น หรือใช้อัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate) เฉลี่ยต่อปีเป็นตัวชี้วัดเพื่อดูแนวโน้ม (Trend) ในระยะยาว แทนที่จะดูปีต่อปีจะเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมกว่า

อีกตัวอย่าง เช่น ถ้ากำหนดมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็อาจจะไม่เหมาะสมเช่นเดียวกัน เพราะโดยหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วการส่งเสริมการส่งออกเป็นภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในการส่งเสริมดูแลการผลิตของเกษตรกรให้ได้ทั้งปริมาณที่เหมาะสมและคุณภาพที่ดี เพื่อสนับสนุนการส่งออกก็ตาม แต่การส่งออกก็ไม่เป็นภารกิจหลัก ดังนั้นตัวชี้วัดจึงไม่เหมาะสม เพราะมีปัจจัยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถควบคุมได้อยู่ด้วย

4. มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดี สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง และถ้าจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเป็นภาพกว้าง จำนวนตัวอย่างที่เก็บข้อมูลต้องมีมากพอเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้

5. เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นการประเมินผลการทำงานภายในองค์การ ตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประเมิน (ผู้บริหาร) และผู้ถูกประเมิน (ผู้ปฏิบัติ) และเป็นสากลถ้าต้องการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ

เกณฑ์การพิจารณาค่าของตัวชี้วัด

เมื่อกำหนดตัวชี้วัดได้แล้วประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือ จะตัดสินใจโดยเทียบกับค่าอะไรจึงจะถือว่า “ผ่านเกณฑ์” หรือ “ไม่ผ่านเกณฑ์” รวมทั้งจะนับหรือจัดกลุ่มอย่างไร เช่น “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” หรือ “ต้องปรับปรุง” เป็นต้น โดยทั่วไปเกณฑ์การพิจารณาอาจเปรียบเทียบกับค่าใดค่าหนึ่งดังต่อไปนี้

1. เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลา
2. เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดหรือมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ
3. เปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น ปีต่อปี หรือดูแนวโน้ม (Trend) ระยะยาว
4. เปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น/กลุ่มอื่น

เกณฑ์เหล่านี้ปกติแล้วจะถูกกำหนดและเห็นชอบโดยผู้บริหารระดับสูงที่กำกับดูแลระดับนโยบาย (กรณีขององค์การ/โครงการ) โดยอาจพิจารณาร่วมกับผู้ถูกประเมิน (ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน) เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการกำหนดอย่างมีเหตุผล ไม่สูง (ยาก) เกินไป หรือต่ำ (ง่าย) เกินไป โดยให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบตัวชี้วัดต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟประกอบด้วยก็ได้ เช่น ถ้าต้องการดูแนวโน้มอาจใช้กราฟเส้น (Line Chart) ถ้าต้องการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มก็อาจใช้กราฟแท่ง (Bar chart) หรือถ้าต้องการเปรียบเทียบสัดส่วนที่เปลี่ยนไปก็อาจใช้กราฟวงกลม (Pie Chart) เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป ตัวชี้วัดมีหลายลักษณะ เช่น เป็นข้อมูลดิบ เป็นค่าเฉลี่ย เป็นค่าสัดส่วน เป็นร้อยละ เป็นอัตราส่วน เป็นคะแนน เป็นต้น ซึ่งลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี คือ ตรงประเด็น มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกน้อย มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดี และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนเกณฑ์การพิจารณาอาจมีหลายเกณฑ์ เช่น เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากล เปรียบเทียบกับอดีตและเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นหรือกลุ่มอื่น เป็นต้น

กิจกรรม 10.3.2

1. ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดีมีอะไรบ้าง
2. เกณฑ์การพิจารณาค่าของตัวชี้วัดมีอะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 10.3.2


1. ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี คือ
    1) ตรงประเด็น
    2) มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน
    3) มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกน้อย
    4) มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดี
    5) เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. เกณฑ์การพิจารณาค่าของตัวชี้วัด มีดังนี้
    1) เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลา
    2) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดหรือมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ
    3) เปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น ปีต่อปี หรือดูแนวโน้ม
    4) เปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น/กลุ่มอื่น

เรื่องที่ 10.3.3
การจัดทำข้อเสนอโครงการประเมินผล การจัดทำรายงานการประเมินผล และตัวอย่างตัวชี้วัดในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การจัดทำข้อเสนอโครงการประเมินผลเพื่อการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ก่อนที่จะมีการดำเนินการประเมินผล ถ้าเป็นการประเมินผลโดยบุคลากรในองค์การก็อาจไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำเป็นลักษณะโครงการประเมินผลก็ได้ เพราะเป็นงานประจำที่ต้องมีการประเมินผลอยู่แล้วเป็นปกติ แต่ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ผู้ประเมินผลควรเป็นบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันความเอนเอียง ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลจะต้องจัดทำข้อเสนอในลักษณะโครงการประเมินผลต่อผู้บริหารหน่วยงานที่ต้องการให้มีการประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 10.5)

1. ขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำโครงการประเมิน

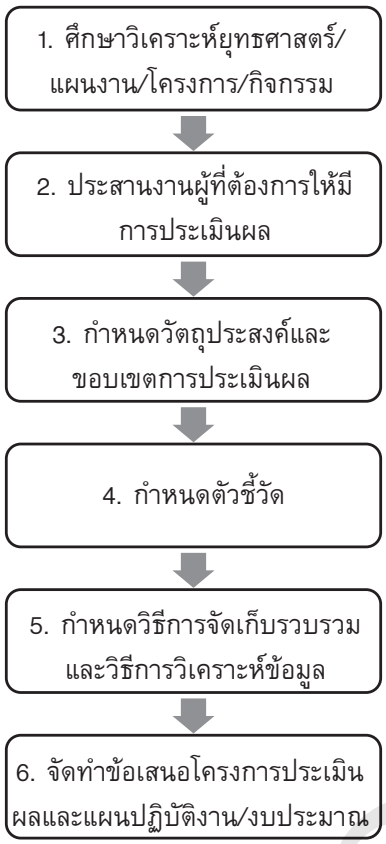

ภาพที่ 10.5 ขั้นตอนการจัดทำโครงการประเมินผล

ขั้นตอนการจัดทำโครงการประเมินผลตามภาพที่ 10.5 มีดังนี้

1) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่จะทำการประเมินผลให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน

2) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการว่าจะให้ความสนใจในประเด็นใดเป็นพิเศษหรือไม่

3) กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมินผลทั้งในเรื่องประเด็นพื้นที่และประชากรเป้าหมายที่จะทำการประเมินผล

4) กำหนดตัวชี้วัดซึ่งต้องให้ครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งนี้ในข้อเท็จจริงแล้ว ในงานที่จะประเมินผลปกติแล้วผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น่าจะมีการกำหนดตัวชี้วัดไปแล้ว เพียงแต่ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลต้องไปทบทวนร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเป็นไปได้ที่จะประเมินตามตัวชี้วัดได้มากน้อยเพียงใด

5) กำหนดวิธีการจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ระบุประชากรและวิธีการเลือกตัวอย่าง รวมทั้งจำนวนตัวอย่างที่จะใช้เก็บข้อมูลในการประเมินผล

6) จัดทำข้อเสนอโครงการประเมินผลพร้อมแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และบุคลากรที่จะดำเนินงานเสนอต่อผู้รับผิดชอบที่ต้องการให้มีการประเมินผล

2. โครงร่างของข้อเสนอโครงการประเมินผล โครงร่างของข้อเสนอโครงการประเมินผล โดยปกติแล้วจะคล้ายคลึงกับข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิชาการทั่วไป ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

ชื่อโครงการ จะเป็นชื่อเดียวกับโครงการที่จะไปทำการประเมินผล โดยเติมข้อความว่า โครงการประเมินผลเข้าไปข้างหน้าของโครงการที่จะประเมินผล เช่น โครงการประเมินผลโครงการ..... (ชื่อโครงการที่จะประเมินผล)

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผล พร้อมด้วยทีมงานและต้นสังกัดของผู้รับผิดชอบในการประเมินผล หลังจากหัวข้อดังกล่าวแล้วก็จะมีหัวข้อต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 10.6

โครงการประเมินผล โครงการ ..... (ที่จะประเมินผล)

ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผล
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
3. สาระสำคัญของโครงการที่จะประเมินผล
4. ขอบเขตการประเมินผล
5. วิธีการประเมินผล
    5.1 แนวคิดในการประเมินผล
    5.2 รูปแบบการประเมินผล
    5.3 วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
    5.4 ตัวชี้วัด
6. งบประมาณ
7. แผนปฏิบัติงาน
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ภาพที่ 10.6 ตัวอย่างโครงร่างข้อเสนอโครงการประเมินผล

1) หลักการและเหตุผล โดยระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการประเมินผลโครงการนี้

2) วัตถุประสงค์ของการประเมินผล ต้องมีความชัดเจนและครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการประเมินผลเพียงแค่เขียนโดยย่อๆ เท่านั้น

3) สาระสำคัญของโครงการ โดยระบุความเป็นมาและกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้โครงการที่จะประเมินผล

4) ขอบเขตของการประเมินผล ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของโครงการและความต้องการของเจ้าของโครงการ ทั้งในเรื่องประเด็นที่จะประเมินผล พื้นที่ของโครงการ และช่วงระยะเวลาของการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งบางกรณีอาจจะเป็นการดำเนินงานได้ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการและยังไม่สิ้นสุดการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ประเมินในช่วง 2 ปีแรกของโครงการที่มีระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น

5) วิธีการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย

5.1) แนวคิดหรือทฤษฎีที่จะใช้ในการประเมินผล

5.2) รูปแบบการประเมินผล โดยจะต้องระบุว่าจะใช้แบบใด เช่น เปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินงาน (วิธีนี้ต้องมีข้อมูลก่อนการดำเนินงาน) หรือเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่/บุคคลที่อยู่ภายใต้โครงการกับอยู่นอกโครงการ หรือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

5.3) วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะทำโดยวิธีใดบ้าง เช่น สังเกต วัด/นับ หรือสอบถาม/สัมภาษณ์ หรือใช้ข้อมูลทุติยภูมิ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอย่างใดบ้าง

5.4) กำหนดตัวชี้วัดที่จะดำเนินการและเกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้เปรียบเทียบ

6) งบประมาณ ที่จะใช้ในการประเมินผล ซึ่งจะเป็นทั้งภาพรวมและรายกิจกรรม

7) แผนปฏิบัติงาน ระบุช่วงเวลาที่จะปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน

8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นการชี้ให้เห็นว่าผลการประเมินผลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างไรบ้าง โครงการ หน่วยงาน บุคคล สังคม และประเทศชาติ เช่น นำผลการประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แนวทางในการประเมินผลโครงการ โครงการส่งเสริมการเกษตรอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือคล้ายคลึงกัน เป็นต้น

การจัดทำรายงานผลการประเมินผล

ในการจัดทำรายงานการประเมินผล โดยทั่วไปจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสารสนเทศให้กับผู้กำหนดนโยบาย ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้บริหารโครงการ ผู้จัดการโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือนำไปวางแผนโครงการใหม่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเผยแพร่ทั่วไปให้ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ และสิ่งสำคัญที่สุดคือรายงานการประเมินผลต้องถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง แต่ถ้ารายงานการประเมินผลที่เสนอให้กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวแล้วไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ก็จะเป็นการทำงานที่สูญเปล่าหรือสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งรูปแบบรายงานผลการประเมินผลนั้นถ้าหากเป็นการดำเนินการโดยบุคคลภายในก็ไม่จำเป็นต้องมีการจัดทำรายงานในรูปแบบอย่างเป็นทางการก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์การว่าจะต้องการในรูปแบบใด แต่ถ้าต้องการเผยแพร่ทั่วไปก็ต้องจัดทำเป็นรายงานเชิงวิชาการ จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่สำคัญ 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนนำ ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนอ้างอิงตามตัวอย่างในภาพที่ 10.7 ดังนี้

รายงานผลการประเมินผล
โครงการ.....

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
คำนำ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญเรื่อง
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนำ
    1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
    1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
    1.3 ขอบเขตของการประเมินผล
    1.4 นิยามศัพท์
บทที่ 2 แนวคิดและการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    2.1 สาระสำคัญของงาน (โครงการ) ที่ประเมินผล
    2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล
    2.3 ผลการประเมินผลที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการประเมินผล
    3.1 แนวทางการประเมินผล
    3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
    3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
    3.4 วิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
    3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
    3.6 เกณฑ์การประเมินผล
บทที่ 4 ผลการประเมินผล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
    5.1 สรุปผลการประเมินผล
    5.2 อภิปรายผล
    5.3 ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง

ภาพที่ 10.7 ตัวอย่างโครงร่างรายงานผลการประเมินผล

1. ส่วนนำ

ปกนอก เป็นส่วนแรกที่จะสื่อให้รู้ว่าเป็นรายงานการประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหรืองานอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเจ้าของเรื่องที่จะประเมินผล ชื่อโครงการหรือเรื่องที่ทำการประเมินผล ชื่อหรือคณะผู้ประเมินผล ชื่อหน่วยงานที่ทำการประเมินผล ปีที่ทำ เป็นต้น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เป็นการสรุปหรือคัดย่อรายงานการประเมินผลทั้งหมดในรายงานจะต้องมีบทสรุปสำหรับผู้บริหารโดยเป็นรายงานที่สั้น กะทัดรัด มีเนื้อหาสาระที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร มีความยาว 1-5 หน้าโดยประมาณ มีเนื้อหาที่สำคัญดังนี้ สิ่งที่ประเมินคืออะไร ทำไมถึงต้องประเมิน วิธีการประเมิน ข้อค้นพบ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ

คำนำ เป็นข้อความที่ต้องการให้ผู้อ่านทราบสาระสำคัญของที่มาของการประเมินผล จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ และคำขอบคุณ

กิตติกรรมประกาศ เป็นคำกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ

สารบัญเรื่อง เป็นส่วนที่แสดงบทหรือหัวข้อของรายงานการประเมินผลโครงการให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเรื่องราวต่างๆ ในรายงานได้อย่างรวดเร็ว โดยมีข้อมูลดังนี้ หัวข้อเรื่องแยกเป็นบทๆ เลขหน้ากำกับแต่ละหัวข้อ

สารบัญตาราง เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลที่ได้นำเสนอเป็นตารางต่างๆ ให้ผู้อ่านสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว โดยมีข้อมูลดังนี้ เลขที่ตาราง ชื่อตาราง เลขหน้ากำกับทุกตาราง

สารบัญภาพ เป็นส่วนที่แสดงภาพประกอบหรือแผนภาพให้ผู้อ่านสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว โดยมีข้อมูลดังนี้ เลขที่ภาพ ชื่อภาพ เลขหน้ากำกับทุกภาพ

2. ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของรายงานการประเมินผล ซึ่งเป็นการบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บทที่ 1 บทนำ เป็นบทแรกของเนื้อหาที่จะนำเข้าสู่เรื่องที่ประเมินผล เพื่อให้อ่านเข้าใจและเห็นความสำคัญของการประเมินผล โดยมีรายละเอียดของส่วนประกอบย่อยๆ ดังนี้

1) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา อธิบายให้เห็นความเป็นมาและความสำคัญของงานที่จะประเมินผล โดยบรรยายถึงว่าทำไมจึงจัดทำโครงการหรืองานประเมินผลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร มีเป้าหมายอย่างไร อธิบายสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการประเมินผลนี้ อธิบายผลดีของการประเมินผลหรือผลเสีย ถ้าไม่มีการประเมินในตอนท้ายควรสรุปให้ได้ว่า “ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทำให้เกิดการประเมินผลในเรื่องนี้หรือโครงการนี้”

2) วัตถุประสงค์ของการประเมินผล กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านทราบสิ่งที่ต้องการทำเพื่อหาคำตอบ โดยเขียนเป็นประเด็นๆ ให้ครอบคลุมเรื่องที่จะทำการประเมินผลทั้งหมด

3) ขอบเขตของการประเมินผล เป็นการกำหนดกรอบของเรื่องที่จะประเมินว่าจะครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้าง เช่น พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมแค่ไหน ทั้งประเทศ ภาค จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ประชากรเป้าหมาย ช่วงเวลาดำเนินการประเมินผล เป็นต้น

4) นิยามศัพท์ เป็นข้อความที่ใช้อธิบายความหมายของคำบางคำที่มีความหมายเฉพาะในการประเมิน ซึ่งผู้อ่านอาจจะไม่ทราบมาก่อนหรือเป็นคำที่มีการใช้ยังไม่แพร่หลาย เพื่อสื่อข้อความให้ตรงกัน

บทที่ 2 แนวคิดและการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นบทที่ประมวลความรู้ในเนื้อหาของงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่จะประเมิน เพื่อช่วยให้เกิดความรู้และแนวคิดกว้างขวางและชัดเจนขึ้น โดยมีหัวข้อสำคัญประกอบด้วย

1) สาระสำคัญของงานที่ประเมินผล เป็นการสรุปความเป็นมาของงาน วัตถุประสงค์ของงาน เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และงบประมาณการประเมินผล

2) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล เป็นการระบุกรอบแนวคิดหรือแนวทางการประเมินผลหรือการเลือกแบบแผนการประเมินผลอย่างไรให้เหมาะสมกับบริบทที่เกี่ยวข้อง

3) ผลการประเมินผลที่เกี่ยวข้อง เป็นการนำเสนอผลการประเมินผลโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอดีตที่ดำเนินการโดยหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ได้มีการศึกษาประเด็นและตัวชี้วัดใดบ้าง ผลสรุปเป็นอย่างไร มีข้อเสนอแนะจากนักวิชาการหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างไร ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีการประเมินผล เป็นการเขียนถึงรายละเอียดวิธีการประเมินผลว่ามีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แนวทางการประเมินผล เป็นการเขียนเพื่ออธิบายให้ทราบว่ามีการใช้หรือประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลแบบใด และกำหนดประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์ชี้วัดหรือตัวแปรในการวัดผล

2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการบอกรายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเป็นใคร ศึกษาจากประชากรทั้งหมดหรือสุ่มตัวอย่างมาศึกษาเพียงบางส่วน และถ้าใช้กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด จำนวนตัวอย่างที่ใช้มากน้อยเพียงใด

3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เป็นการเขียนให้ทราบว่าใช้เครื่องมือใดบ้าง มีวิธีการสร้างอย่างไร ข้อคำถามครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืออย่างไร

4) วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการกล่าวถึงรายละเอียดถึงวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บจากประชากรทั้งหมด หรือจากกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร ใช้วิธีใดบ้าง เช่น การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก การระดมความคิดเห็น การคัดลอก การทดลอง หรือรวบรวมจากเอกสารที่มีอยู่ เป็นต้น

5) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการบรรยายถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์แบบใดบ้าง โดยระบุว่าจะใช้เทคนิคใดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ/ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธีการแจกแจงความถี่จัดกลุ่ม ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือการทดสอบสมมติฐาน เป็นต้น ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

6) เกณฑ์การประเมินผล เป็นการเขียนอธิบายถึงการใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการวัดผลและเกณฑ์นั้นๆ ได้มาอย่างไร

บทที่ 4 ผลการประเมินผล เป็นบทที่นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสิ่งที่ค้นพบ โดยคำนึงถึงผู้อ่านว่าทำอย่างไรจึงจะให้อ่านได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย ซึ่งโดยทั่วไปมักแบ่งการนำเสนอเป็นตอนๆ ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผล มีการนำเสนอในลักษณะผสมผสานกัน กล่าวคือ มีการนำเสนอโดยวิธีการบรรยาย การบรรยายประกอบตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือรูปภาพ เป็นต้น โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงผลการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ของการประเมินที่กำหนดไว้

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นบทสุดท้ายของเนื้อหาในรายงานการประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้

1) สรุปผลการประเมินผล เป็นการนำผลการประเมินผลมาเขียนสรุปให้สั้นลง โดยเรียงลำดับตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการประเมิน วิธีการประเมิน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผล

2) อภิปรายผล เป็นการขยายความผลการแปรผล โดยยกประเด็นที่เด่นๆ หรือเป็นที่น่าสังเกตอภิปราย ซึ่งอาจนำแนวคิด ทฤษฎีหรือผลการวิจัยต่างๆ มาสนับสนุน การอภิปรายโดยผลการประเมินผลไม่จำเป็นต้องอภิปรายทุกรายการ

3) ข้อเสนอแนะ การเขียนข้อเสนอแนะควรจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย เพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณาปรับปรุงในเรื่องนโยบายต่างๆ และข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง การให้ข้อเสนอแนะควรมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยระบุให้ชัดเจนว่าข้อเสนอแนะจะนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่หรือจะดำเนินการต่อไปในอนาคตอย่างไร หรือเสนอแนะเพื่อการประเมินผลในครั้งต่อไป และควรเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเสนอแนะให้ชัดเจน การเสนอแนะทุกกรณีควรตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลหรือข้อค้นพบ พร้อมทั้งเสนอทางเลือกให้หลากหลายในการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรต่อไป

3. ส่วนอ้างอิง เป็นส่วนสุดท้ายของรายงานการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แต่เป็นรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ควรจะให้ผู้อ่านได้รับทราบ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปเอกสาร ตาราง กราฟ แผนที่ หรือแผนภาพอื่นๆ ภาคผนวกจะจัดไว้ตอนท้ายต่อจากบรรณานุกรม จำแนกเป็นหมวดหมู่เรียงตามลำดับตัวอักษร เช่น ภาคผนวก ก. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ภาคผนวก ข. กรณีการเลือกตัวอย่าง ภาคผนวก ค. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

สรุป การเขียนรายงานผลการประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงการดำเนินงานและพัฒนางานหรือโครงการส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาองค์การ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ แก้ปัญหาหรือวางแผนการทำงานที่คล้ายกัน รูปแบบของรายงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ รายงานฉบับสำหรับผู้บริหาร และรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ ต่อไป

กรณีตัวอย่างตัวชี้วัดในการประเมินผลแผนงานและโครงการ

ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินผลที่นำเสนอในที่นี้มีทั้งหมด 4 กรณี ได้แก่

แผนการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554–2559) วัตถุประสงค์ในการประเมินผล คือ เพื่อประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาการเกษตรในช่วงสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่ 12 โดยมีขอบเขตของการประเมินผลครอบคลุมการดำเนินงานเพียง 3 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรเท่านั้น ได้แก่

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน

หน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติ คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประเมินผล ซึ่งมีตัวชี้วัดการประเมินผลแผนพัฒนาแสดงแต่ละด้านแต่ละยุทธศาสตร์ไว้ในตารางที่ 10.3

ตารางที่ 10.3 ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559)

ประเด็น	ตัวชี้วัด
1. ด้านเศรษฐกิจ	
1) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ - อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร (GDP) ร้อยละ 3 ต่อปี - เสถียรภาพดุลการค้าราคาเกษตร
2) การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจภาคเกษตร	- สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรต่อ GDP - สัดส่วนมูลค่าการส่งออกการนำเข้าและดุลการค้าสินค้าเกษตรต่อ GDP
3) การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกในภาคเกษตร	- ผลิตภาพการผลิตรวม - สัดส่วนการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ภาคเกษตร
2. ด้านสังคม	
1) ฐานะการลงทุนทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตร	- รายได้ รายจ่าย หนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร - ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ในปี 2559
2) ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร	- สัดส่วนทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 10.3 (ต่อ)

ประเด็น	ตัวชี้วัด
3. ด้านความเหมาะสมของทรัพยากรการเกษตรต่อการผลิตทางการเกษตร	(พื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟูดิน/พื้นที่ลดการชะล้างพังทลายของดิน/พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น/ปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมีลดลง)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	– สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร และสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร – สัดส่วนรายได้ของเกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุดและมากที่สุด – จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน – จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการศึกษาอบรมที่เข้าสู่ภาคเกษตร – จำนวนองค์การเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่มีมาตรฐานและร้อยละของปริมาณธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร	– ผลผลิตและต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้าเกษตร – จำนวนฟาร์ม/โรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน – มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและแปรรูปเกษตร – สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร และจำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน	– จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 3.35 ล้านไร่ ในปี 2559 – ทรัพยากรดินได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าปีละ 2.15 ล้านไร่ – พื้นที่ทำการประมงและแหล่งอาศัยสัตว์น้ำได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าปีละ 8.8 ล้านไร่ และ 60 แห่ง – จำนวนองค์การเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรเพิ่มขึ้น

ที่มา: ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2560).

2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปี 2559 วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี

2) เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต การจัดการคุณภาพ คุณภาพการจัดการด้านตลาด เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

3) เพื่อให้มีการจัดการด้านการตลาด โดยการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ชาวนาจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานคือ กรมการข้าวและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมปฏิบัติงานด้วย ส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินผลโครงการ คือ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการแสดงไว้ในตารางที่ 10.4

ตารางที่ 10.4 ประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต รายได้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปี 2559

ประเด็น	ตัวชี้วัด
1) การบริหารจัดการ (Management)	
- การเตรียมการ	1.1 ระดับความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
- การประชุมชี้แจง การประชาสัมพันธ์	1.2 ระดับความเหมาะสมของคู่มือโครงการ เอกสารคำแนะนำเกษตรกร
	1.3 ระดับความเข้าใจโครงการของผู้เกี่ยวข้อง
	1.4 ระดับความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการ และการปฏิบัติงานในชุมชน/กลุ่ม
- การติดตามโครงการ	1.5 จำนวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการงานในโครงการ/คณะกรรมการต่างๆ (ส่วนกลาง จังหวัด)
	1.6 จำนวนครั้งของการติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ของหน่วยงานส่วนกลาง เขต จังหวัด
2) ปัจจัยนำเข้า (Input)	
- งบประมาณ	2.1 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (งบประมาณที่ใช้ไปเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ)
- องค์การ/หน่วยงานดำเนินงานโครงการ	2.2 ระดับความพร้อม ความทันเวลาของงบประมาณ
	2.3 จำนวนหน่วยงาน/องค์การที่ร่วมดำเนินงานโครงการ
- เกษตรกร	2.4 ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
- พื้นที่	2.5 จำนวนพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิตข้าวในโครงการ
- ความรู้	2.6 จำนวนหลักสูตรการอบรมเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
	2.7 ระดับความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม

ตารางที่ 10.4 (ต่อ)

ประเด็น	ตัวชี้วัด
3) ผลได้/ผลผลิต (Output)	
– การส่งเสริมการผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์ดี	3.1 ร้อยละของกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม (จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บริหารจัดการศัตรูข้าว การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร) 3.2 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว
– การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี	3.3 จำนวนแปลงเรียนรู้ 3.4 จำนวนครั้งของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.5 จำนวนช่องทาง/ประเภท/ชนิด/สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
– การจัดการด้านการตลาด	3.6 จำนวนครั้งของการจัดประชุมเชื่อมโยงตลาดและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 3.7 จำนวนแผนการตลาด
4) ผลเบื้องต้น/ผลกระทบระยะสั้น (Effect)	
– การผลิต (ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต) (แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว แปลงเรียนรู้)	4.1 ร้อยละของเกษตรกรในโครงการที่มีการผลิตตามกระบวนการลดต้นทุน (ใช้เมล็ดพันธุ์ดี ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม ใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ การกำจัดโรคโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ใช้ระบบนิเวศ ใช้เครื่องจักรร่วมกัน) 4.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตของเกษตรกร (ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่าไถ่ ค่าหว่าน) 4.3 ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวไม่ลงต่ำกว่า 1,000 บาท/ตัน (เกณฑ์ = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 4.4 ปริมาณการใช้สารเคมี/ปุ๋ยเคมีลดลง 4.5 แหล่งเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการผลิต 4.6 จำนวนพื้นที่ที่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/ข้าวคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 4.7 ร้อยละของกลุ่มที่มีการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจร (มีการวางแผน การผลิต การตลาด การบริหารจัดการภายในกลุ่ม)

ตารางที่ 10.4 (ต่อ)

ประเด็น	ตัวชี้วัด
– การตลาด	4.8 ร้อยละของเกษตรกรที่เห็นว่านำเทคโนโลยีการผลิตไปใช้ในแปลงนาแล้วเกิดผลดี
	4.9 จำนวนช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มเพิ่มขึ้น
	4.10 ปริมาณและราคาข้าวเพิ่มขึ้น
– สังคม	4.11 ร้อยละของกลุ่มที่มีการบริหารจัดการภายในกลุ่ม
	4.12 ร้อยละของกลุ่มที่จัดตั้งแล้วมีกิจกรรมต่อเนื่อง
	4.13 ร้อยละของเกษตรกรในโครงการที่นำรูปแบบแปลงต้นแบบไปดำเนินการในพื้นที่ตนเอง
– ความพึงพอใจต่อโครงการ	4.14 ระดับความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีภายในชุมชน
	4.15 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการดำเนินงานโครงการ

ที่มา: ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2560).

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิล (2556) วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิล คือ

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าปลานิล

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือชมรม

3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตรวจสอบสินค้าปลานิล

4) เพื่อสนับสนุนการขยายตลาดในประเทศ

5) เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการขยายตลาดต่างประเทศ

หน่วยงานที่เป็นหน่วยปฏิบัติคือ กรมประมง และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานประเมินผล โดยตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการแสดงไว้ในตารางที่ 10.5

ตารางที่ 10.5 ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิล

ประเด็น	ตัวชี้วัด
1. การบริหารจัดการ (Management)	- จำนวนคณะกรรมการฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม และมีการนำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงาน - จำนวนการรณรงค์ ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
2. ปัจจัยนำเข้า (Input)	
2.1 งบประมาณ	- ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
2.2 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร	- จำนวนหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
3. ผลได้ (Output)	
3.1 กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มผลผลิต	- จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการปรับปรุงพันธุ์ (เรื่อง) - จำนวนฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ที่ได้รับการจัดการตามหลักพันธุศาสตร์ (ฟาร์ม) - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยง (กลุ่ม) - จำนวนเครือข่ายอุตสาหกรรมปลานิลที่ได้รับการส่งเสริม (แห่ง)
3.2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน	- จำนวนฟาร์มได้รับการส่งเสริมพัฒนาฟาร์มเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐานความปลอดภัย (ฟาร์ม) - จำนวนฟาร์มปลานิลที่ได้รับการตรวจ รับรอง ควบคุม และกำกับดูแลฟาร์มตามมาตรฐาน GAP (ฟาร์ม) - ร้อยละของระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สินค้าปลานิลที่ได้รับการพัฒนา
3.3 กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่ม	- จำนวนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือของโรงงานแปรรูปปลานิล (By product) (เรื่อง)
3.4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพการตลาดในประเทศ	- จำนวนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคปลานิลในประเทศ (ครั้ง) - จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าปลานิลจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศ (ช่องทาง)
3.5 กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพการตลาดต่างประเทศ	- จำนวนการประชาสัมพันธ์สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ (ครั้ง)

ตารางที่ 10.5 (ต่อ)

ประเด็น	ตัวชี้วัด
4. ผลกระทบระยะสั้น (Effect)	
4.1 การผลิต	– ร้อยละของเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะเลี้ยงผลิตปลานิลคุณภาพ
4.2 การใช้ประโยชน์งานวิจัยและความรู้ในการเพาะเลี้ยง	– ร้อยละการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ – ร้อยละเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ – จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่มีการดำเนินการต่อเนื่อง (แห่ง)
4.3 การรวมกลุ่ม	– จำนวนฟาร์มมาตรฐานที่มีการดำเนินงานต่อเนื่อง
4.4 ฟาร์มมาตรฐาน	– ปริมาณผลผลิตปลานิลส่งออกที่มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (ตัน)
4.5 การส่งออก	
4.6 ทัศนคติ	– ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 117. (2556).

4. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร (2560) วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ

1) เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรกรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ

2) พัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ลักษณะทางเทคนิคและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน คือ กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานประเมินผล คือ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการแสดงไว้ในตารางที่ 10.6

การที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต้องทำหน้าที่ประเมินผล เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย พรบ. เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ไม่ใช่หน่วยปฏิบัติ ซึ่งในหลักการจึงไม่มีความเอนเอียงในการประเมินผล

ตารางที่ 10.6 ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องมือจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

ประเด็น	ตัวชี้วัด
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs)	
1.1 งบประมาณ	- จำนวนงบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เปรียบเทียบกับที่ได้รับจัดสรร
1.2 หน่วยงานบูรณาการ	- ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ
1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ	- จำนวนหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการ - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ - จำนวนองค์การเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
1.4 องค์ความรู้	- จำนวนหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมความรู้
2. กระบวนการ (Process)	
2.1 คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ	- ร้อยละของเกษตรกร องค์กรการเกษตร/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2.2 ถ่ายทอดความรู้เครื่องจักรกลการเกษตร	- จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรมความรู้ตามแผนปฏิบัติงาน - ระดับความคิดเห็นของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีต่อการอบรมความรู้ (ช่วงเวลาการจัดอบรม สถานที่ หลักสูตร เนื้อหา วิทยากร และระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม)
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกร	- จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในกิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น
2.4 ติดตามและประเมินผล	- จำนวนครั้งการติดตาม ให้คำแนะนำ ปรึกษา และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
2.5 จัดทำฐานข้อมูล	- จำนวนฐานข้อมูลของผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร - จำนวนช่องทางการเผยแพร่ฐานข้อมูล
3. ผลผลิต (Outputs)	
3.1 ถ่ายทอดความรู้	
1) สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น	- จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมความรู้เป็นช่างเกษตรท้องถิ่น - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการติดตาม ให้คำแนะนำฯ ภายหลังการอบรมความรู้ เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ได้รับการอบรม - ร้อยละของเกษตรกรที่มีความรู้เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับผู้ที่ผ่านการอบรม

ตารางที่ 10.6 (ต่อ)

ประเด็น	ตัวชี้วัด
	- จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมความรู้เป็นช่างเกษตรท้องถิ่น - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการติดตาม ให้คำแนะนำฯ ภายหลังการอบรมความรู้ เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ได้รับการอบรม - ร้อยละของเกษตรกรที่มีความรู้เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับผู้ที่ผ่านการอบรม
2) พัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน	- จำนวนองค์การเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ - จำนวนองค์การเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ได้รับการติดตามให้คำแนะนำฯ ภายหลังการอบรมความรู้ เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ได้รับการอบรม - ร้อยละขององค์การเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีความรู้เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับผู้ที่ผ่านการอบรม
	- ร้อยละของช่างเกษตรท้องถิ่นที่ถ่ายทอดความรู้ต่อให้เกษตรกรใกล้เคียง
3.2 นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกรใกล้เคียง	- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่อจากช่างเกษตรท้องถิ่น (1 : 10 ราย) - จำนวนเกษตรกรในกิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
3.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์	- ร้อยละของเกษตรกร/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่รับทราบเกี่ยวกับการเผยแพร่ฐานข้อมูลเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
3.4 การรับรู้ฐานข้อมูล	- ร้อยละของเกษตรกร/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่สามารถเข้าถึงการใช้ฐานข้อมูลเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
4. ผลลัพธ์ (Outcomes)	
4.1 การนำความรู้ไปปฏิบัติ	- ร้อยละของเกษตรกร องค์การเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ได้รับการอบรม
4.2 การลดรายจ่ายของช่างเกษตรท้องถิ่นที่ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชน	
1) ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1	- ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปปฏิบัติและสามารถลดรายจ่ายการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร - รายจ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรลดลง (เฉลี่ย 2,000 บาทต่อเครื่องต่อปี)

ตารางที่ 10.6 (ต่อ)

ประเด็น	ตัวชี้วัด
2) ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 2 และระดับ 3	- ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปปฏิบัติและสามารถลดรายจ่ายการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร - รายจ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรลดลง (เฉลี่ย 5,500 บาทต่อรายต่อปี) - ร้อยละของเกษตรกรที่ลดต้นทุนการผลิตได้ - ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถเป็นช่างเกษตรท้องถิ่นให้เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง
4.3 การลดรายจ่ายของช่างเกษตรท้องถิ่นที่ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรนอกชุมชน	- ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดรายจ่ายจากการไม่นำเครื่องจักรกลการเกษตรไปซ่อมนอกชุมชน (ค่าขนส่ง ค่าเสียเวลา เป็นต้น)
ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1–3	- รายจ่ายเฉลี่ยที่ลดลงจากการไม่นำเครื่องจักรฯ ไปซ่อมนอกชุมชน - ร้อยละขององค์การเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการดีขึ้น (เทคนิคการใช้ ดูแลรักษา และการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร)
4.4 การพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร	- ร้อยละขององค์การเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการดีขึ้น (ผู้ใช้บริการและผลตอบแทนเพิ่มขึ้น)
4.5 ความพึงพอใจของเกษตรกร	- ร้อยละขององค์การเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีต้นทุนประกอบการลดลง - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อโครงการ

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต เปรียบเทียบผลกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ เปรียบเทียบผลระหว่างก่อนและหลังมีโครงการ และเป้าหมายของโครงการ

ที่มา: ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารประเมินผลเลขที่ 501. (2560).

กล่าวโดยสรุป ในการประเมินผลโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และใช้บุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมินผลจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอโครงการประเมินผล ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2) ประสานงานผู้ที่ต้องการให้มีการประเมินผล 3) กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมินผล 4) กำหนดตัวชี้วัด 5) กำหนดวิธีการจัดเก็บรวบรวมและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และ 6) จัดทำข้อเสนอโครงการประเมินผล และเมื่อดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการจัดทำรายงานผลการประเมินผล ซึ่งในรายงานการประเมินผลจะต้องระบุถึงวิธีการประเมินผล ผลการประเมินผล พร้อมกับข้อเสนอแนะด้วย

กิจกรรม 10.3.3

1. การจัดทำโครงร่างข้อเสนอโครงการประเมินผลมีขั้นตอนในการดำเนินงานกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
2. รูปแบบการจัดทำรายงานผลการประเมินผลมีองค์ประกอบอะไรบ้าง จงอธิบายมาพอสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 10.3.3

1. มี 6 ขั้นตอน ได้แก่
   1) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการที่จะทำการประเมินผล
   2) ประสานงานผู้ที่ต้องการให้มีการประเมินผล
   3) กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมินผล
   4) กำหนดตัวชี้วัด
   5) กำหนดวิธีการจัดเก็บรวบรวม และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
   6) จัดทำข้อเสนอโครงการประเมินผลและแผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ

2. มี 3 องค์ประกอบ คือ ส่วนนำ เป็นการนำเสนอให้ผู้อ่านได้รู้จักกับรายงาน ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของรายงานการประเมินผล ซึ่งเป็นการบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งประกอบด้วย 5 บท ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ
- 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
- 1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
- 1.3 ขอบเขตของการประเมินผล
- 1.4 นิยามศัพท์

บทที่ 2 แนวคิดและการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- 2.1 สาระสำคัญของงาน (โครงการ) ที่ประเมินผล
- 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล
- 2.3 ผลการประเมินผลที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีการประเมินผล
- 3.1 แนวทางการประเมินผล
- 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
- 3.4 วิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
- 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
- 3.6 เกณฑ์การประเมินผล

บทที่ 4 ผลการประเมินผล

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการประเมินผล

5.2 อภิปรายผล

5.3 ข้อเสนอแนะ

และส่วนอ้างอิงเป็นส่วนสุดท้ายของรายงานการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่จะช่วยให้รายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

เกษม ศิริสุโขดม. (2550). *การประเมินผลโครงการ.* ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). *คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.* สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร).

ศูนย์ประเมินผล. (2556). การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิล. *เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 117.* สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ศูนย์ประเมินผล. (2556). *คู่มือการประเมินผล.* สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

ศูนย์ประเมินผล. (2560). *การประเมินผลโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวปี 2559.* สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ศูนย์ประเมินผล. (2560). *การประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร. เอกสารประเมินผล เลขที่ 501.* สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ศูนย์ประเมินผล. (2560). *รายงานการประเมินผล แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559).* สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2557). *เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558.* กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร).

อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย. (2550). *แนวทางการสร้างตัวชี้วัด.* สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย และบุญธรรม พลเยี่ยม. (2554). การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร. ใน *เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร* (หน่วยที่ 10). นนทบุรี: สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เอ็นนู ซื่อสุวรรณ. (2554). *การนิเทศ การติดตามและการประเมินผลในงานส่งเสริมการเกษตร* (หน่วยที่ 8). นนทบุรี: สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
