หน่วยที่ 8

การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย



ชื่อ อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย

วุฒิ กส.บ. (กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Agricultural Economics) University of Kentucky
M.S. (Statistics) Iowa State University
Ph.D. (Economics) Iowa State University

ตำแหน่ง อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 8

แผนการสอนประจำหน่วย

ชุดวิชา หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 8 การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตอนที่

8.1 แนวคิดและหลักการจัดทำแผนปฏิบัติการ
8.2 กระบวนการจัดทำและการบริหารแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
8.3 กรณีตัวอย่างแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ

แนวคิด

1. ในการบริหารองค์การผู้บริหารจะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์การ ดังนั้นผู้บริหารองค์การจำเป็นจะต้องทราบความหมายและความสำคัญของแผนปฏิบัติการด้วย
2. เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการที่ดี ผู้บริหารองค์การที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะต้องทราบและเข้าใจในกระบวนการจัดทำและการบริหารแผนปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไปได้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
3. เพื่อให้เห็นภาพของแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ หรือแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการด้านที่เป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ชัดเจน จำเป็นจะต้องศึกษาจากตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัด และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานซึ่งจะเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับแผนระดับบน คือ แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) และแผนระดับที่ 2 ด้วย

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายแนวคิดและหลักการจัดทำแผนปฏิบัติการได้
2. อธิบายกระบวนการจัดทำและการบริหารแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
3. อะบายกรณีตัวอย่างแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐได้

กิจกรรมระหว่างเรียน

1. ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 8.1–8.3
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
5. ชมรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษา (ถ้ามี)
6. ทำกิจกรรมประจำชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
8. ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8

สื่อการสอน

1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ถ้ามี)
4. รายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษา (ถ้ามี)
5. กิจกรรมประจำชุดวิชา (ถ้ามี)

การประเมินผล

1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากกิจกรรมประจำชุดวิชา (ถ้ามี)
4. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจำภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 8 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป

ตอนที่ 8.1
แนวคิดและหลักการจัดทำแผนปฏิบัติการ

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง

8.1.1 ความหมายและความสำคัญของแผนปฏิบัติการ
8.1.2 ประเภทของแผนโดยทั่วไป
8.1.3 กรอบของแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ

แนวคิด

1. แผน คือ สิ่งที่บุคคลหรือองค์การคิดที่จะทำในอนาคต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของแผน ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการบริหารองค์การเป็นอย่างยิ่ง การมีแผนที่ดีจะทำให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. แผนโดยทั่วไปสามารถจำแนกออกได้เป็นหลายประเภท เช่น จำแนกตามระยะเวลาการดำเนินงาน จำแนกตามระดับของหน่วยงาน จำแนกตามวัตถุประสงค์ จำแนกตามระดับการบริหารงาน และจำแนกตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
3. สำหรับหน่วยงานของรัฐจะถูกกำหนดให้ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ซึ่งจะต้องสอดคล้องสนับสนุนแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ด้วย ดังนั้นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ จำเป็นจะต้องทราบกรอบและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ด้วย

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 8.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของแผนปฏิบัติการได้
2. อธิบายประเภทของแผนโดยทั่วไปได้
3. อธิบายกรอบของแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐได้

เรื่องที่ 8.1.1
ความหมายและความสำคัญของแผนปฏิบัติการ

ความหมายของแผนปฏิบัติการ

คำว่า “แผน” จะตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Plan” ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้มากมายแต่ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกัน เช่น

“แผน” หมายถึง วิธีการอย่างละเอียดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ภารกิจบางประการบรรลุผลสำเร็จตามที่เราต้องการ (A plan is a method of achieving something that you have worked out in detail beforehand.) (ที่มา: www.collinsdictionary.com>plan)

“แผน” หมายถึง ชุดของการกระทำเพื่อให้ภารกิจบางประการบรรลุผลสำเร็จในอนาคต โดยเฉพาะชุดการกระทำที่ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบในรายละเอียดแล้ว (A set of actions for achieving something in the future, especially a set of actions that has been considered carefully and in detail.) (ที่มา: www.ldoceonline.com>dictionary)

“แผน” หมายถึง ความตั้งใจหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำ (An intention or decision about what one is going to do.) (ที่มา: www.lexco.com>dictionary>plan)

จากคำนิยามข้างต้น คำว่าแผนก็คือ “การคิดไว้ล่วงหน้า” ว่าจะทำอะไรบ้างในอนาคต ซึ่งอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป และอาจทำเป็นกิจจะลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นงานใหญ่ มีระยะเวลาดำเนินงานที่ยาวนาน และเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานจำนวนมาก ควรจัดทำเป็นเอกสารสำหรับไว้สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับรู้รับทราบภารกิจที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เมื่อใด และต้องให้เสร็จสิ้นเมื่อใด

สรุปความหมายของแผน คือ สิ่งที่บุคคลหรือองค์การคิดที่จะกระทำในอนาคตเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของแผน ถ้าเกี่ยวข้องกับบุคลากร และงบประมาณจำนวนมากมักจะทำเป็นรูปเอกสารเพื่อไว้อ้างอิง ตัวอย่างเช่น

แผนยุทธศาสตร์ หรือเรียกย่อๆ ว่ายุทธศาสตร์ ซึ่งหมายถึงทางเลือกที่ผู้บริหารองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนใช้เป็นทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บางครั้งเรียกว่า กลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนา

สำหรับแผนปฏิบัติการ หมายถึง แผนที่ประกอบไปด้วยแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ซึ่งจะมีรายละเอียดว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่องค์การจะต้องทำ จะทำอย่างไร จะทำที่ไหน ใครคือบุคคลเป้าหมาย จะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด จะใช้งบประมาณเท่าใดจากแหล่งไหน และหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยแผนปฏิบัติการนี้จะต้องใช้แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์เป็นกรอบในการจัดทำ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งแผนปฏิบัติการคือส่วนขยายหรือต่อยอดของแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์นั้นเอง

ซึ่งแผนปฏิบัติการนี้จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะแตกต่างกับแผนปฏิบัติงาน (work schedule) ที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดเฉพาะวันเดือนปีที่จะดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเท่านั้น ซึ่งแผนปฏิบัติงานนี้อาจเรียกว่า ปฏิทินการทำงาน หรือกำหนดการทำงานในแต่ละกิจกรรมก็ได้

ในหน่วยที่ 8 นี้จะนำเสนอเฉพาะการจัดทำแผนปฏิบัติการเท่านั้น ส่วนการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ได้กล่าวไว้แล้วในหน่วยที่ 7

ความสำคัญของแผนปฏิบัติการ

การดำเนินตามภารกิจของบุคคลหรือขององค์การ โดยเฉพาะองค์การขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมสำคัญมากมายเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากทั้งในฐานะผู้ที่เป็นผู้บริหารองค์การ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ โดยแต่ละกิจกรรมอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการค่อนข้างยาวนาน จำเป็นจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การประสบผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารองค์การ ซึ่งสรุปความสำคัญของแผนปฏิบัติการได้ ดังนี้

1. เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารองค์การที่จะใช้ในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การจัดทำเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ โดยไม่มีแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดถึงกิจกรรมและช่วงเวลาดำเนินการนั้น ผู้บริหารองค์การจะไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ และถ้ามีปัญหาก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์

2. เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบติดตามและประเมินผลขององค์การ ผู้ที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จะต้องทราบแผนปฏิบัติการขององค์การเพื่อไว้ใช้เปรียบเทียบระหว่างแผนกับผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะแผนปฏิบัติการจะมีรายละเอียดถึงกิจกรรม วันเวลาที่ต้องเริ่มดำเนินการ และวันเวลาที่สิ้นสุดของการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม

3. มีการประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์การ เนื่องจากทุกคนในองค์การใช้แผนปฏิบัติการฉบับเดียวกัน จึงทราบภารกิจของแต่ละคนแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดีทำให้สามารถประสานงานกันได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การ

4. ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน เนื่องจากแผนปฏิบัติการมีรายละเอียดถึงกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารองค์การสามารถมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเป็นรายกิจกรรมได้ ทำให้สามารถลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานขององค์การได้

5. ลดการสูญเสียทรัพยากร ถ้าหากในขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการได้มีการพิจารณาจัดสรรและวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบก่อนการดำเนินงานจริงแล้ว จะทำให้มีการใช้ทรัพยากรขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียทรัพยากรขององค์การ

6. ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ถ้าหากขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว โอกาสจะเกิดความเสียหายต่อองค์การที่เกิดจากภัยพิบัติต่างๆ จะมีน้อยมาก

7. เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาองค์การในอนาคต ในแผนปฏิบัติการปกติแล้วจะมีระยะเวลาการดำเนินงาน งบประมาณ และบุคลากรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนก็จะทำให้ทราบว่าแผนที่วางไว้เหมาะสมแล้วหรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนฉบับต่อไป ส่งผลให้การปฏิบัติงานในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

กล่าวโดยสรุป แผนปฏิบัติการ หมายถึง แผนที่ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ซึ่งจะมีรายละเอียดว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่องค์การจะต้องทำ จะทำอย่างไร จะทำที่ไหน ใครคือบุคคลเป้าหมาย จะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด จะใช้งบประมาณเท่าใดจากแหล่งไหน และหน่วยงานใดหรือบุคลากรคนใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

การจัดทำแผนปฏิบัติการมีความสำคัญต่อองค์การเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก และผู้ปฏิบัติงานจะรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และประหยัดทรัพยากรขององค์การ ทำให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรม 8.1.1

1. จงอธิบายความหมายของแผนปฏิบัติการ
2. แผนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์การอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 8.1.1

1. แผนปฏิบัติการ คือ แผนที่ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ซึ่งจะมีรายละเอียดว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่องค์การจะต้องทำ จะทำอย่างไร จะทำที่ไหน ใครคือบุคคลเป้าหมาย จะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด จะใช้งบประมาณเท่าใดจากแหล่งไหน และหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
2. แผนปฏิบัติการมีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์การ ดังนี้
   1) เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารองค์การที่จะใช้ในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
   2) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบติดตามและประเมินผลขององค์การ
   3) มีการประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์การ
   4) ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
   5) ลดการสูญเสียทรัพยากร
   6) ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
   7) เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาองค์การในอนาคต

เรื่องที่ 8.1.2
ประเภทของแผนโดยทั่วไป

แผนโดยทั่วไปสามารถจำแนกได้หลายประเภท ในที่นี้จึงขอนำเสนอประเภทของแผนโดยทั่วไป ซึ่งมีลักษณะต่างๆ แบ่งได้ตามระยะเวลาของแผน ตามระดับของหน่วยงาน ตามวัตถุประสงค์ ตามระดับการบริหารงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี มีรายละเอียดดังนี้

1. จำแนกตามระยะเวลาของแผน โดยปกติแล้วจะจำแนกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ

1.1 แผนระยะสั้น คือ แผนที่มีเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี

1.2 แผนระยะปานกลาง คือ แผนที่มีเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี ถึงไม่เกิน 5 ปี

1.3 แผนระยะยาว คือ แผนที่มีเวลาดำเนินการมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

อย่างไรก็ตามการแบ่งช่วงระยะเวลาของแผนแต่ละประเภทก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว นอกจากนี้ในบางครั้งโดยเฉพาะกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินก็อาจจะต้องมีแผนเฉพาะกิจ (Ad-hoc plan หรือ Contingency plan) ก็ได้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งมักจะมีระยะเวลาสั้นๆ เช่น 1-2 เดือน เช่น แผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร และแผนปราบศัตรูพืชระบาด เป็นต้น

2. จำแนกตามระดับของหน่วยงาน ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐระดับของแผนอาจจะเป็นแผนระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับจังหวัด อำเภอ หรือระดับท้องถิ่น เป็นต้น

ถ้าเป็นองค์การธุรกิจเอกชน ระดับของแผนอาจจะเป็นระดับบริษัท ระดับฝ่าย ระดับแผนก เป็นต้น โดยในแต่ละระดับอาจจำแนกเป็นแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวด้วยก็ได้

3. จำแนกตามวัตถุประสงค์ ในแต่ละองค์การ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มักจะมีกิจกรรม หรือภารกิจที่ต้องดำเนินงานพร้อมกันในหลายๆ เรื่องซึ่งแต่ละเรื่องอาจกำหนดให้มีแผนแยกออกจากกัน เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนพัฒนาพื้นที่และแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เป็นต้น ในทำนองเดียวกันในแต่ละแผน เช่น แผนการผลิต หรือแผนการตลาดก็จะมีได้ทั้งแผนระยะสั้น หรือแผนระยะยาวก็ได้


4. จำแนกตามระดับการบริหารงาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

4.1 แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) ซึ่งเป็นแผนระดับสูงสุดขององค์การ โดยในแผนจะระบุแต่เพียงว่าในภาพรวมขององค์การจะมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่องค์การจะต้องทำ (What to do?) และเรียกประเด็นสำคัญนี้ว่าประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic issues) ซึ่งอาจระบุทิศทางที่ต้องการไปให้ถึง (ways) แต่จะไม่มีรายละเอียดว่าจะทำอย่างไร (How to do?) ด้วยวิธีใด (means) โดยแผนยุทธศาสตร์นี้จะถูกกำกับดูแลโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์การ ถ้าเป็นแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารสูงสุดที่จะเป็นผู้กำกับดูแลอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นแผนระยะปานกลาง หรือระยะยาว

4.2 แผนปฏิบัติการ (Action plan/Operational plan) เป็นแผนที่มีรายละเอียดมากกว่าแผนยุทธศาสตร์ ที่ส่วนใหญ่จะระบุว่าจะทำอะไร (What to do ?) เท่านั้น ส่วนแผนปฏิบัติการจะระบุถึง

วิธีการด้วยว่าแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะทำอย่างไร (How to do?) เมื่อใด เพื่อใคร โดยใคร ซึ่งแผนปฏิบัติการนี้จะต้องสอดคล้องกับแผนระดับสูงหรือแผนยุทธศาสตร์ และภายใต้แผนปฏิบัติการจะประกอบไปด้วยแผนงาน โครงการและกิจกรรม ทั้งนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดมากๆ มักจะเป็นแผนระยะสั้น เช่น รายปี

5. จำแนกตามมติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ให้มีการจำแนกแผนของภาครัฐออกเป็น 3 ระดับ ดังภาพที่ 8.1

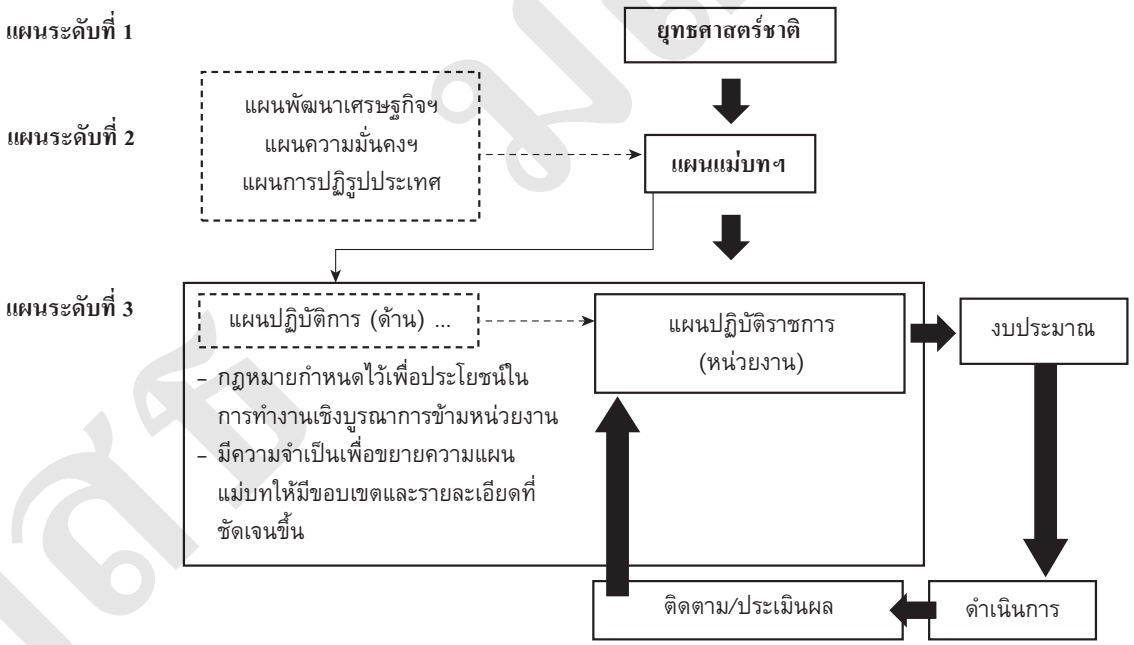

ภาพที่ 8.1 ระดับของแผนภาครัฐตามมติของคณะรัฐมนตรี 4 ธันวาคม 2560

ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2563, ตุลาคม).

แผนระดับที่ 1: ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในเรื่องที่ 8.1.3

แผนระดับที่ 2: ประกอบด้วย

1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มี 23 แผน (ฉบับ) และมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 16 แผน

2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มี 6 มิติ รวม 13 แผน (ฉบับ) และมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 7 แผน

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) มี 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ และมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกประเด็น

4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2564) ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 นโยบายความมั่นคงของชาติ ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย และมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 10 นโยบาย

ส่วนที่ 2 แผนระดับความมั่นคงของชาติ ประกอบด้วย 19 แผน และมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 12 แผน

แผนระดับที่ 3: คือแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ (ด้าน) ... และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 5 ปี และรายปี และแผนอื่นๆ

ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้นที่ผ่านมา เช่น ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ยุทธศาสตร์กรมการข้าว จะจัดอยู่ในกลุ่มแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด ซึ่งจะเรียกว่าแผนปฏิบัติราชการ โดยจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อจากแผนยุทธศาสตร์ด้วย กล่าวคือ แผนปฏิบัติราชการจะครอบคลุมตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ไปจนถึงแผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมตามลำดับส่วนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เช่น ยุทธศาสตร์ข้าว ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จะจัดอยู่ในกลุ่มแผนระดับที่ 3 ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเรียกว่าแผนปฏิบัติการด้าน ... ซึ่งเป็นแผนบูรณาการหลายหน่วยงาน เช่น แผนปฏิบัติการด้านข้าว แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางอาหาร แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะ และแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งตามความหมายในเชิงวิชาการแล้วแผนปฏิบัติการ (ด้าน) ... คือแผนปฏิบัติการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ และแผนปฏิบัติราชการก็คือแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐนั่นเอง โดยในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับแผนงานและระดับโครงการ ก็จะมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเอาไว้ด้วย

กล่าวโดยสรุป แผนมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการจำแนก เช่น จำแนกตามระยะเวลาของแผน จำแนกตามระดับของหน่วยงาน จำแนกตามวัตถุประสงค์ จำแนกตามระดับการบริหารงาน และจำแนกตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น สำหรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

กิจกรรม 8.1.2

โดยทั่วไปแผนสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภทอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมาพอสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 8.1.2

โดยทั่วไปแผนสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภท เช่น

1. จำแนกตามระยะเวลาของแผน
2. จำแนกตามระดับของหน่วยงาน

3. จำแนกตามวัตถุประสงค์
4. จำแนกตามระดับการบริหารงาน
5. จำแนกตามมติคณะรัฐมนตรี (4 ธันวาคม 2560)

เรื่องที่ 8.1.3
กรอบของแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ

เนื่องจากงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรส่วนใหญ่เป็นภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ในที่นี้จึงจะเน้นเฉพาะการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาคเอกชนก็สามารถใช้ประโยชน์จากกรอบของแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของภาครัฐได้มีการกำหนดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐไว้ค่อนข้างมากพอสมควร ที่สำคัญ ได้แก่

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรคสอง กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และมาตรา 10 วรรคสาม กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ด้วย

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และมาตรา 6 วรรคสอง หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และต่อมาในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ได้แก้ไขแผนสี่ปีเป็นแผนห้าปี และมาตรา 9 ได้กำหนดไว้ว่า ในวาระเริ่มแรกการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563–2565 และในมาตรา 7 ได้แก้ไขมาตรา 33 ของฉบับที่ 1 โดยกำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ได้เห็นชอบการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพประสาน และบูรณาการการดำเนินงานระหว่างงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน ... และมอบหมายให้ สศช. พิจารณากำกับการดำเนินการ ตามแนวทางการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดระดับแผนทั้งสามระดับอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เร่งดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการตามลำดับ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยให้ใช้ชื่อตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่ายทอดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งนำเข้าแผนระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform: eMENSCR)

ดังนั้น จากกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และองค์การอื่นๆ ของรัฐจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของตนเอง และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงาน หรือแผนวิสาหกิจ (ของรัฐวิสาหกิจ) และเพื่อให้แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 หน่วยงานของรัฐจำเป็นจะต้องทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบของแผนและนโยบายต่างๆ ตามระเบียบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งแผนระดับที่ 1-3 มีรายละเอียด ดังนี้

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ

โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย 20 ปี ตัวชี้วัดเป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นหลักรวม 35 ประเด็น และประเด็นย่อยรวม 152 ประเด็น ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่าง

เฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมากที่สุด โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 มีเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

เป้าหมาย 20 ปี

1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ประกอบด้วยประเด็นย่อย

1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
2) เกษตรปลอดภัย
3) เกษตรชีวภาพ
4) เกษตรแปรรูป
5) เกษตรอัจฉริยะ

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

1) อุตสาหกรรมชีวภาพ
2) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
3) อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่ง และโลจิสติกส์
5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

3. สร้างความหลากหลายด้านท่องเที่ยว

1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
4) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ
5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

1) การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
2) การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3) การเพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ

4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
5) การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค

5. พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

1) การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
2) การสร้างการโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
3) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
4) การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
5) การปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะมีอยู่ 5 ด้าน ยกเว้นด้านที่ 3 และที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีประเด็นหลักที่เกี่ยวข้อง คือ การเกษตรสร้างมูลค่า

แผนระดับที่ 2

ประกอบด้วย 4 แผนหลัก ดังนี้

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560–2580) มีทั้งหมด 23 แผน ได้แก่ 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเกี่ยวข้องกับ 16 แผน โดยไม่รวมแผนที่ 4, 10, 11, 12, 13, 14 และ 17 โดยในแผนแม่บท (ข้อ 3) ด้านการเกษตร ยังได้จำแนกเป็นแผนย่อยอีก 6 แผน ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

2. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วย 6 มิติ ได้แก่

1) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
2) การพัฒนาเศรษฐกิจ
3) การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง
4) การฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของภาครัฐ
6) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

โดยมีแผนการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 1) การเมือง 2) การบริหารราชการแผ่นดิน 3) กฎหมาย 4) กระบวนการยุติธรรม 5) เศรษฐกิจ 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) สาธารณสุข 8) สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) สังคม 10) พลังงาน 11) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) การศึกษา และ 13) วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนที่เกี่ยวข้องรวม 7 ด้าน ไม่รวมด้านที่ 4, 8, 9, 11 และ 12 โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ มีกิจกรรมด้านการเกษตรที่ควรเร่งรัด คือ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High value added)

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด ได้แก่

1) การเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7) การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

โดยยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนจะเกี่ยวข้องกับภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากที่สุด

4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2564) ประกอบด้วย 2 ส่วน

4.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 16 ประเด็น นโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 นโยบาย ได้แก่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) สร้างความเป็นธรรม การปกครอง และความสมานฉันท์ในชาติ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 11) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร และ 16) เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4.2 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 19 แผน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 3) การเสริมสร้าง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 15) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ และ 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแผนการรักษาความมั่นคงทางอาหาร และน้ำจะสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากที่สุด

5. นโยบายรัฐบาล ดังตัวอย่างของนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สรุปได้ ดังนี้

5.1 นโยบายหลัก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 8 ด้าน ได้แก่ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

5.2 นโยบายเร่งด่วน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 7 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติผิดมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และ 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

อย่างไรก็ตามแผนระดับที่ 2 อาจมีเพิ่มเติมได้ในภายหลังขึ้นอยู่กับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาล เช่น กรณีเกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้มีแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564–2565 โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

แผนระดับที่ 3

เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 เช่น แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ 5 ปี และรายปี แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ และแผนอื่นๆ


จากข้อกำหนดดังกล่าว จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้นนั้นจะอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนระดับที่ 3 โดยจะต้องรวมถึงแผนปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้วย ดังนั้นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ของส่วนราชการจะต้องใช้แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) และแผนระดับที่ 2 เป็นกรอบในการดำเนินงาน

ด้วย (ภาพที่ 8.2) ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง) รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม) อย่างไรก็ตามในกรณีที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (มีหลายคณะจำแนกเป็นด้านต่างๆ) เห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือความจำเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงดำเนินการต่อไปได้ เช่น กรณีของแผนแม่บทเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้น

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 นี้ ยังให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติมีอำนาจในการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทหรือไม่ ซึ่งจะแนะนำให้หน่วยงานไปทำการปรับปรุงแก้ไขหากไม่สอดคล้องกับแผนแม่บท และถ้าหน่วยงานจงใจจะไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป (มาตรา 25 และ 26) ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และรายงานให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐทราบด้วย

ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ จะมีกรอบอ้างอิง คือ แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 เหมือนกับแผนปฏิบัติราชการ แต่กรอบที่อ้างอิงในแผนระดับที่ 3 นั้นจะแตกต่างกัน โดยแผนปฏิบัติราชการอิงกับแผนหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐในระดับบน เช่น ระดับกระทรวง และแผนหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตนเองเท่านั้น ส่วนแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านจะอ้างอิงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ

กล่าวโดยสรุป ในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการบางหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานจะต้องยึดแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) และแผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยมีพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ด้วย ดังภาพที่ 8.2

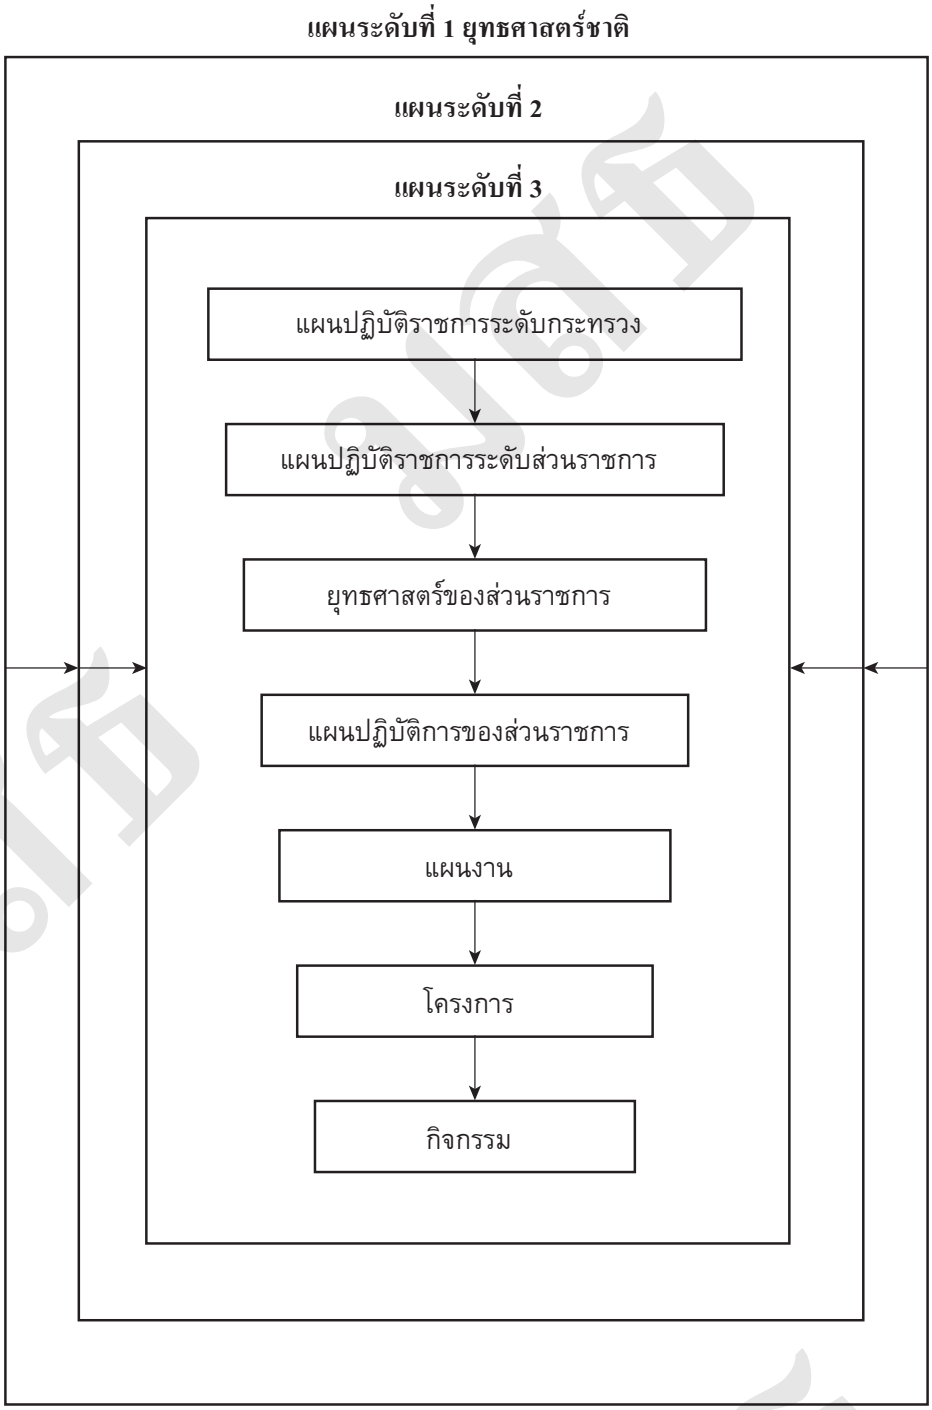

ภาพที่ 8.2 กรอบและโครงสร้างแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุ: 1) แผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเดียวเท่านั้น และยุทธศาสตร์ที่อ้างอิงก็จะเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้นๆ

2) แผนปฏิบัติการด้าน (ระบุด้าน) เป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานซึ่งใช้แผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 เป็นกรอบเช่นเดียวกันกับแผนปฏิบัติราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ใช้อ้างอิงจะเป็นยุทธศาสตร์ด้านที่เกี่ยวข้อง

3) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกรมอาจมีหลายแผนงาน และแต่ละแผนงานอาจมีหลายโครงการก็ได้

4) ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ก็จะมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเอาไว้ด้วย

.

กิจกรรม 8.1.3

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้จำแนกแผนออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 8.1.3

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

แผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 2 คือ ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน แผนการปฏิรูปประเทศ 13 แผน (ฉบับ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ซึ่งเป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน

ตอนที่ 8.2
กระบวนการจัดทำและการบริหารแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง

8.2.1 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

8.2.2 กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

แนวคิด

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะต้องมีกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อให้แผนปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำหรับหน่วยงานของรัฐแผนปฏิบัติการจะต้องสอดคล้องสนับสนุนแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ตามระเบียบที่กำหนด โดยจะต้องมีการศึกษายุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) และแผนระดับที่ 2 และแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ข้อเท็จจริงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมจัดทำแผนกำกับดูแล และควบคุมก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ ซึ่งโดยปกติการจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีขอบเขตกว้างขวางมักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน เพื่อการนี้เป็นการเฉพาะ สำหรับภาคเอกชนก็สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการเช่นเดียวกับของหน่วยงานภาครัฐ จะแตกต่างกันเฉพาะกรอบที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น
2. เพื่อให้แผนปฏิบัติการสามารถขับเคลื่อนไปได้ จำเป็นจะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการแผนโดยจะต้องมีเครื่องมือในการกำกับดูแลติดตามผลการปฏิบัติงาน เช่น การใช้แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกระดับที่เกี่ยวข้อง มีการแต่งตั้งผู้นิเทศงานและผู้ติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดให้มีระบบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วจะต้องมีการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของแผนงาน/โครงการทั้งหมดด้วย


วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 8.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
2. อธิบายกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

เรื่องที่ 8.2.1
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การจัดทำแผนปฏิบัติการตามความหมายในเชิงวิชาการจะเป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยแผนปฏิบัติการจะประกอบไปด้วย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้แต่ละโครงการ สำหรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ จะจำแนกเป็น แผนปฏิบัติการด้าน (ระบุด้าน) ซึ่งเป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเดียว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่กล่าวมาแล้วในเรื่องที่ 8.1.3 สำหรับในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเท่านั้น ส่วนแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านก็จะมีกระบวนการคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะแตกต่างกันเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ใช้อ้างอิง สำหรับกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการภาคเอกชนก็จะสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการที่นำเสนอในที่นี้ได้ ซึ่งมีขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน ดังภาพที่ 8.3

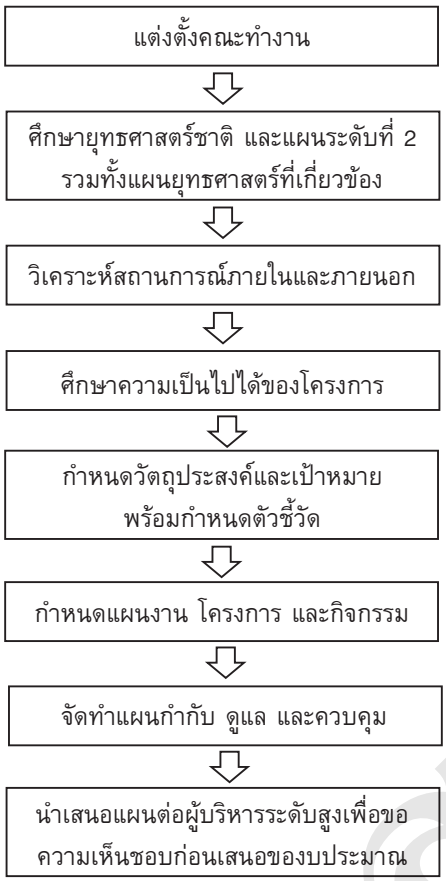

ภาพที่ 8.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

รายละเอียดขั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มีดังนี้

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเป็นคณะบุคคลในรูปของคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ยกร่างแผนปฏิบัติราชการ

2. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) และแผนระดับที่ 2 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบในการอ้างอิง โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน กรณีที่เป็นแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน แผนยุทธศาสตร์ที่อ้างอิงก็จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

3. วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก ที่อาจจะเป็นปัจจัยบวกและปัจจัยลบต่อการดำเนินงานในอนาคต ในส่วนปัจจัยภายในอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณ บุคลากรและเทคโนโลยี เป็นต้น สำหรับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เช่น ดิน น้ำ ภูมิอากาศ การคมนาคมและการขนส่ง การตลาด ความพร้อมของเกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานตามแผน

4. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและประชาชนจำนวนมาก โดยประเด็นที่ศึกษาจะต้องครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

5. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายพร้อมกำหนดตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) และแผนระดับที่ 2 (สำหรับหน่วยงานของรัฐ) และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสมจากทางเลือกต่างๆ โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่า ความประหยัด ความทันต่อเวลา และความยั่งยืนของการดำเนินงาน

6. กำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ของแต่ละโครงการภายใต้ทางเลือกที่ได้คัดเลือกไว้แล้วว่าเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ขณะนั้น โดยในการจัดทำโครงการให้ใช้แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal relationship: XYZ) ตามที่ สศช. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กล่าวคือ การดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน (X) จะต้องสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) และยุทธศาสตร์ชาติ (Z) รวมทั้งควรบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศกับกระบวนการงบประมาณอย่างเป็นระบบ

7. จัดทำแผนกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปด้วยวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม โดยปกติจะใช้แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) เป็นเครื่องมือ

8. นำเสนอแผนต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อขอความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณ โดยการนำเสนอแผนที่ยกร่างให้ผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจให้ความเห็นชอบก่อน ก่อนเสนอของบประมาณสนับสนุนต่อไป

สำหรับการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ หรือแผนระดับที่ 3 เพื่อขอความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณนั้นจำแนกได้เป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 เป็นแผนที่มีชื่อตามกฎหมายกำหนดให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลส่วนราชการเจ้าของเรื่องนำเสนอแผนระดับที่ 3 ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. และให้ สศช. รายงานผลการพิจารณาให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่วนราชการเจ้าของเรื่องทราบแล้วให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องนำเสนอแผนต่อ ครม. ตามขั้นตอนโดยมีความเห็นของ สศช. ประกอบการนำเสนอด้วย

กรณีที่ 2 เป็นแผนที่มีชื่อตามกฎหมายกำหนดก่อนมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่เป็นเรื่องที่ไม่กำหนดให้เสนอต่อ ครม. แต่ส่วนราชการอาจมีความเห็นว่าควรนำเสนอ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบ เช่น เป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ หรือเป็นเรื่องผูกพันตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ในการนำเสนอ ครม. นั้น ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องระบุเหตุผลและความจำเป็นเพื่ออธิบายความประสงค์ที่จะนำแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. และให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้นเสนอแผนต่อ สศช. พิจารณา ซึ่ง สศช. จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงความจำเป็นที่ต้องนำเสนอ ครม. หากมีความจำเป็นก็ให้ดำเนินการเหมือนกับกรณีที่ 1 หาก สศช. พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องเสนอ ครม. ให้ สศช. แจ้งส่วนราชการเพื่อดำเนินการส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไปได้

ในส่วนของสำนักงบประมาณ จะใช้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านของยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณประจำปี

ทั้ง 2 กรณีเมื่อมีการประกาศใช้แผนแล้ว ให้ส่วนราชการนำแผนเข้าสู่ระบบ eMENSCR ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ซึ่ง สศช. จะจัดทำบัญชีรายชื่อแผนระดับที่ 3 ที่ผ่านกระบวนการแล้วรายงานต่อ ครม. เพื่อทราบต่อไป

กรณีแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน ... ก็จะมีกระบวนการจัดทำแผนเช่นเดียวกัน โดยจะต้องสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ด้วย ส่วนที่แตกต่างกัน คือ จะใช้แผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านเป็นกรอบในการจัดทำ ไม่ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเป็นหลัก

สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการของภาคเอกชนในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ก็จะมีกระบวนการที่คล้ายคลึงกันกับของหน่วยงานภาครัฐ จะแตกต่างกันเฉพาะกรอบที่ใช้อ้างอิง โดยภาคเอกชนจะใช้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนแม่บทของภาครัฐมาอ้างอิงด้วยหรือไม่ก็ได้ ไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและประโยชน์ที่ภาคเอกชนจะได้รับ ส่วนการวิเคราะห์สถานการณ์อาจแตกต่างบ้าง ซึ่งภาคเอกชนจะมีกรอบที่แคบกว่าของภาครัฐ เช่น ปัจจัยภายนอกของภาคเอกชนจะหมายถึงภายนอกองค์การ ส่วนของภาครัฐอาจหมายถึงนอกประเทศด้วยก็ได้ เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการของภาคเอกชน และภาครัฐ หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐจะมี 8 ขั้นตอน ได้แก่ การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงาน ศึกษายุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนด

แผนงาน โครงการ และกิจกรรม จัดทำแผนควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และนำเสนอแผนให้ผู้บริหารที่มีอำนาจให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณ หรือแหล่งงบประมาณอื่นเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

กิจกรรม 8.2.1

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 8.2.1


กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มี 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะทำงาน
2. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก
4. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
5. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
6. กำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
7. จัดทำแผนกำกับ ดูแล และควบคุม
8. นำเสนอแผนต่อผู้มีอำนาจเพื่อขอความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณ

เรื่องที่ 8.2.2

กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การบริหารแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ หรือของภาคเอกชน จะมีประเด็นที่ต้องบริหารคล้ายกับการบริหารระดับแผนยุทธศาสตร์ แต่การบริหารแผนปฏิบัติการจะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาในรายละเอียดมากกว่าการบริหารระดับแผนยุทธศาสตร์ สำหรับการบริหารแผนปฏิบัติการมีกระบวนการดำเนินงานดังภาพที่ 8.4

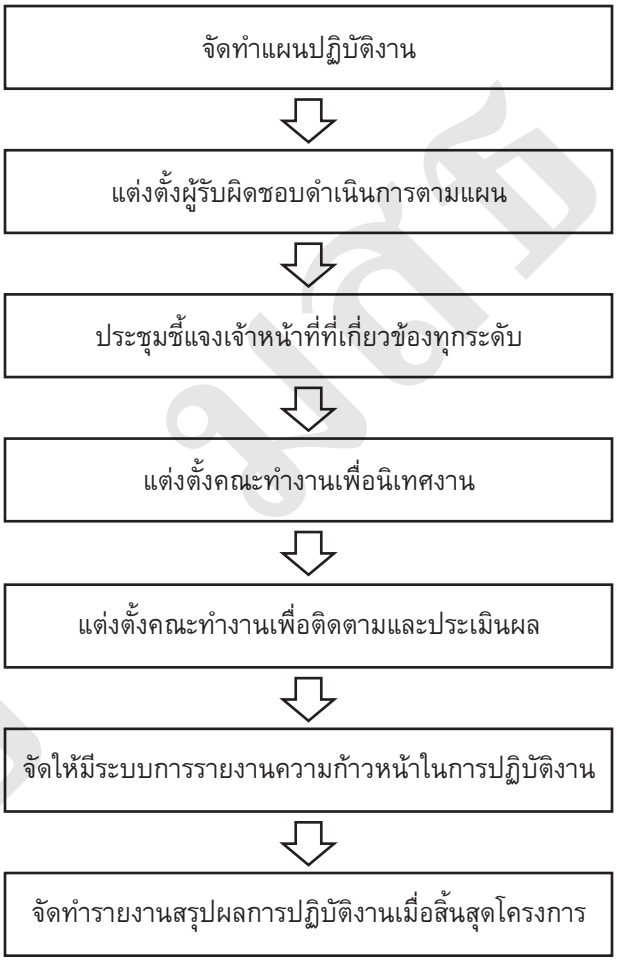

ภาพที่ 8.4 กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติราชการ

รายละเอียดกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติราชการ มีดังนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดทำแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับกำกับดูและควบคุมการปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) เป็นหลัก ซึ่งแผนภูมิแกนต์มีรายละเอียดดังนี้

แผนภูมิแกนต์ถูกพัฒนาขึ้นโดย Henry Gantt ในช่วงทศวรรษที่ 1910 ซึ่งจะประกอบด้วยรูปกราฟแท่งในแนวนอนที่แสดงถึงวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรม ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงานไปจนถึงขั้นตอนการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานเป็นระยะ ๆ ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามรูปแบบของแผนภูมิแกนต์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปบ้าง ตัวอย่างเช่น ในภาพที่ 8.5 ซึ่งบางครั้งอาจจะมีเฉพาะบางรายการเท่านั้น เช่น กิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด โดยลากเป็นเส้นตรงและอาจมีช่องให้กรอกระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมด้วยก็ได้

กิจกรรม	วันที่เริ่มต้น (ว/ด/ป)	วันที่สิ้นสุด (ว/ด/ป)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินงาน (เดือน/ปี)				ผลการดำเนินงาน (เทียบกับแผน)	ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน)
				1	2	3	.....		
1				←	—	—	→		
2					←	—	→		
3						↔			
4						←	→		
5									
6									


หมายเหตุ: ในช่วงเวลาอาจเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือนก็ได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ต้องการและระยะเวลาของโครงการ

ภาพที่ 8.5 ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart)

ประเด็นสำคัญในการกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรมในแผนภูมิแกนต์ก็คือ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในหลายๆ ด้าน เช่น งบประมาณ บุคลากร และฤดูกาล ซึ่งฤดูกาลนี้สำคัญมากในการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

จากภาพที่ 8.5 จะเห็นว่าในช่องผลการดำเนินงานนั้นจะมีการบันทึกผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับที่วางแผนไว้ในแต่ละช่วงเวลา โดยเป็นผลการดำเนินงานถึง ณ วันที่รายงานผล ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวันที่รายงานผล เช่น ในแผนกำหนดไว้ว่า ณ วัน หรือสัปดาห์ หรือเดือนที่ต้องรายงานผลจะต้องปฏิบัติงานให้ได้ปริมาณเท่าใด เมื่อถึงเวลาที่กำหนดแล้วถ้าดำเนินงานได้เท่ากับที่วางแผนไว้พอดีก็ถือว่าดำเนินงานได้ร้อยละ 100 ของแผนที่กำหนด แต่ถ้าดำเนินงานได้น้อยกว่าแผนที่วางไว้ เช่น ดำเนินงานได้ 40 หน่วยจาก 80 หน่วยที่วางแผนไว้ก็แสดงว่าดำเนินงานได้ล่าช้ากว่าแผน คือ เพียงร้อยละ 50 ของแผนเท่านั้น เป็นต้น ในบางกรณี ในบางกิจกรรม ในวันที่รายงานผลอาจดำเนินงานได้ปริมาณเกินกว่าแผนที่วางไว้ก็ได้ เช่น กำหนดไว้ว่าต้องดำเนินงานให้ได้ สำหรับผลการดำเนินงานอาจจะเทียบกับปริมาณงานทั้งหมดของโครงการก็ได้ 80 หน่วย แต่วันที่รายงานผลการดำเนินงานได้ 96 หน่วย แสดงว่าปฏิบัติงานได้ร้อยละ 120 ของแผน (96 – 80)/80) × 100) แต่การปฏิบัติงานทั้งหมดอาจจะยังไม่แล้วเสร็จก็ได้ สำหรับผลการดำเนินงานอาจจะเทียบกับปริมาณงานทั้งหมดของโครงการก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในการใช้แผนภูมิตามภาพที่ 8.5 นี้จะมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจน เพราะเป็นการคำนวณจากข้อมูลนอกแผนภูมิ ดังนั้นจึงอาจจะสร้างภาพใหม่ เช่น ภาพที่ 8.6 ซึ่งจะมองเห็นภาพได้สะดวกชัดเจนกว่าว่าการดำเนินงานนับถึงวันที่รายงานผลจะเป็นไปตามแผน ช้ากว่าแผน หรือเร็วกว่าแผนหรือไม่ โดยอาจอยู่ในช่องช่วงเวลาดำเนินงานตามภาพที่ 8.5 ก็ได้

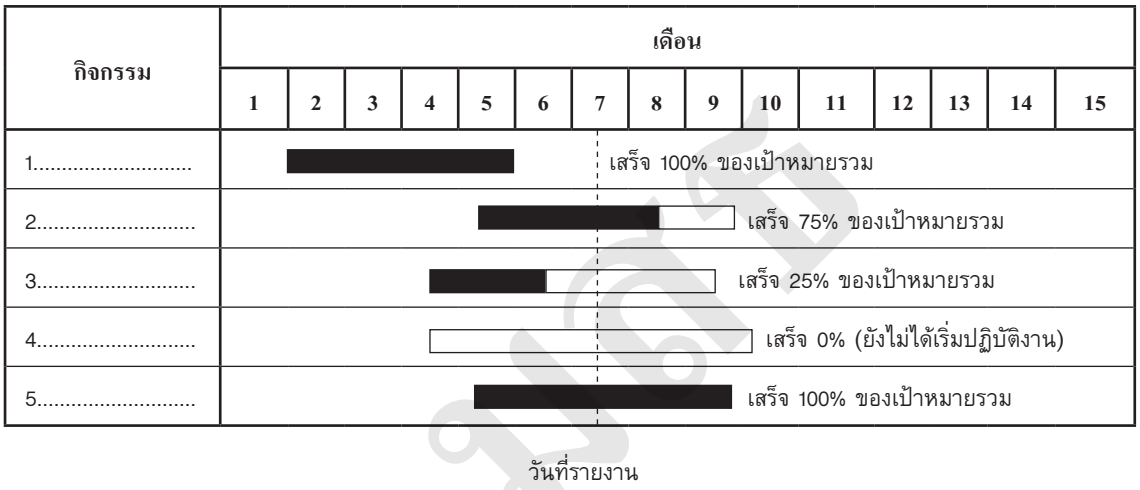

ภาพที่ 8.6 แผนภูมิแกนต์เพื่อการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (Progress Gantt chart)

จากภาพที่ 8.6 จะเห็นว่าในวันที่รายงานผลการดำเนินงานพบว่า

กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการเสร็จแล้ว 100% ของเป้าหมายรวม

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเสร็จแล้ว 75% ของเป้าหมายรวม ซึ่งเร็วกว่าแผนที่วางไว้ที่ 50% (หรือคิดเป็น 150% (75/50) × 100) ของแผน แต่ยังไม่แล้วเสร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมายรวม

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการเสร็จแล้ว 25% ของเป้าหมายรวม แต่ช้ากว่าแผนที่วางไว้ที่ 50%

กิจกรรมที่ 4 ยังไม่มีการดำเนินงานเลย ทั้งๆ ที่ในแผนควรจะดำเนินงานได้ 25%

กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% โดยเสร็จก่อนกำหนด ซึ่งตามแผนที่วางไว้ที่ 25% เท่านั้น คือ ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน

นอกจากแผนภูมิแกนต์ที่กล่าวมาแล้ว ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และกิจกรรมบางกิจกรรมขึ้นอยู่กับกิจกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น กิจกรรมอย่างหนึ่งจะเริ่มดำเนินการไม่ได้เลยถ้าหากกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ กรณีเช่นนี้การใช้แผนภูมิแกนต์ในการวางแผนจะไม่เหมาะสม จะต้องใช้แผนภูมิที่เรียกว่า เทคนิคการประเมินผลและการทบทวนโปรแกรม (Program Evaluation and Review Technique: PERT) จึงจะเหมาะสมกว่าซึ่งจะเป็นผังที่มีลักษณะคล้ายเครือข่าย (Network) ของกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละกิจกรรมก็จะมีวันเริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดหรือจำนวนวันที่ต้องใช้ในการดำเนินงานเช่นเดียวกับแผนภูมิแกนต์

PERT ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2501 เพื่อใช้วางแผนและควบคุมงานสร้างขีปนาวุธโพลาริส (Polaris) ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างเกือบหมื่นราย เพื่อสร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของขีปนาวุธ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการวางแผน ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่มีกิจกรรมสลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่ต้องรับส่งงานเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในลักษณะเครือข่าย (Network) ไม่ใช่เชื่อมโยงเป็นแนวนอนต่อเนื่องกันไป ซึ่งถ้าจะใช้ Gantt chart ก็อาจจะ

ไม่เหมาะสม PERT ได้ถูกนำมาใช้บริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชนอีกมากมาย เทคนิคในการทำ PERT มีดังนี้

1) ศึกษาวิเคราะห์ว่ากิจกรรมใดต้องทำก่อน ทำหลัง หรือทำพร้อมกัน

2) ศึกษาวิเคราะห์ว่ากิจกรรมใดต้องใช้เวลาดำเนินงานเท่าใด

3) กำหนดเป้าหมายวันที่ต้องทำให้แล้วเสร็จ


4) ลากเส้นเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีภาพที่เป็นเครือข่ายเกิดขึ้น

5) ถ้าหากพบว่าจุดสุดท้ายเวลาที่เสร็จสิ้นช้ากว่าเป้าหมายสุดท้ายที่กำหนดจะต้องหาสาเหตุว่ากิจกรรมใดที่ทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งผู้บริหารจะต้องหาทางแก้ไขเพื่อให้กิจกรรมนั้นๆ เสร็จเร็วขึ้น เช่น เพิ่มบุคลากรเพิ่มงบประมาณหรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ สำหรับกิจกรรมที่ทำให้งานอื่นต้องล่าช้าไปด้วย

PERT มีองค์ประกอบดังนี้ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด (Milestones หรือ Events ซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์วงกลม และมีตัวเลขอยู่ในวงกลมแทนลำดับขั้นตอนของการทำงาน) และลูกศรที่แสดงกิจกรรมที่ต้องทำและทิศทางการส่งมอบงานบนเส้นลูกศรจะมีเลขแสดงเวลาที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมนั้นๆ จนสำเร็จ ซึ่งอาจมีหน่วยเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือนก็ได้แต่ต้องเป็นหน่วยเดียวกันทุกกิจกรรมตามภาพที่ 8.7 และภาพที่ 8.8

กิจกรรม	วันที่ทำงาน	จุดเริ่มต้น-สิ้นสุด	
A	2	①	②
B	5	②	③
C	7	②	④
D	4	②	⑤
E	8	③	⑥
F	5	④	⑥
G	12	⑤	⑥

ภาพที่ 8.7 ตารางแสดงจำนวนวันที่ใช้ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม

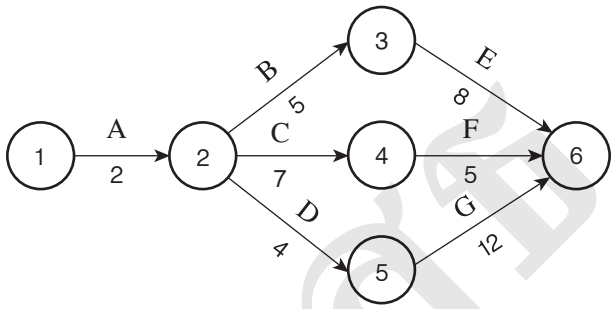

ภาพที่ 8.8 ตัวอย่างของแผนผัง PERT

จากแผนผังในภาพที่ 8.8 เมื่อนำมาพิจารณาในแต่ละเส้นทางแล้วจะเห็นว่าเส้นทางที่ 3 (ADG) จะต้องใช้เวลาปฏิบัติงานมากที่สุด ซึ่งเรียกว่า การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต (Critical Path Method: CPM)

	เส้นทาง	**วันที่ทำงาน**
เส้นทางที่ 1 (ABE)	1 →(A) 2 →(B) 3 →(E) 6	15
เส้นทางที่ 2 (ACF)	1 →(A) 2 →(C) 4 →(F) 6	14
เส้นทางที่ 3 (ADG)	1 →(A) 2 →(D) 5 →(G) 6	18 (เส้นทางวิกฤต)

ถ้าเป้าหมายต้องการให้เสร็จภารกิจทั้งหมดภายใน 15 วัน ต้องปรับปรุงเส้นทางวิกฤตให้สั้นลง หรือใช้เวลาให้น้อยลงโดยเฉพาะปรับกิจกรรม G ให้เสร็จเร็วขึ้น โดยลดจาก 12 วันให้เหลือไม่เกิน 9 วัน ซึ่งจะทำให้ภารกิจทั้งหมดเสร็จสิ้นภายใน 15 วันตามที่ต้องการ

2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน แต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้รับผิดในการปฏิบัติงานตามแผนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับแผนงาน โครงการ และกิจกรรม (ซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้) ประเด็นสำคัญก็คือ ต้องมีความชัดเจนในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติงาน เพราะถ้าไม่มีความชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วเมื่อเกิดปัญหาจะหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ ควรจัดทำการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ถ้าเป็นไปได้ควรจัดประชุมในคราวเดียวกันในครั้งแรกเพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน

4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อนิเทศงาน แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่นิเทศงานโดยเฉพาะงานที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน หรือเป็นงานที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผล แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผล ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจใช้บุคคลภายนอกองค์การเป็นผู้ดำเนินการเพื่อป้องกันการเอนเอียง (Bias) ในการประเมินผล

6. จัดให้มีระบบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน จัดให้มีระบบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ทั้งรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลงานที่ได้ดำเนินแล้วเสร็จ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะนั้น

7. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานภาพรวมทั้งหมดของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยทำการประมวลผลข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ในทุกประเด็นทุกกิจกรรม พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูงตามลำดับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการทำแผนปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

สำหรับการบริหารแผนปฏิบัติการของภาคเอกชนก็จะมีขั้นตอนและรูปแบบเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐ

กล่าวโดยสรุป การบริหารแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน หรือแผนปฏิบัติราชการ จะประกอบไปด้วยการจัดทำเครื่องมือในการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานในทุกระดับ การประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่นิเทศงาน การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดโครงการ

กิจกรรม 8.2.2

การบริหารแผนปฏิบัติการประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 8.2.2

1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน
3. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อนิเทศงาน
5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผล
6. จัดให้มีระบบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
7. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ตอนที่ 8.3
กรณีตัวอย่างแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง

8.3.1 กรณีตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
8.3.2 กรณีตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
8.3.3 กรณีตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการระดับจังหวัด
8.3.4 กรณีตัวอย่างแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน

แนวคิด

1. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (ในช่วงแรก 3 ปี) และแผนรายปี ดังนั้น ผู้บริหารองค์การภาครัฐ หรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐจำเป็นจะต้องทราบรูปแบบ และเห็นตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการที่ได้มีการดำเนินงานจริงด้วย เพื่อจะได้นำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการในอนาคตต่อไปได้ ในเรื่องนี้จะเป็นการนำเสนอตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ด้วย
2. เพื่อให้เห็นภาพของแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (กรม) ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้นำแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2564 มาแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยตรง
3. ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ เพื่อให้เห็นภาพแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ จึงได้นำเสนอแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 มาเป็นตัวอย่าง
4. เพื่อให้เห็นภาพของแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านซึ่งเป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างชัดเจน จึงได้นำแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2564 มาแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 8.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. เข้าใจรูปแบบการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงได้
2. เข้าใจรูปแบบการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานได้
3. เข้าใจรูปแบบการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการระดับจังหวัดได้
4. เข้าใจรูปแบบการนำเสนอแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านได้

บทนำ

ตามที่กล่าวมาแล้ว มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติได้มีการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพและภารกิจของหน่วยงานเจ้าภาพใน 3 ระดับในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพประสาน และบูรณาการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปีเป็นแผนระดับที่ 3 และให้นำแผนเข้าระบบ eMENSCR ทุกโครงการทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ จัดทำขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่วางแผนจะดำเนินงานในระยะ 4 ปี และแผนรายปีทั้งที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่างๆ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาคหรือโครงการร่วมกับภาคเอกชน (Pubilc Private Partnerships: PPP) รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช้งบประมาณ และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (ในช่วงแรก 3 ปี) แทนฉบับเดิมที่กำหนดไว้ 4 ปี

สำหรับตัวอย่างที่จะเสนอในตอนที่ 8.3 นี้ จะนำเสนอแผนปฏิบัติการ 4 ตัวอย่าง คือ แผนปฏิบัติราชการ 3 ตัวอย่าง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ระดับส่วนราชการ (กรม) และระดับพื้นที่หรือระดับจังหวัด และแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน จำนวน 1 ตัวอย่าง

อย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวอย่างแผนปฏิบัติการที่นำเสนอเป็นกรณีตัวอย่างนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานในแต่ละปี แต่ประเด็นยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งการศึกษาจากตัวอย่างนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน หรือแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะได้เห็นรูปแบบการนำเสนอและสาระที่นำเสนอที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแผนระดับต่างๆ โดยมีกฎระเบียบกำหนดไว้แล้ว ซึ่งระเบียบเหล่านี้มักจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก แม้ว่ารายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะจัดทำแผนก็ตาม

เรื่องที่ 8.3.1
กรณีตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง

ตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องที่ 8.1.2 ว่า สำหรับหน่วยงานของรัฐได้จำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ โดยแผนระดับที่ 3 จะประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานและแผนอื่นๆ ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี โดยในระยะแรกสำหรับแผน 5 ปีนั้น ให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) โดยเป็นแผนที่สอดคล้องสนับสนุนแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งจะมีรายละเอียดถึงแผนงาน/โครงการ และหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบแต่ละโครงการหรือกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ ซึ่งในเรื่องที่ 8.3.1 นี้จะเป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง โดยจะใช้แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) เป็นกรณีตัวอย่าง เนื่องจากเป็นกระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมากที่สุด ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จะใช้ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเป็นหลัก สำหรับแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงนี้ ส่วนราชการภายใต้สังกัดจะใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของตนเอง เนื่องจากกระทรวงไม่ได้เป็นหน่วยที่ต้องปฏิบัติโดยตรง ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงฉบับนี้มีสาระสำคัญ สรุปได้ดังภาพที่ 8.9

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตรกร	กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร	กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร	กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา 1) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเกษตรกรสูงวัย 4) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการบริหารจัดการที่ดิน 5) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริหาร 6) สร้างกลไกคุ้มครองการทำเกษตรกรรม	**แนวทางการพัฒนา** 1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้า 2) บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 3) เพิ่มมูลค่าการผลิตภาคเกษตร 4) ผลักดันการใช้ทรัพยากรชาติในภาคเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG model 5) เชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอื่นๆ เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร ที่สอดรับกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)	**แนวทางการพัฒนา** 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 2) พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและนำไปสู่การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 3) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (Precision cegricutture)	**แนวทางการพัฒนา** 1) การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล 2) การอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตร 3) การจัดการพื้นที่เกษตร ประมง และปศุสัตว์ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างสมดุลและยั่งยืน 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำประมงอย่างสมดุลและยั่งยืน 5) การปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 6) ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	**แนวทางการพัฒนา** 1) การพัฒนากลไกการดำเนินงานของภาครัฐ 2) การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ 3) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกำลังคนภาครัฐ 4) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการเกษตร

ภาพที่ 8.9 (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตรกร	กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร	กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร	กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงาน 1) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 3) ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 5) พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 6) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 7) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 8) บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 9) บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 10) ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**แผนงาน** 1) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 2) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 3) บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบ-การและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 4) บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 5) บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ 6) บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7) บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 8) พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**แผนงาน** 1) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 2) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**แผนงาน** 1) บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2) พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 4) ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6) บูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 7) บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 8) ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	**แผนงาน** 1) พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2) พื้นฐานด้ารการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3) ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 4) บุคลากรภาครัฐ

ภาพที่ 8.9 สรุปแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

ที่มา: แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565)

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) มีดังนี้

1. วิสัยทัศน์ ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน

2. พันธกิจ

1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง

2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. เป้าประสงค์ คือ เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 97,860 บาท ภายในปี 2565 โดย

1) เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ

2) ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร

3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร

4) การเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5) การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. เป้าหมาย

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

3) รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและต่อเนื่อง

4) ความมั่นคงด้านน้ำทางการเกษตรของประเทศเพิ่มขึ้น

5. ตัวชี้วัด

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8

2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2

3) เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่

6. กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ภายใต้แต่ละกลยุทธ์จะมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งในที่นี้จะยกเฉพาะกลยุทธ์ที่ 2 เป็นกรณีตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งในกลยุทธ์ที่ 2 คือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรซึ่งจะมี 12 เป้าหมาย และ 12 ตัวชี้วัด ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

1. เป้าหมาย

1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3) เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
4) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
5) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
6) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
7) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
8) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น
9) ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตรลดลง
10) การลงทุนภาคเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
11) การลงทุนภาคเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
12) การลงทุนภาคเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น

2. ตัวชี้วัด

1) มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ)
2) มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ (เฉลี่ยร้อยละ)
3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GAP/เกษตรอินทรีย์ (ราย)
4) จำนวนผู้เข้ารับการอบรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ราย)
5) มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)
6) จำนวนพันธุกรรมพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ที่ใช้ประโยชน์และได้รับการส่งเสริมร้อยละ 5 ต่อปี /จำนวนพันธุกรรมพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ที่เก็บไว้ในธนาคารพันธุกรรม (สายพันธุ์)
7) มูลค่าของสินค้าเกษตรหลักที่ใช้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)
8) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
9) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อยอดขาย
10) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี)
11) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ร้อยละต่อปี)
12) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อปี)

นอกจากเป้าหมายและตัวชี้วัดแล้ว ในแต่ละกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ยังมีรายละเอียดถึงแผนงานโครงการด้วย ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 นี้ มีทั้งหมด 8 แผนงาน (ภาพที่ 8.9) ได้แก่

1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
3) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
4) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
5) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
6) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
7) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

อย่างไรก็ตามบางแผนงานอาจจะอยู่ภายใต้หลายกลยุทธ์ก็ได้ เช่น แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าจะอยู่ภายใต้กลยุทธ์ 1–4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงจะอยู่ภายใต้ 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 และที่ 5 ส่วนแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจะอยู่ภายใต้ทุกกลยุทธ์ (1–5) เป็นต้น

ภายใต้แต่ละแผนยังประกอบไปด้วยหลายโครงการ โดยแต่ละโครงการจะมีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรรในแต่ละปี (รวม 3 ปี) ทั้งนี้บางโครงการอาจมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานหลายหน่วยงาน โดยแยกกันตามกิจกรรมหลัก ตัวอย่างเช่น โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์พื้นถิ่นก็จะมี 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมการข้าว (ด้านข้าว) กรมปศุสัตว์ (ด้านปศุสัตว์) กรมประมง (ด้านประมง) และกรมส่งเสริมการเกษตร (ด้านพืชอื่นๆ)

3. แนวทางการพัฒนา (ภายใต้กลยุทธ์ที่ 2)

1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
2) บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3) เพิ่มมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร
4) ผลักดันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG model
5) เชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอื่นๆ เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรที่สอดรับกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ

ในการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐนอกจากระบุเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ยังต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนงาน โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลด้วย ตัวอย่างเช่น โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) ตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น จะสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 รวมทั้งนโยบายรัฐบาล ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเกษตร

แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล (หลัก) ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

นโยบายรัฐบาล (เร่งด่วน) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 2 ทุกแผน เพราะไม่จำเป็นและไม่มีระเบียบบังคับไว้ การเชื่อมโยงกำหนดไว้เฉพาะยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 แผนใดแผนหนึ่งก็เพียงพอ ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศและนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติม คือ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการฉบับที่นำเสนอในที่นี้น่าจะคลาดเคลื่อนไปจากหลักการจัดทำแผนโดยทั่วไป กล่าวคือ เป้าหมายควรระบุเป็นตัวเลข ส่วนตัวชี้วัดไม่ต้องระบุเป็นตัวเลข เช่น ตัวชี้วัด 1) ควรระบุเพียงว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (ไม่ต้องมีคำว่าเพิ่มขึ้น) ส่วนเป้าหมาย 1) ควรระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 เป็นต้น

รายละเอียดทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในเอกสารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งหน่วยงานภายใต้สังกัดทั้งส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องนำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และรายปีของหน่วยงานของตนเอง รวมทั้งเป็นกรอบในการกำหนดงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th หรือที่ Bapp.adhoc@gmail.com

กล่าวโดยสรุป ทุกกระทรวงในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (เริ่มแรกระยะ 3 ปี) และรายปี ในที่นี้เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมากที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างถึงความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 สำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จะมีประเด็นสำคัญ คือ การพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม 8.3.1

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) ประกอบไปด้วยกี่กลยุทธ์ อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 8.3.1

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

เรื่องที่ 8.3.2
กรณีตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

ตามที่กล่าวมาแล้วหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และรายปี ในที่นี้จะนำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยตรง ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จะใช้แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรอบในการจัดทำด้วย โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง

เป้าหมาย

1) เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
2) การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
3) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1) Smart farmers/Young smart farmers/Smart group และเครือข่ายมีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

2) การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

3) รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

จากตัวอย่างนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเสนอ คือ เป้าหมายที่นำเสนอในที่นี้น่าจะเป็นเป้าประสงค์มากกว่าเป้าหมายเพราะระบุเฉพาะทิศทางที่ต้องการเท่านั้น ส่วนเป้าหมายจะนำเสนอควบกับตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัด 1) คือ จำนวน Smart farmers/Young smart farmers/Smart group และเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ส่วนเป้าหมาย 1) คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เป็นต้น

กลยุทธ์ มี 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต

กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ

โดยในแต่ละกลยุทธ์จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รวมทั้งแนวทางในการพัฒนา รวมทั้งแผนงาน โครงการ และกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วย ซึ่งในที่นี้จะนำเสนอรายละเอียดเฉพาะกลยุทธ์ที่ 1 เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร

เป้าหมาย

1) เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น

2) องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย มีความเข้มแข็งและเป็น Smart group เพิ่มขึ้น

3) มีการขยายผลโครงการในพระราชดำริมากขึ้น

4) เกษตรกรมีการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

5) ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหาร

ตัวชี้วัด

1) เกษตรกรเป็น Smart group และ Young smart farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเป็น Smart group ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

3) ครัวเรือนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

4) ครัวเรือนเกษตรกรที่มีการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้

5) ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แนวทางการพัฒนา

1) ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา

2) พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer

3) พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็น Smart group

4) ส่งเสริมการผลิตเพื่อความมั่นคงในอาชีพและความยั่งยืนของภาคเกษตร

5) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน

6) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน

แผนงาน/โครงการ ในส่วนแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการเกษตรจะใช้ชื่อแผนงานเช่นเดียวกับแผนงานในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 10 แผนงาน

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) ในแผนงานนี้จะไม่มีโครงการแต่จะเป็นรายการรายจ่ายประจำในแต่ละหมวด เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการและรายจ่ายอื่นๆ เป็นต้น

2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี 1 โครงการ คือ โครงการผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ซึ่งมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์

3) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ประกอบไปด้วย 12 โครงการ เช่น

- โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
- โครงการเกษตรอินทรีย์
- โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม มี 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง และโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5) แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม มี 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

6) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 1 โครงการ คือ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโครงการนี้มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบแยกตามกิจกรรมหลัก

7) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว มี 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร

8) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค มี 4 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ

พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร

9) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล มี 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

10) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มี 6 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร และโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

ซึ่งในแต่ละโครงการจะกำหนดเป้าหมายและงบประมาณที่ต้องใช้ด้วย

นอกจากนี้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของแต่ละโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยดังตัวอย่างในภาพที่ 8.10 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th

กล่าวโดยสรุป ทุกหน่วยงานระดับกรมของรัฐจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 และนโยบายรัฐบาล และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งจะเห็นว่าภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรจะเกี่ยวข้องเฉพาะพืชและเกษตรกรที่ปลูกพืชเท่านั้น สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสำหรับสินค้าอื่นๆ เช่น ปศุสัตว์และประมง จะอยู่ในแผนปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์และแผนปฏิบัติราชการของกรมประมง เป็นต้น สำหรับงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินและน้ำ ส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดินและแผนปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน เป็นต้น ดังภาพที่ 8.10

กลยุทธ์ กสก.	โครงการ กสก.	ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท	แผนแม่บทย่อย	แผนการปฏิรูปประเทศ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร	1) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ความมั่นคง	ความมั่นคง	การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
	2) ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ - กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร	-	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
	3) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	การเสริมสร้างทุนสังคม	เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
	4) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	การเสริมสร้างทุนสังคม	เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
	5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	เศรษฐกิจฐานราก	การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ภาพที่ 8.10 (ต่อ)

กลยุทธ์ กสก.	โครงการ กสก.	ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท	แผนแม่บทย่อย	แผนการปฏิรูปประเทศ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
	6) โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน	การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	เศรษฐกิจฐานราก	การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
	7) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	เศรษฐกิจฐานราก	การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ	เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ภาพที่ 8.10 ความสอดคล้องของโครงการกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2564 กับแผนระดับต่าง ๆ

หมายเหตุ: นำเสนอเพียงบางโครงการเท่านั้น

ที่มา: แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรม 8.3.2

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการเกษตรมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายอะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 8.3.2

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการเกษตรมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 3 ค่า ดังนี้

1. Smart farmers/Young smart farmers/Smart group และเครือข่ายมีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
2. การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
3. รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

เรื่องที่ 8.3.3
กรณีตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการระดับจังหวัด

จังหวัดจัดเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยหนึ่งที่ถูกกำหนดให้ต้องจัดทำแผนราชการประจำปีเช่นเดียวกันกับหน่วยงานระดับกรม อย่างไรก็ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ซึ่งเป็นแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีที่มาของงบประมาณจากหลายแหล่ง ประกอบด้วย แผนพัฒนาจังหวัดของตนเอง และแผนปฏิบัติราชการของกรมต่างๆ ที่มีพื้นที่ดำเนินงานอยู่ในจังหวัดนั้นๆ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดจำเป็นต้องสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ด้วย เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับกรม ระดับกระทรวง สำหรับตัวอย่างที่จะนำเสนอในที่นี้ก็คือ แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง

ตัวชี้วัดรวมของจังหวัด

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี
2) สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดลดลงร้อยละ 1 ต่อปี
3) ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ลดลง

จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าการนำเสนอตัวชี้วัดจะนำเสนอควบกับค่าเป้าหมาย

ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้

1) เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco town)
2) เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative craft innopolis)

3) เมืองเกษตรสีเขียว (Green agriculture city)

4) เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม (Cultural experience destination)

5) เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of life)

โดยในแต่ละประเด็นพัฒนา (กลยุทธ์) จะประกอบไปด้วยตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ เป้าหมาย และตัวชี้วัดระดับโครงการ และระดับกิจกรรมหลัก และผลผลิต ผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งงบประมาณ และผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมหลัก ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่ 3 คือ เมืองเกษตรสีเขียวเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น เพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมากที่สุด ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ตัวชี้วัด (ประเด็นการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว)

1) มูลค่าสินค้าเกษตร (ลำไย/มะม่วง) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

2) ลดต้นทุนการผลิตในเกษตรแปลงใหญ่ร้อยละ 5 ต่อปี

3) จำนวนแปลงของสินค้าเกษตรได้รับการเตรียมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

แนวทางการพัฒนา (ภายใต้ประเด็นการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว) ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

1) การวิจัยพัฒนา ปัจจัยพื้นฐานและบุคลากร

2) การเพิ่มผลผลิต พัฒนาการคุณภาพและลดต้นทุน

3) การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม

4) การพัฒนาระบบตลาด

สำหรับโครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว มี 2 โครงการหลัก รวม 7 กิจกรรมหลัก (โครงการย่อย) ดังนี้

1. โครงการยกระดับเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสีเขียว ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก (โครงการย่อย) ดังนี้

1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดลำพูน มีสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเป็นหน่วยงานดำเนินการ

1.2 การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน มีสำนักงานประมงจังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินการ

1.3 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตรและอาหาร มีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินงาน

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรจังหวัดมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินการ

ทั้งนี้ทุกโครงการย่อยของโครงการนี้จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดอยู่ภายใต้แผนงานการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้

2.1 สร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย จังหวัดลำพูนมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินการ

2.2 เพิ่มศักยภาพทายาทเกษตร เตรียมความพร้อมเข้าสู่ Young smart farmer มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนเป็นหน่วยงานดำเนินการ

2.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา–สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน มีสำนักงานจังหวัดลำพูน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินการ

สำหรับโครงการย่อยที่ 2.1 จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนงานการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง เช่นเดียวกับโครงการย่อยที่ 1.1–1.4 ส่วนโครงการย่อยที่ 2.2 จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขณะที่โครงการย่อยที่ 2.3 จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนงานศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

สำหรับเป้าหมายตัวชี้วัดระดับโครงการ และระดับกิจกรรมหลัก (โครงการย่อย) รวมทั้งผลได้และผลลัพธ์ของโครงการย่อยที่จะเสนอเป็นตัวอย่างในที่นี้คือ โครงการที่ 1 และโครงการย่อยที่ 1.1 ซึ่งมีดังนี้

เป้าหมายโครงการที่ 1

1) มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

2) ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรร้อยละ 5 ต่อปี

3) สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี

4) สินค้าเกษตรได้รับการเตรียมการและโครงการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

ตัวชี้วัดโครงการย่อยที่ 1.1

1) เกษตรกรเป้าหมาย 250 ราย ได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP และผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบมาตรฐาน GAP ร้อยละ 100

2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานแปลง GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลผลิตของโครงการย่อยที่ 1.1

1) เกษตรกรผู้ปลูกลำไย/มะม่วง จำนวน 250 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP

2) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการย่อยที่ 1.1

1) เกษตรกรผู้ปลูกลำไย/มะม่วง สามารถนำความรู้การผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP ไปปฏิบัติในแปลงได้ และแปลงลำไย/มะม่วง ได้เข้าสู่กระบวนการตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP

2) สินค้าเกษตรสามารถส่งออกได้ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

3) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูน ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่ และผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น

ผลกระทบของโครงการย่อยที่ 1.1

เชิงบวก

1) พื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน

3) เกษตรกรและผู้บริโภคลดความเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งผลต่อการลดภาระภาครัฐด้านการรักษาพยาบาล

4) สินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูนสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้

5) เกิดการรับรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร ยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ ขยายฐานผู้บริโภค และลดผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานของตลาดบริโภคสด

เชิงลบ ไม่มี

ทั้งนี้ ทั้ง 2 โครงการตามตัวอย่างข้างต้น เป็นโครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด นอกจาก 2 โครงการนี้แล้ว ในประเด็นการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวนี้ยังมีโครงการของกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งมีกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ที่มีกิจกรรมก่อสร้างประตูระบายน้ำด้วย ซึ่งจะใช้งบประมาณจากส่วนราชการที่เป็นเจ้าของโครงการ คือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมชลประทาน

สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของจังหวัดลำพูน www.Lamphun.go.th

ในส่วนราชการระดับอำเภอไม่ได้กำหนดให้ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการแต่อย่างใด แต่โดยปกติแล้วในทางบริหารราชการแผ่นดิน แผนงานโครงการระดับกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จะถูกส่งมาที่จังหวัดและจังหวัดก็จะมอบหมายให้อำเภอที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละกระทรวง/กรมที่มีโครงสร้างองค์กรไม่เหมือนกัน บางกรมจะไม่มีส่วนราชการระดับจังหวัด บางกรมจะมีส่วนราชการทั้งระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอด้วย

ในกรณีของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีส่วนราชการระดับเขต จังหวัด และอำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ของประเทศ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการแต่ละระดับ คือ เขต จังหวัด อำเภอ จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งจะประกอบไปด้วย แผนพัฒนาการเกษตรระดับเขต แผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ และแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ไปจนถึงแผนการผลิตของเกษตรกรเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ทั้งนี้แผนระดับล่างจะใช้ข้อมูลระดับบนและสถานการณ์ข้อเท็จจริงในพื้นที่รับผิดชอบประกอบการจัดทำแผน เมื่อจัดแผนพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แผนระดับล่างจะถูกส่งขึ้นไปสู่ระบบบนตามลำดับ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือกรม รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกระบวนการจัดทำแผนในพื้นที่จะมีความคล้ายคลึงกันในทุกระดับ ทั้งขั้นตอนและแบบฟอร์มการนำเสนอแผนจะแตกต่างกันเพียงเฉพาะขอบเขตพื้นที่ที่ดำเนินการ และระดับของผู้ให้ความเห็นชอบแผนเท่านั้น

สำหรับแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี (Work plan/Work schedule) ในทุกระดับ คือ ระดับกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งจะมีรายละเอียดถึงกิจกรรมของแต่ละโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส และรายเดือนที่แต่ละหน่วยงานต้องปฏิบัติ (ดังภาพที่ 8.11) ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดจะแจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอจะมอบหมายให้กลุ่มหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม โดยในแผนปฏิบัติงานนี้อาจระบุเป็นรายวัน ตามแบบฟอร์มที่กรมกำหนด (ดังภาพที่ 8.12) ทั้งนี้งานที่ปฏิบัติจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ กิจกรรมตามภารกิจปกติ เช่น การประชุม การฝึกอบรมและการเยี่ยมเยียนเกษตรกร การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแผนฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and Visit: T&V System) และอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กิจกรรมตามภารกิจในแผนงาน/โครงการในพื้นที่เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติแล้วก็จะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ พร้อมระบุผลสำเร็จเพื่อเทียบกับแผนและปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ซึ่งแผนปฏิบัติงานที่ว่านี้ก็คือ ปฏิทินการทำงานของเจ้าหน้าที่นั่นเอง และจะไม่เหมือนกับแผนปฏิบัติการ ซึ่งหมายถึงแผนที่ประกอบไปด้วย แผนงานโครงการและกิจกรรม ซึ่งจะมีแผนปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมอยู่ภายใต้แต่ละโครงการด้วย

กล่าวโดยสรุป แผนปฏิบัติราชการระดับจังหวัด จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับแผนปฏิบัติราชการระดับกรม ส่วนที่แตกต่างกันก็คือแหล่งที่มาของงบประมาณอาจจะมาจากหลายแหล่ง ทั้งของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและส่วนราชการอื่นที่มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัด

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ.....

หน่วยงาน.....

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ (6)												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
(2)	(3)	(4)	(5)	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	(7)

ภาพที่ 8.11 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตรระดับหน่วยงาน

แผนเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรระดับบุคคล

เดือน ..... พ.ศ. .....

ชื่อเจ้าหน้าที่ ..... ตำแหน่ง .....

สำนักงานเกษตรอำเภอ ..... จังหวัด .....

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ	เครื่องมือ อุปกรณ์	สถานที่ (จุดปฏิบัติงาน)	บุคคลเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ที่ร่วมปฏิบัติงาน	ผลการปฏิบัติ		หมายเหตุ
						ตามแผน	เปลี่ยนแปลง	

ภาพที่ 8.12 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานระดับบุคคลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับบุคคล

ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กิจกรรม 8.3.3

แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2564 มีประเด็นการพัฒนากี่ประเด็น อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 8.3.3

แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2564 มี 5 ประเด็น คือ

1. เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco town)
2. เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative craft innopolis)
3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green agriculture city)
4. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม (Cultural experience destination)
5. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of life)

เรื่องที่ 8.3.4
กรณีตัวอย่างแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน

ตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องที่ 8.2.2 ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ให้จำแนกแผนของภาครัฐออกเป็น 3 ระดับ คือ แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ที่ประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ สำหรับแผนปฏิบัติราชการ เป็นแผนเฉพาะของหน่วยงานตามที่ได้นำเสนอเป็นตัวอย่างแล้วในเรื่องที่ 8.3.1–8.3.3 ซึ่งเป็นแผนของหน่วยงานระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัดตามลำดับ ส่วนแผนปฏิบัติการด้าน (เฉพาะด้าน) เป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเดียวกัน หรือต่างกระทรวงก็ได้ ซึ่งขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านนั้นจะคล้ายคลึงกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการทุกประการ แต่จะแตกต่างกันเฉพาะหน่วยงานที่เข้ามาร่วมจัดทำแผน และร่วมดำเนินงานตามแผนเท่านั้น ซึ่งแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านจะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยปกติแล้วจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่มีผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานด้วย สำหรับตัวอย่างที่จะนำเสนอในที่นี้คือ แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560–2565 โดยสาระสำคัญจะอ้างอิงในการจัดทำแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะมาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2564) ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้สรุปได้ ดังนี้ (ภาพที่ 8.13)

1. วิสัยทัศน์ ประเทศไทยเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายในปี 2565

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด

1) เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านไร่ ภายในปี 2565

2) มีจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 80,000 ราย ภายในปี 2565

3) อัตราการขยายต่อของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี

3. ประเด็นการพัฒนา

1) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

2) พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์

3) พัฒนาการตลาด การบริการ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

นอกจากเป้าหมายและตัวชี้วัดในภาพรวมของแผนปฏิบัติการแล้ว ในระดับประเด็นการพัฒนาแต่ละประเด็นยังได้มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้วย เช่น

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ มีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1) ผลงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์สามารถนำไปต่อยอดในเชิงนโยบายเชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

2) ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่จัดทำขึ้นมีผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี

3) ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ในแต่ละประเด็นการพัฒนายังจำแนกออกเป็นประเด็นย่อยอีก ตัวอย่างเช่น ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 ได้จำแนกเป็น 3 ประเด็นย่อย คือ

1.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์

1.2 พัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์

1.3 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ภายใต้ประเด็นย่อยแต่ละประเด็นยังมีรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในประเด็นย่อยที่ 1.1 มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน


2) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรอินทรีย์ไปสู่เชิงพาณิชย์

3) ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตลอดโซ่อุปทานตามแนวทางความปกติใหม่ (New normal) (ปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ กระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด และโลจิสติกส์)

4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เกษตรกร Young smart farmer รวมทั้งประสานความร่วมมืองานวิจัย และงานวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ

5) ส่งเสริมการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการวางแนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ

6) ส่งเสริมการวิจัยเชิงสังคม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยถอดบทเรียนจากฟาร์มต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ และเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

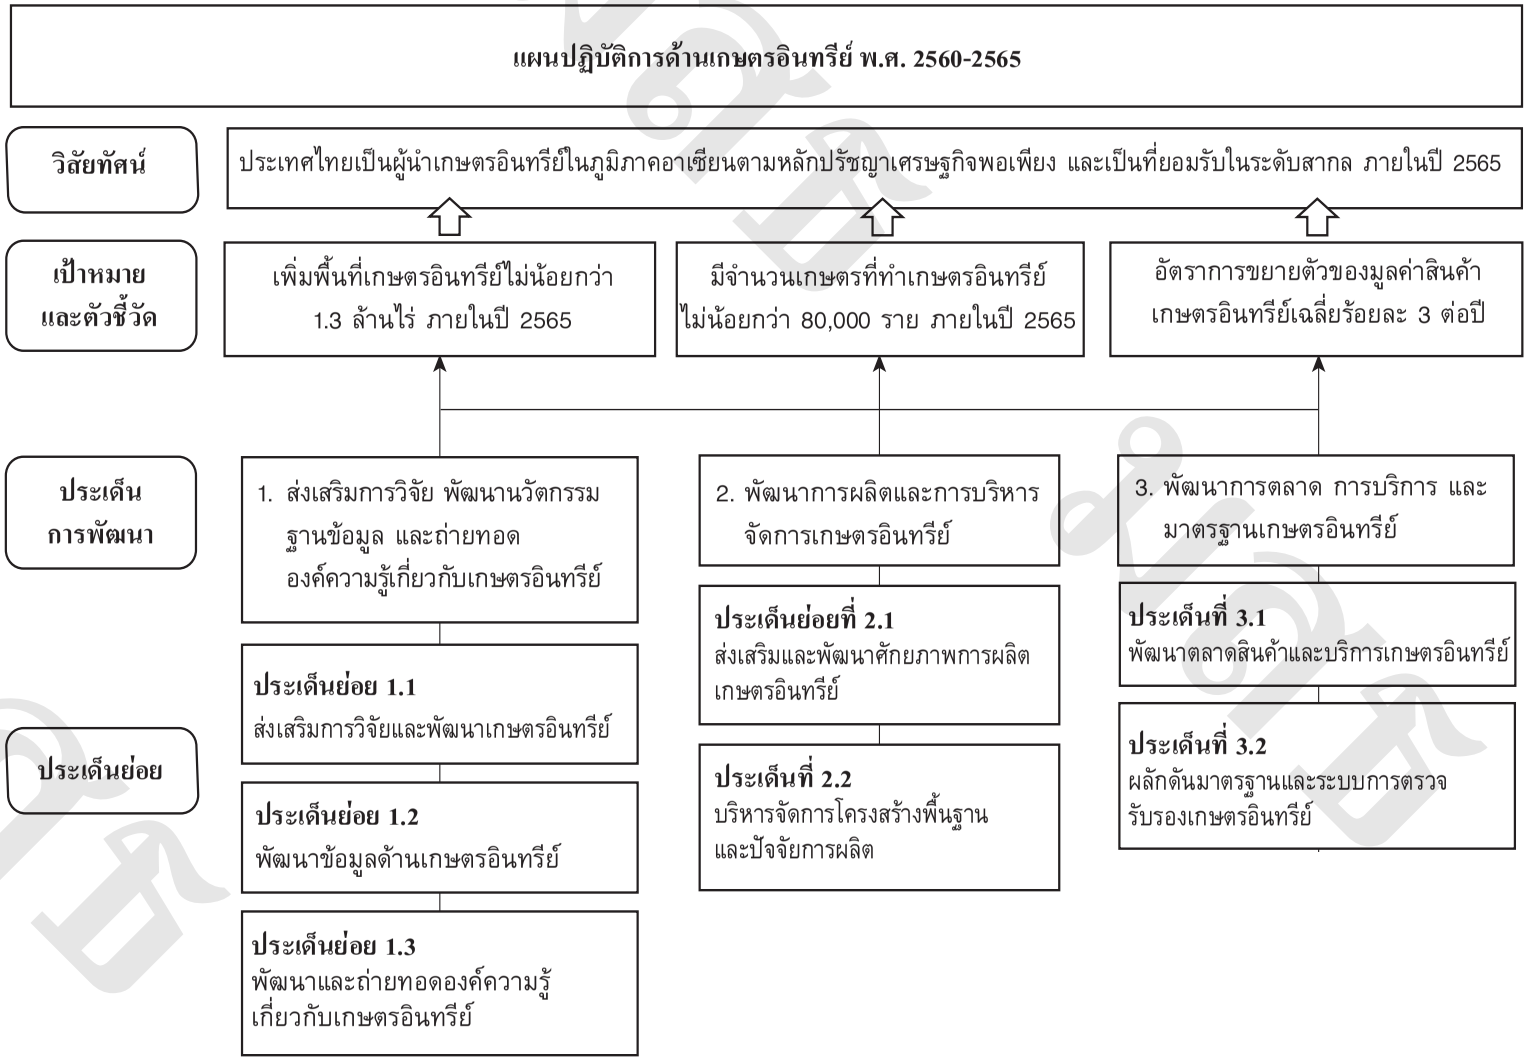

ภาพที่ 8.13 แผนภูมิแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2565

ในแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้ยังได้มีผังแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ด้วย (ดังภาพที่ 8.14) ซึ่งแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 2 ด้าน คือ ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 3 การเกษตร ประเด็นที่ 18 การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และประเด็นที่ 23 การวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยอีกหลายแผน อาทิ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ ระบบนิเวศการเกษตร การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคการเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นต้น

เพื่อให้แผนปฏิบัติการฉบับนี้ขับเคลื่อนไปได้จำเป็นจะต้องมีกลไกการขับเคลื่อน ดังนั้นจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานขึ้น 3 คณะ ได้แก่


1) คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
3) คณะทำงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด

โดยคณะกรรมการชุดที่ 1 (ชุดใหญ่) นั้น เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ บูรณาการแนวทางมาตรการ และจัดระบบการประสานงาน มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธาน มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนคณะกรรมการจะประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวม 9 กระทรวง (เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย) และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งหมดจำนวน 31 คน

ในส่วนของคณะอนุกรรมการฯ จะมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีผู้ช่วยปลัด-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ส่วนคณะอนุกรรมการจะประกอบด้วย ผู้แทนของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ซึ่งจะคล้ายคลึงกับคณะกรรมการชุดที่ 1 แต่ในส่วนของคณะอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจะมีระดับต่ำกว่าในชุดของคณะกรรมการ ซึ่งหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ จะมีหน้าที่หลัก คือ พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการงบประมาณ และกำหนดแนวทางมาตรการหรือกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในส่วนของคณะทำงานระดับจังหวัด จะใช้กลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการคณะทำงาน

จะเห็นว่าในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดแผนงาน/โครงการเอาไว้เลย แต่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเนื่องจากเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

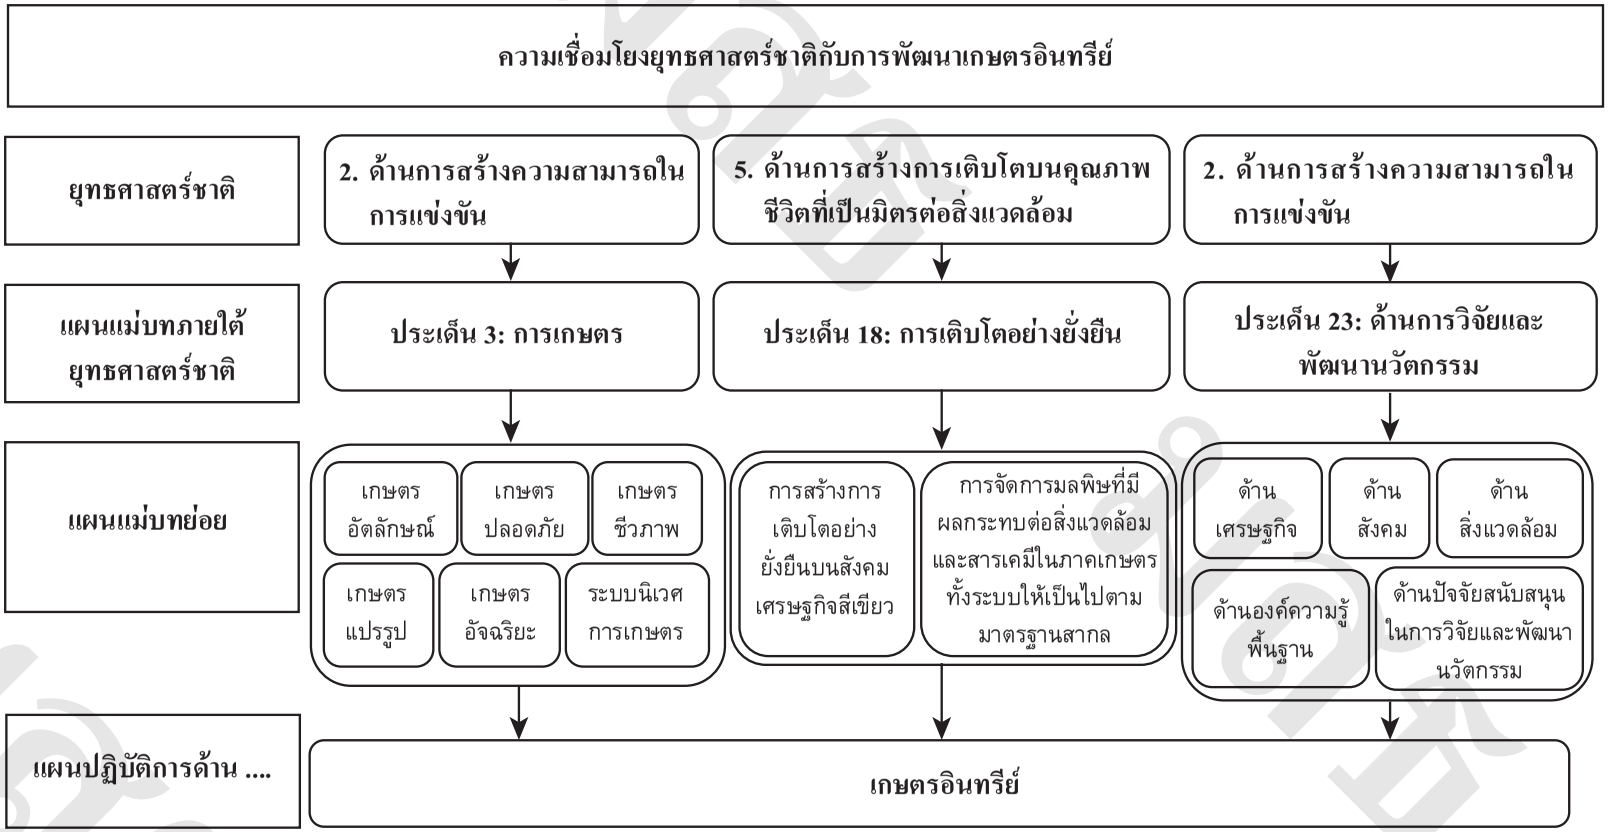

ภาพที่ 8.14 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม 8.3.4

แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2564 ประกอบไปด้วยประเด็นการพัฒนากี่ประเด็น อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 8.3.4

แผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2564 มีประเด็นการพัฒนา 3 ประเด็น ได้แก่

1. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
2. พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์
3. พัฒนาการตลาด การบริหารและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

บรรณานุกรม

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2560). *คู่มือและวิธีการปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Viisit System: T & V System).* สืบค้นจาก http://infocenter.doae.go.th>uploads

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2563). *แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการเกษตร.* สืบค้นจาก http://ssnet.doae.go.th>2020/09

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร. (2564). *แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564.* ม.ป.ท.

สำนักงานจังหวัดลำพูน. (2563). *แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.* สืบค้นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564, จาก http://www.Lamphun.go.th>แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2560). *แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ (พ.ศ. 2560–2564).* ม.ป.ท.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2560). *ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (พ.ศ. 2560–2564).* ม.ป.ท.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2562). *แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565).* สืบค้นจาก http://secreta.doae.go.th>2020/02

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม. (2560). *แนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ฉบับพฤษภาคม 2562.* สืบค้นจาก http://nscr.nesdc.go.th>2019/10

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. (2563). *ยุทธศาสตร์ชาติ.* สืบค้นจาก http://nscr.nesdc.go.th/ยุทธศาสตร์ชาติ
