หน่วยที่ 9

การบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

อาจารย์เทอดพันธ์ ธรรมรัตนพงษ์



ชื่อ อาจารย์เทอดพันธ์ ธรรมรัตนพงษ์

วุฒิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 9

แผนการสอนประจำหน่วย

ชุดวิชา หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 9 การบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตอนที่

9.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตร
9.2 กระบวนการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
9.3 การบริหาร การควบคุมและการยุติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
9.4 กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

แนวคิด

1. โครงการส่งเสริมการเกษตร เกี่ยวข้องกับการนำความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ มาช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและครอบครัวในเชิงพัฒนาการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้มาจากนโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์หรือแนวคิดการพัฒนาหรือตามภารกิจเร่งด่วน เพื่อบรรเทาทุกข์และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น การที่จะทำให้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้จำเป็นจะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี
2. กระบวนการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เริ่มด้วยขั้นตอนการริเริ่มโครงการด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility study) ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในขั้นการเตรียมการจัดทำโครงการซึ่งเป็นการเตรียมความสมบูรณ์ของร่างโครงการ สำหรับการนำไปสู่ขั้นตอนการนำเสนอโครงการในรูปแบบการเขียนโครงการ ซึ่งกระทำได้ 2 แบบ คือ การเขียนในรูปแบบประเพณีนิยม (conventional method) กับการจัดทำโครงการในรูปตารางเหตุผลสัมพันธ์ (logical framework)
3. กระบวนการบริหาร การควบคุมและการยุติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นความพยายามที่จะทำให้กิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการบรรลุความสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อช่วยให้ผู้บริหารโครงการทราบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีความก้าวหน้า มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปจนกระทั่งโครงการเสร็จสิ้นหรือยุติโครงการลง

4. กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มีรูปแบบทั้งที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ของภาคเอกชน และโครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีรูปแบบการเขียนโครงการแตกต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการเขียนโครงการสำหรับการนำเสนอโครงการ

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาหน่วยที่ 9 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตรได้
2. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
3. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร การควบคุมและการยุติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
4. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับกรณีศึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

กิจกรรมระหว่างเรียน

1. ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 9
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 9.1–9.4
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์
5. ชมรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษา (ถ้ามี)
6. ทำกิจกรรมประจำชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
8. ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 9

สื่อการสอน

1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ถ้ามี)
4. รายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษา (ถ้ามี)
5. กิจกรรมประจำชุดวิชา (ถ้ามี)

การประเมินผล

1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากกิจกรรมประจำชุดวิชา (ถ้ามี)
4. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจำภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 9 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป

ตอนที่ 9.1
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตร

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง

9.1.1 ความหมายและความสำคัญของการบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตร

9.1.2 กระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

แนวคิด

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นการนำความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ มาช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและครอบครัวในเชิงพัฒนาการเกษตร ทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเกิดจากความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ดังนั้นการบริหารโครงการจึงมีความสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้
2. กระบวนการและขั้นตอนการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแสดงเป็นวัฏจักรจะช่วยให้เห็นภาพรวมของภาระงานที่จะต้องมีการดำเนินงานภายใต้โครงการประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน คือ 1) การริเริ่มโครงการ 2) การเตรียมโครงการ 3) การปฏิบัติตามโครงการ 4) การควบคุมโครงการ และ 5) การยุติโครงการ ทั้งนี้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอาจเกิดขึ้นมาจากนโยบายภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น รวมทั้งความต้องการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 9.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตรได้
2. อธิบายกระบวนการและขั้นตอนการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

เรื่องที่ 9.1.1
ความหมายและความสำคัญของการบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตร

ความหมายของการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ความหมายของการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นกลุ่มคำ 2 คำ คือ 1) การบริหารโครงการ และ 2) การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่มาประกอบกันทำให้เกิดคำว่า “การบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” ซึ่งทำให้เกิดความหมายเพิ่มขึ้น ดังนี้

การบริหารโครงการ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2546, น. 8) กล่าวว่า การบริหารโครงการ เป็นสหวิทยาการที่ต้องอาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์องค์กร การจัดโครงสร้างองค์การการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การควบคุมและการประเมินผล เพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เหมาะสม การบริหารโครงการเป็นลักษณะงานเฉพาะกิจที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

ฤดี นิยมรัตน์ (2559, น. 7) กล่าวว่า การบริหารโครงการเป็นการใช้ความรู้ของผู้บริหารในงานได้แก่ การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การอำนวยการและการควบคุมในการทำกิจกรรมของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดภายใต้ข้อจำกัดของเวลา งบประมาณและลักษณะเฉพาะของผลงาน

มยุรี อนุมานราชธน (2546, น. 1) กล่าวว่า การบริหารโครงการเป็นลักษณะงานเฉพาะกิจช่วยเสริมการบริหารงานหลักหรืองานประจำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งระดับบุคคลและสภาพแวดล้อมของสังคม

ประชุม รอดประเสริฐ (2535, น. 48) กล่าวว่า การบริหารโครงการหมายถึงการกระทำกิจกรรมอย่างตั้งใจ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของกิจกรรมในโครงการที่ต้องใช้กำลังหรือความพยายามในการกระทำ โดยอาศัยบุคคล ทรัพยากร และปัจจัยอื่นหลายปัจจัยเพื่อการดำเนินงาน

จากความหมายต่างๆ ข้างต้น สรุปได้ว่า “การบริหารโครงการ” หมายถึง การจัดการหรือการวางแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นการบริหารโครงการจึงเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะภายใต้ข้อจำกัดของเวลา งบประมาณ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์เครื่องมือ ที่จะช่วยให้โครงการประสบผลสำเร็จ

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2527, น. 3) ให้ความหมายของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คือ ระบบการศึกษานอกโรงเรียนโดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร ด้วยการให้การ

เรียนรู้จากการกระทำด้วยตนเอง โดยมุ่งหวังให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นและเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เจนณรงค์ เทียนสว่าง (2560, น. 19) ให้ความหมายของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คือ การนำความรู้และเทคนิคทางการเกษตรใหม่ๆ ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร รวมทั้งมีการวิเคราะห์หนทางแก้ไขปัญหาทางการเกษตรแล้วติดตามช่วยเหลือ จนกระทั่งมีการปรับปรุงการเกษตรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

คาร์ริด และเชิร์ต (Khalid and Sherzed, 2019, p. 1) ให้ความหมายของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรในชนบท โดยนำความรู้และเทคโนโลยีไปช่วยในการแก้ปัญหาทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ้น

จากความหมายต่างๆ ข้างต้น สรุปได้ว่า “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” หมายถึง กิจกรรมที่กำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหา มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการวางแผนการปฏิบัติงาน มีการจัดคนเข้าทำงาน มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณอย่างเหมะสม ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ ไปช่วยแก้ปัญหาและเมื่อโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วจะต้องเกิดประโยชน์ในเชิงพัฒนาการเกษตรและทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ความหมายการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ได้จากความหมายของคำว่า การบริหารโครงการและการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สรุปได้ว่า

การบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หมายถึง กิจกรรมที่กำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาทางการเกษตรเพื่อตอบสนองนโยบายหรือตามแผนยุทธศาสตร์หรือภารกิจเร่งด่วนขององค์กร ด้วยการจัดการหรือการวางแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด มาใช้ในการดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขของเวลา งบประมาณและปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในเชิงพัฒนาการเกษตรและทำให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ความสำคัญของการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารโครงการ กล่าวคือ การบริหารโครงการที่ดีจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมได้ ดังนั้นการบริหารจึงมีความสำคัญในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ดังที่ กฤษฎา กิตติโสภโณ (2558, น. 28–31) ได้แยกไว้เป็นข้อๆ ดังนี้

1. ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และหน้าที่ต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน (Objectives and functions) ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ซึ่งทำให้เกิดความชัดเจนในการจัดลำดับงาน

2. ทำให้งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเกิดการประสานงาน (Coordination) อย่างต่อเนื่องในแต่ละโครงการโดยมีจุดประสงค์รวมที่แผนหลักของโครงการและเกิดความเข้าใจในงานและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

3. ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency in utilization of resources) ในการจัดสรรทรัพยากรในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการใช้ให้ประหยัดที่สุดเท่าที่จะทำได้

4. ทำให้เกิดผลลัพธ์หรือเกิดประสิทธิผลสูงสุด (Output and effectiveness) ในการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้น วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งก็คือทำให้เกิดประสิทธิผลซึ่งก็คือผลลัพธ์สูงสุดจากการทำงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนมีการป้อนกลับ (Feedback) เมื่อนำโครงการไปใช้ประโยชน์กับบุคคลเป้าหมาย ทั้งนี้ปัญหาและข้อเสนอที่ได้เพื่อนำมาใช้แก้ไขปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปกรณ์ ปรียากร (2557, น. 3-4) อธิบายว่า การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มักมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆ ตลอดเวลาจนทำให้โครงการยุติลงก่อนเวลาที่กำหนด ดังนั้นความสำคัญของการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ (Operations or project management) ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนโครงการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการบริหารโครงการจะต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือไม่สลับซับซ้อนจนเกินไป รวมทั้งในงานทุกประเภท ทำให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์ด้านการบริหารทั่วไป โดยทั่วไปขององค์การทุกประเภท ผู้บริหารมักจะเผชิญกับสถานการณ์ ดังนี้

1.1 ปัญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้นในองค์การอยู่เสมอ มีลักษณะหรือสภาพปัญหาที่สลับซับซ้อนมาก หรือเกิดขึ้นซ้ำๆ จนเป็นผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารงานเพียงหน่วยเดียวไม่อาจที่จะดำเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้

1.2 การเปลี่ยนแปลงความต้องการของเกษตรกรจากความต้องการเดิมไปสู่ความต้องการใหม่ หรือความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จนเป็นผลให้รูปแบบและวิธีการแบบเดิมไม่อาจจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นตรงต่อไป

1.3 ทรัพยากรด้านต่าง ๆ มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น จนเป็นผลให้เกิดข้อจำกัดเกี่ยวกับกรรมวิธีในการจัดสรร การกระจาย และ/หรือการจัดการทรัพยากรที่ดีเพียงพอ ซึ่งถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขย่อมจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดการลดลง

1.4 การใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการบริหารงาน โดยทั่วไปมีการใช้เทคโนโลยีในกิจการมากขึ้น หากไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ย่อมจะเป็นผลให้กิจการมีข้อเสียเปรียบในเชิงเปรียบเทียบกับกิจการอื่น

2. สถานการณ์ด้านการพัฒนาและการแข่งขัน เป็นสถานการณ์เชิงรุกที่กิจการทั้งหลายมักจะใช้ความคิดสร้างสรรค์และการมองการณ์ไกล เพื่อป้องกันปัญหา หรือสร้างโอกาสในการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อรักษาความได้เปรียบหรือพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

2.1 การเพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้อง และความแม่นตรงในการให้บริการเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจในการแก้ปัญหาทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร

2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริการให้มีมาตรฐานสูงกว่า จากการเผชิญกับปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ทำให้ผู้บริหารจำเป็นต้องการเตรียมความพร้อมในกรณีที่จะเผชิญกับภาวะวิกฤต และความเสี่ยงทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ ถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก การบริหารโครงการจึงช่วยลดโอกาสความสูญเสียลงถ้าหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นจริง ดังนั้น นักบริหารทุกคนควรที่จะเตรียม “คิดและทำงานเป็นโครงการ (Projectization)” ไว้ล่วงหน้า ซึ่งหมายความว่า นักบริหารควรวางแผนและบริหารโครงการประเภทต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้เป็นกลวิธีในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่จะมีโอกาสเกิดขึ้น

สรุปได้ว่า ความสำคัญของการบริหารโครงการ เป็นวิธีการจัดการเพื่อป้องกันหรือใช้แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ รวมถึงช่วยตรวจสอบผลการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามแผนงานและทรัพยากรโครงการให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยสรุป โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาทางการเกษตรภายใต้นโยบาย ยุทธศาสตร์หรือปัญหาเร่งด่วนขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ การวางแผน การปฏิบัติงาน การแบ่งคนทำกิจกรรม รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาทางการเกษตรให้กับเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ การบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมีความสำคัญโดยช่วยให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์จากการวางแผนการทำงานภายในองค์กร รวมถึงมีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาใช้แก้ไขปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น

กิจกรรม 9.1.1

จงอธิบายความหมายของการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มาพอสังเขป


แนวตอบกิจกรรม 9.1.1

การบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หมายถึง กิจกรรมที่กำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาทางการเกษตรเพื่อตอบสนองนโยบายหรือตามแผนยุทธศาสตร์หรือภารกิจเร่งด่วนขององค์กร ด้วยการจัดการหรือการวางแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด มาใช้ในการดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขของเวลา งบประมาณ และปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในเชิงพัฒนาการเกษตรและทำให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เรื่องที่ 9.1.2
กระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โครงการมีลักษณะที่สำคัญประการหนึ่ง คือ มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน โดยแต่ละขั้นตอนของโครงการจะต้องนำการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมาใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดทำโครงการเป็นความสัมพันธ์ของกระบวนการในการดำเนินโครงการตั้งแต่การเริ่มความคิดที่จะดำเนินโครงการจนถึงการเสร็จสิ้นโครงการ

ทั้งนี้ กระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนการบริหารโครงการมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่การริเริ่มโครงการจนกระทั่งการยุติโครงการ ซึ่งขั้นตอนการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมีลักษณะเป็นวงจรการบริหารโครงการ (Project life cycle) (ฤดี นิยมรัตน์, 2559, น. 11-12) ซึ่งพิจารณาได้จากวัฏจักรของโครงการจะช่วยให้เห็นภาพรวมของภาระงานที่จะต้องมีการดำเนินงานภายใต้โครงการนั้น โดยขั้นตอนการบริหารโครงการแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ที่มีความสัมพันธ์เป็นวงจรการบริหารโครงการ คือ

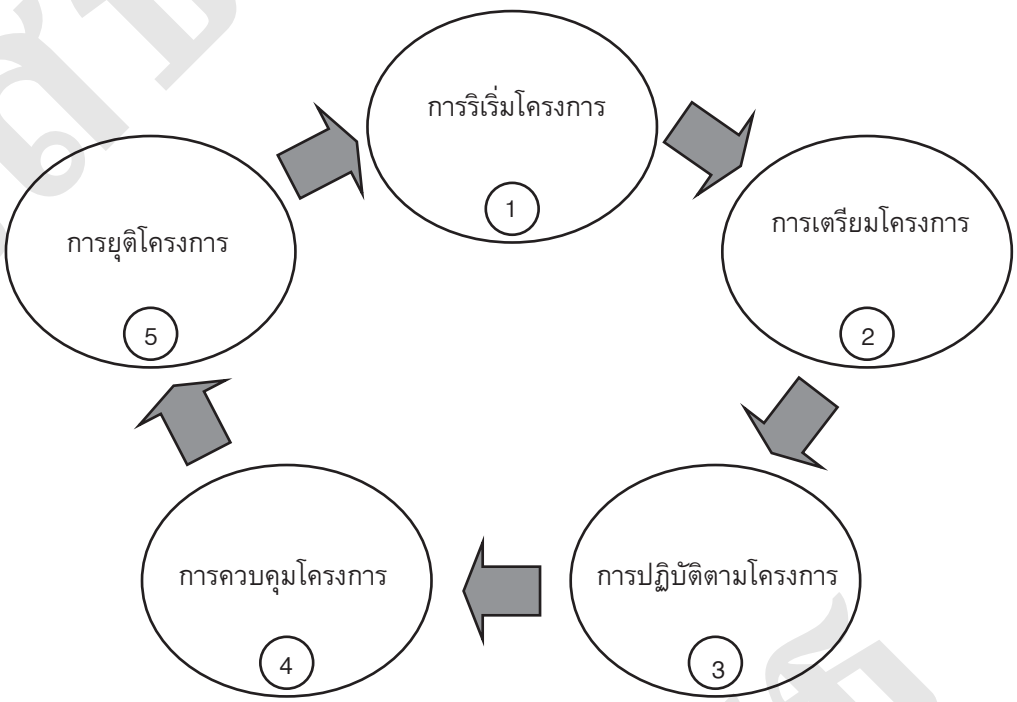

ภาพที่ 9.1 กระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การริเริ่มโครงการ (Project initiation)

การริเริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตของโครงการจากการวิเคราะห์ปัญหาหรือโอกาสที่มีอยู่ การศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อกำหนดเป็นโครงการรวมถึงข้อกำหนดข้อตกลงโครงการ (Term of reference) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตและโครงสร้างของโครงการ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อขั้นตอนการเตรียมโครงการต่อไป

การกำหนดหัวข้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนอกจากความต้องการแก้ปัญหาทางการเกษตรที่กำลังประสบปัญหาให้มีสภาพที่ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถกำหนดหัวข้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจากที่มาของการจัดทำโครงการได้ 3 ลักษณะ คือ

1. การจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่มาจากนโยบายภาครัฐ (Poblic policy projects) ซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางกิจกรรมซึ่งรัฐบาลได้ทำการตัดสินใจและกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อชี้นำให้มีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐมีทั้งโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาว โดยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะเน้นการแก้ปัญหาทางด้านผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการแก้ไขปัญหาการทำกินภาคการเกษตร สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาคเอกชนมาจากความคิดในการขยายผลทางธุรกิจของผู้ประกอบการหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น โดยทั่วไปที่มาของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่มาจากนโยบายของภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน เป็นผลมาจากความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง หรือการแก้ไขปัญหา หรือความต้องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพขึ้น ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

2. การจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ (Stategic plan) เป็นโครงการที่มีทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Coporate goal) โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์นั้นถูกกำหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์การที่ได้ทำงานร่วมกัน ทั้งนี้องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการใช้กำหนดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น 1) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ 3) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นโครงการภายใต้การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

3. การจัดทำโครงการตามภารกิจเร่งด่วน เป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน หากไม่สามารถดำเนินการจะทำให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรหรือเกิดผลเสียหายทางการเกษตรเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นต้องรีบดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวอย่างโครงการเช่น โครงการขุดสระน้ำแก้ภัยแล้งปี 2564 โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการพักหนี้เกษตรกร เป็นต้น

การจัดเตรียมโครงการ (Project preparation)

เมื่อกำหนดขอบเขตของโครงการได้ชัดเจนแล้วจะเข้าสู่การกำหนดรายละเอียดในขั้นตอนการวางแผนโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงร่างหรือข้อเสนอโครงการ (Project proposal) และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Peasibility study) พร้อมทั้งออกแบบโครงการ (Detailed design) ซึ่งจะรู้ว่าใครจะทำอะไร ทำเมื่อไหร่และทำอย่างไร มีแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ชัดเจน โดยการเตรียมโครงการจะประกอบไปด้วยภารกิจหลัก 3 ประการ คือ

1. การกำหนดโครงร่างโครงการ คือ การกำหนดวัตถุประสงค์และทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการ

2. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ คือ การศึกษาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความมีเหตุมีผล และความคุ้มค่าของโครงการว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นไปได้จริง และให้ผลลัพธ์ออกมาคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

3. การจัดทำรายงานโครงการ คือ การสรุปผลการวิเคราะห์ในขั้นเตรียมโครงการเพื่อใช้เป็นร่างนำเสนอโครงการในขั้นตอนการประเมินและการอนุมัติโครงการต่อไป

การปฏิบัติตามโครงการ (Project implementation)

โครงการที่ผ่านการจัดเตรียมโครงการแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำโครงการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงเกี่ยวข้องกับการเตรียมโครงการให้เหมาะสม มีการควบคุมและคิดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา อยู่ภายใต้งบประมาณและได้ผลงานตามที่ได้กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ ขั้นตอนการนำโครงการไปปฏิบัติอาจจะเกิดปัญหาที่คาดไม่ถึงแม้ว่าจะมีการจัดเตรียมโครงการอย่างรอบคอบแล้ว ดังนั้นความยืดหยุ่นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติตามโครงการ ทั้งนี้เพื่อสามารถทำให้การดำเนินงานของโครงการประสบความสำเร็จลุล่วงได้

การปฏิบัติตามโครงการนับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนการดำเนินงานหรือกลไกที่สำคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้น การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะนำแผนงานโครงการต่างๆ ไปดำเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติงานของตนเอง อีกทั้งจะต้องมีการระดมสรรพกำลัง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรที่วางไว้ ทั้งนี้การนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางโดยสังเขปดังนี้

การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ด้วยการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจทิศทางการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าประสงค์ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1) การให้ความสำคัญกับโครงการ ผู้บริหารโครงการต้องให้ความสำคัญ มีความเข้าใจและผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

2) สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้านแรงงานที่มีในพื้นที่ ได้ทราบเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของโครงการถึงนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์องค์กร เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

การควบคุมโครงการ

ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. การติดตามโครงการ (Project monitoring) เป็นการตรวจสอบและติดตามผลของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่สำคัญได้แก่ การติดตามความก้าวหน้า การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ปรากฏจริงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง การวิเคราะห์ผลกระทบ และการปรับปรุงโครงการ

2. การประเมินผลโครงการ (Project evaluation) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์โดยรวมของโครงการหรือแผนงาน เพื่อการปรับปรุงโครงการหรือตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ (ยุติหรือยุบเลิกโครงการ หรือขยายโครงการ)

การยุติโครงการ (Project termination)

เป็นขั้นตอนที่การดำเนินการของโครงการสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือต้องยุติโครงการลงก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่กำหนดอันเนื่องมาจากสาเหตุของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้จัดการโครงการจะทำรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ (Project Decision-Maker) เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานโครงการว่าประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดการปฏิบัติงานสำหรับโครงการ

สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การริเริ่มโครงการ การเตรียมโครงการ การปฏิบัติตามโครงการ การควบคุมโครงการ และการยุติโครงการ ซึ่งนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

กิจกรรม 9.1.2

กระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรประกอบด้วยกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 9.1.2

กระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

1. การริเริ่มโครงการ (Project initiation) เป็นการเริ่มต้นการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2. การเตรียมโครงการ (Project preparation) เป็นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในโครงการ

3. การปฏิบัติตามโครงการ (Project implementation) การดำเนินการตามแผนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่กำหนดไว้หรือนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ

4. การควบคุมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย

4.1 การติดตามโครงการ (Project monitoring) เป็นการตรวจสอบและติดตามผลของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

4.2 การประเมินโครงการ (Project evaluation) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์โดยรวมของโครงการ

5. การยุติโครงการ (Project termination) เป็นขั้นตอนที่การดำเนินการของโครงการสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือต้องยุติโครงการลงก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่กำหนดอันเนื่องมาจากสาเหตุของปัจจัยต่างๆ

ตอนที่ 9.2
กระบวนการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง

9.2.1 การริเริ่มและการเตรียมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

9.2.2 การเขียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

แนวคิด

1. การริเริ่มและการเตรียมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นขั้นการเตรียมความสมบูรณ์ของร่างโครงการ สำหรับนำไปสู่การนำเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ การเริ่มโครงการควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility study) ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในขั้นการเตรียมการจัดทำโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 8 ขั้นตอน คือ 1) การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ 2) การวิเคราะห์ปัญหาจากการวินิจฉัยสภาพทั่วไปของเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมาย 3) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ 4) การพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ 5) การคิดค้นและแสวงหาทางเลือกว่าควรมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร 6) การวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า และโอกาสประสบผลสำเร็จโครงการ 7) การเสนอโครงการต่อผู้อนุมัติโครงการ และ 8) การปรับปรุงแก้ไขและจัดทำรายงานการสรุปผลการวิเคราะห์โครงการ
2. โครงการเมื่อผ่านขั้นการเตรียมการแล้วจะถูกนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารองค์กรด้วยการเขียนโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1) การเขียนในรูปแบบประเพณีนิยม (conventional method) เป็นการเขียนโครงการที่มีรูปแบบการเขียนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย มีเนื้อหาสาระของโครงการที่มีลักษณะเป็นหัวข้อโครงการสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่หัวข้อแรกจนถึงหัวข้อสุดท้าย และ 2) การจัดทำโครงการในรูปตารางเหตุผลสัมพันธ์ (logical framework) เป็นการเขียนโครงการที่ใช้วิธีอธิบายเหตุผลโดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับจุดมุ่งหมายของแผนงานในเชิงเหตุและผลที่ประสานกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 9.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายการริเริ่มและการเตรียมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
2. อธิบายการเขียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้

เรื่องที่ 9.2.1
การริเริ่มและการเตรียมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีลักษณะของความไม่แน่นอนสูง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร ชุมชน ทรัพยากร ปัจจัยผลิตทางการเกษตร และงบประมาณโครงการ ปัจจัยดังกล่าวมีผลทำให้โครงการมีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวได้มาก ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นหมายถึงการสูญเสียเงิน เวลาและทรัพยากรไปกับโครงการ ดังนั้นองค์กรจึงมีการบริหารโครงการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการล้มเหลวของโครงการ การบริหารโครงการเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ ทั้งนี้จึงควรศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility study) ก่อนการเริ่มโครงการเพื่อป้องกันผลเสียที่อาจกระทบต่อความสำเร็จของโครงการได้

การริเริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ก่อนการเริ่มโครงการควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility study) ได้แก่ ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลเสียที่อาจกระทบต่อความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากความเสี่ยงได้ และช่วยให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีรายละเอียดดังนี้

1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วย

1.1 ความเป็นไปได้ด้านระบบการจัดการ ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ว่าโครงการสนองต่อความต้องการหรือใช้แก้ไขปัญหาภาคการเกษตรได้หรือไม่ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้จากปัจจัยภายในของบุคลากร ด้านความรู้ ความสามารถประสบการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและทักษะการจัดการทีมงาน

1.2 ความเป็นไปได้ด้านเวลาการดำเนินโครงการ ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ว่าโครงการสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ระยะเวลาได้เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กำหนดภายใต้งบประมาณของโครงการที่ได้รับหรือไม่

1.3 ความเป็นไปได้ด้านค่าใช้จ่าย ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้จากการประเมินงบประมาณตลอดโครงการว่าใช้จ่ายเพียงใด มีความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของงบประมาณต่อกิจกรรมภายใต้โครงการหรือไม่

1.4 ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้กรณีบุคลากรภายในโครงการไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการได้

2. การตัดสินใจการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ใน 3 ระดับ คือ

2.1 การตัดสินใจทางกลยุทธ์ (Strategic decisions) ว่าสามารถดำเนินโครงการได้ถูกต้องหรือไม่ จะดำเนินโครงการอะไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ใช้งบประมาณการลงทุนเพียงพอและมีโอกาสลดขนาดของโครงการลงหรือไม่ รวมทั้งโครงการที่จะดำเนินการสอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์องค์กร หรือใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรได้หรือไม่ เป็นต้น

2.2 การตัดสินใจโครงการ (Project decision) ทำให้ทราบว่าความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของโครงการคืออะไร การดำเนินโครงการจะประสบความสำเร็จตามงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ จะตรวจสอบและจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

2.3 การตัดสินใจด้านกระบวนการ (Plan or process decisions) ทำให้ทราบปัญหาจากการดำเนินการแต่ละกิจกรรมมีอะไรบ้าง

3. ประโยชน์ของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ประโยชน์ของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยช่วยให้ทราบก่อนการทำโครงการ มีดังนี้

3.1 สามารถเสริมสร้างความเข้าใจโครงการ และสามารถจัดทำแผนที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นโดยเฉพาะงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการ

3.2 เพิ่มพูนความเข้าใจการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดกับโครงการหากจัดการกับปัญหาอย่างไม่เหมาะสมหรือละเลยกับปัญหาของโครงการนั้น

3.3 ทำให้โครงการได้รับการยอมรับได้มากขึ้น เนื่องจากผ่านการศึกษาว่ามีความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว

สรุป การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ประกอบด้วย ความเป็นไปได้การจัดการด้านเวลาดำเนินการ ด้านค่าใช้จ่ายและด้านเทคนิค ซึ่งจะมีประโยชน์ในการจัดทำแผนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข รวมทั้งทำให้โครงการได้รับการยอมรับมากขึ้น

การเตรียมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเมื่อผ่านกระบวนการริเริ่มโครงการแล้ว จะเข้าสู่การเตรียมโครงการ ซึ่งเป็นการเตรียมความสมบูรณ์ของร่างโครงการสำหรับนำไปสู่การประเมินและอนุมัติโครงการ ปกรณ์ ปรียากร (2557, น. 20–21) อธิบายว่าโดยทั่วไปการเตรียมการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 8 ขั้นตอน คือ

1. การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าโครงการที่ต้องการจัดทำขึ้นต้องการให้สนองต่อนโยบายหรือมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือเพื่อใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์เร่งด่วน ซึ่งผลลัพธ์ในขั้นตอนนี้ คือ การรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการต่างๆ

2. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ จากการวินิจฉัยสภาพทั่วไปของเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมาย ความต้องการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และทรัพยากรบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งปัญหาที่ผู้นำหรือเกษตรกรกำลังประสบปัญหาทางการเกษตรในสถานการณ์เร่งด่วน หรือเป็นปัญหาที่เกิดผลกระทบเสียหายต่อภาคการเกษตรเป็นวงกว้าง ควรจัดทำหรือรีบนำเสนอโครงการดังกล่าวต่อผู้อนุมัติโครงการพิจารณาก่อน

3. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คือสภาพผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดพร้อมให้ตรงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยผลโครงการจะดำเนินการทั้งปริมาณ คุณภาพและเวลา รวมทั้งข้อมูลที่ทำให้เกิดประโยชน์ในการวัดผลสำเร็จของโครงการ


4. การพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยการให้ที่ปรึกษาโครงการหรือผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการ ผลการปรึกษาหารืออาจนำไปสู่การยกเลิก หรือปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดวิธีดำเนินโครงการต่อไป

5. การคิดค้นและแสวงหาทางเลือก โดยพิจารณาว่าสาเหตุต่างๆ ที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วควรมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร รวมทั้งหาทางเลือก โดยตั้งคำถามตั้งแต่จะทำโครงการทำไม (Why) ทำอะไร (What) ทำเมื่อไหร่ (When) ทำที่ไหน (Where) ทำโดยใคร (Who) ทำเพื่อใคร ทำอย่างไร (How) ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ (How much) เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สำหรับการออกแบบโครงการที่เหมาะสม

6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของทางเลือกต่าง ๆ ด้วยการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการว่ามีเหตุผล มีความคุ้มค่า มีโอกาสประสบผลสำเร็จ มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการและให้ผลลัพธ์คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

7. การเสนอข้อพิจารณา การนำข้อมูลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมเสนอต่อผู้อนุมัติโครงการ เพื่อเสนอข้อพิจารณาว่าโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย หรือแผนยุทธศาสตร์หรือภารกิจเร่งด่วนและได้มีการออกแบบโครงการในรูปแบบใดหรือแนวทางใด

8. การจัดทำข้อเสนอโครงการ ด้วยการแก้ไขโครงการตามที่ผู้อนุมัติโครงการแนะนำ รวมทั้งจัดทำรายงานการสรุปผลการวิเคราะห์ในขั้นเตรียมโครงการเพื่อใช้เป็นร่างนำเสนอโครงการในขั้นตอนการประเมินและการอนุมัติโครงการ

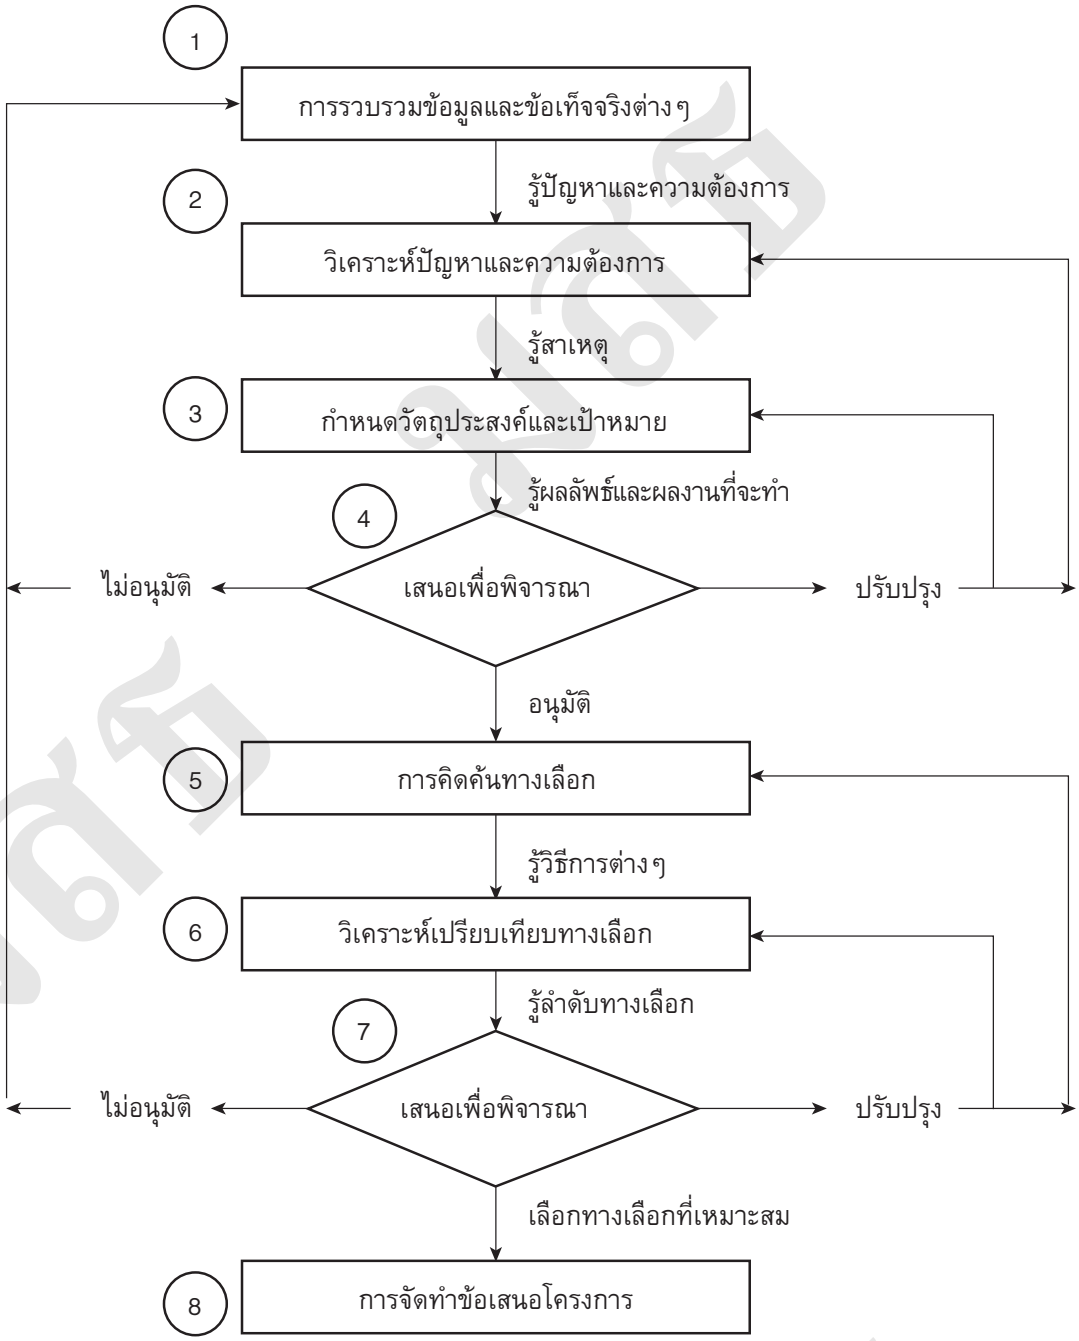

ภาพที่ 9.2 ขั้นตอนการเตรียมการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สรุปได้ว่า การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้วยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ จะช่วยป้องกันผลที่อาจกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ แล้วจะเข้าสู่การเตรียมการจัดทำโครงการซึ่งประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 8 ขั้นตอน คือ 1) การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ 2) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 3) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 4) การพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5) การคิดค้นและแสวงหาทางเลือก 6) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของทางเลือกต่างๆ 7) การเสนอข้อพิจารณา และ 8) การจัดทำข้อเสนอโครงการ

กิจกรรม 9.2.1

การเตรียมการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรประกอบด้วยกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 9.2.1

การเตรียมการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ 2) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 3) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 4) การพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5) การคิดค้นและแสวงหาทางเลือก 6) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของทางเลือกต่างๆ 7) การเสนอข้อพิจารณา และ 8) การจัดทำข้อเสนอโครงการ

เรื่องที่ 9.2.2
การเขียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การเขียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดเตรียมโครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงร่างหรือข้อเสนอโครงการ (Project proposal) และการออกแบบโครงการ (Detailed design) ทั้งนี้การเขียนโครงการเป็นการบอกให้ทราบว่าใครจะทำอะไร ทำเมื่อไหร่ ทำอย่างไร มีแผนการดำเนินงานและงบประมาณอย่างไร โดยการเขียนโครงการเป็นขั้นตอนการนำเสนอโครงการใน 2 รูปแบบ คือ การจัดทำโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional method) และในรูปตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical framework) ดังนี้

การจัดทำโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional method)

การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม เป็นรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมานาน จะมีเนื้อหาสาระที่ละเอียดชัดเจนเฉพาะเจาะจง ช่วยในการปรับแก้ไขจุดอ่อนหรือในลักษณะของโครงการบางโครงการ ผู้เขียนโครงการอาจจะเป็นคนละคนกับผู้ดำเนินงานตามโครงการหรืออาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดและชนิดของโครงการ ลักษณะของโครงการและอื่นๆ เป็นต้น การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม ปกรณ์ ปรียากร (2557, น. 41-42) อธิบายว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

1. **ชื่อโครงการ** (ระบุชื่อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)
2. **หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ** (ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเสนอ อนุมัติและจัดการโครงการ)
   ปีงบประมาณ .....
   เป็นโครงการตามแผน (ระบุชื่อแผนงานอันเป็นที่มาของโครงการ)
3. **หลักการและเหตุผล**
   - ระบุความเป็นมาของโครงการ
   - ระบุสภาพหรือสถานการณ์ปัจจุบัน
   - ระบุสภาพปัญหาหรือความต้องการ รวมทั้งสาเหตุต่างๆ
   - ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในโครงการนี้
   - ระบุข้อจำกัดหากไม่มีโครงการนี้
   - ระบุความสำคัญของโครงการที่จะมีต่อนโยบาย
4. **วัตถุประสงค์และเป้าหมาย**
   - ระบุผลลัพธ์ที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จโครงการ (ทำโครงการนี้แล้วผลตอบแทนที่ได้รับคืออะไร)
5. **ระยะเวลาในการดำเนินการ**
   - ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
6. **วิธีดำเนินการ**
   - ระบุกิจกรรมโครงการทั้งหมด
   - ระบุขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม
   - ระบุเทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติการ
7. **แผนปฏิบัติงาน**
   - ระบุแผนปฏิบัติงานและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. **งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้**
   - ระบุค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่ต้องใช้ของโครงการตามหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย ตามระเบียบการจัดทำงบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- ระบุชื่อบุคคลหรือคณะทำงานที่รับผิดชอบในการจัดการโครงการ
- ระบุรูปแบบขององค์กรโครงการ

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ

- ระบุวิธีการ เกณฑ์วัดและระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ
- ระบุเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผล

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ระบุผลประโยชน์ที่กลุ่มบุคคลหรือพื้นที่หรือสังคมโดยรวมจะได้รับ
- ระบุผลกระทบในด้านบวกที่จะตามมาจากการมีโครงการ

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอโครงการ
(.....)
ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติโครงการ
(.....)

รูปแบบหรือหัวข้อในการเขียนโครงการข้างต้น อาจจะมีหัวข้อและรายละเอียดแตกต่างกันไปตามลักษณะหรือประเภทของโครงการ บางโครงการมีรายละเอียดมาก บางโครงการมีรายละเอียดน้อย บางโครงการอาจต้องเพิ่มเติมหัวข้อที่มีความสำคัญเข้าไป เช่น โครงการทางด้านวิชาการอาจต้องมีการเพิ่มหัวข้อเอกสารอ้างอิง เป็นต้น ทั้งนี้แล้วแต่ผู้เขียนโครงการจะจัดทำขึ้นหรือยึดถือโดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านโครงการหรือผู้ปฏิบัติตามโครงการมีความชัดเจนและเข้าใจโดยง่ายที่สุด เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของรูปแบบหรือโครงสร้างในการเขียนโครงการโดยละเอียด รูปแบบในการเขียนโครงการ ดังนี้

1. ชื่อโครงการ การตั้งชื่อโครงการต้องสื่อความชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย โดยชื่อโครงการจะบอกได้ว่าจะทำสิ่งใดบ้าง โครงการจัดทำที่ใดและทำขึ้นเพื่ออะไร ชื่อโครงการโดยทั่วไปควรจะต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุ่งหมายของโครงการ นอกจากนี้การเขียนโครงการบางโครงการอาจระบุชื่อแผนงานไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเป็นการแสดงให้เห็นว่าโครงการที่กำหนดขึ้นอยู่ในแผนงานอะไร จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนงานนั้นได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด การระบุระดับแผนงานทำให้มองเห็นภาพในมุมกว้างมากขึ้น บางกรณีการตั้งชื่อโครงการอาจต้องพิจารณาแหล่งทุนประกอบด้วย เช่น แหล่งทุนให้งบประมาณในโครงการที่เกี่ยวข้องพิจารณาตั้งชื่อโครงการจึงจะสนับสนุนให้ทุนการดำเนินโครงการ ตัวอย่างการตั้งชื่อโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์เพื่อสร้างอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ การเขียนโครงการต้องระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการนั้นๆ ควรระบุหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการโดยตรงและระบุหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติโครงการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการติดตามและประเมินผลโครงการในกรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยการเขียนหลายหน่วยก็ต้องระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด

3. หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลเป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึงปัญหาความจำเป็นหรือความต้องการที่ต้องการจัดทำโครงการขึ้น โดยแสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือสนองความต้องการขององค์กร ชุมชน หรือท้องถิ่นนั้นๆ พร้อมทั้งระบุเหตุผลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการอย่างชัดเจน รวมทั้งโครงการที่จัดทำขึ้นมีส่วนเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบายขององค์กร และช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนได้ การเขียนหลักการและเหตุผล ผู้เขียนโครงการต้องพยายามหาเหตุผล หลักการและทฤษฎีต่างๆ สนับสนุนโครงการที่จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจหน้าที่เห็นชอบและอนุมัติโครงการที่นำเสนอให้ดำเนินการได้พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและปัจจัยสนับสนุนต่างๆ

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โครงการทุกโครงการต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการ วัตถุประสงค์เป็นความต้องการปฏิบัติภายในโครงการให้ปรากฏเป็นรูปธรรม การเขียนวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ โครงการสามารถมีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ข้อ ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่วัตถุประสงค์ก็จะมีลักษณะที่กว้างเป็นลักษณะวัตถุประสงค์ทั่วไป หากเป็นโครงการขนาดเล็กวัตถุประสงค์ก็จะมีลักษณะเฉพาะหรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าวัตถุประสงค์เฉพาะ การเขียนวัตถุประสงค์ควรจะต้องคำนึงถึงลักษณะ 5 ประการ ของ SMART โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวสามารถอธิบายความหมายไว้ ดังนี้

S = Sensible (เป็นไปได้) หมายถึง วัตถุประสงค์จะต้องมีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการ

M = Measurable (วัดได้) หมายถึง วัตถุประสงค์จะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้

A = Attainable (ระบุสิ่งที่ต้องการ) หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ระบุสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด

R = Reasonable (ระบุสิ่งที่ต้องการ) หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด

T = Time (เวลา) หมายถึง วัตถุประสงค์ที่มีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน

การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์มักขึ้นต้นด้วยคำว่า “เพื่อ” เช่น การส่งเสริมการผลิตทุเรียนอินทรีย์เพื่อการส่งออก

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเป็นการกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งถึงเวลาสิ้นสุดโครงการว่าใช้เวลาเท่าใด โดยเริ่มด้วยการระบุวันเดือนปีที่เริ่มทำและสิ้นสุด ถ้าหากเป็นโครงการระยะยาวและมีหลายรายต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละระยะของโครงการด้วย ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ

6. วิธีดำเนินการ เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเป็นขั้นตอนตามลำดับก่อนหลัง เพื่อใช้ปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีดำเนินการจึงควรนำวัตถุประสงค์มาแยกเป็นกิจกรรมย่อยโดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการว่ามีกิจกรรมใดที่จะต้องทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะนำไปอธิบายโดยละเอียดในส่วนของแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงานอีกครั้ง

7. แผนปฏิบัติงาน โครงการสามารถลงมือปฏิบัติงานได้ โดยจะเขียนรายละเอียดแต่ละงานที่ต้องทำ มีใครเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง จะทำการเขียนแผนปฏิบัติงานเป็นการนำเอาขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงานมาแจกแจงรายละเอียดให้ผู้นำเมื่อใด และมีวิธีการการทำอย่างไร ซึ่งในการเขียนแผนการปฏิบัติงานนิยมทำเป็นตารางปฏิบัติเพื่อให้แผนปฏิบัติงานสามารถควบคุมดูแลได้ง่าย

8. งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ เป็นการระบุถึงจำนวนเงิน จำนวนบุคคล จำนวนวัสดุ-ครุภัณฑ์ และปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการนั้นๆ การเสนองบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการนั้นควรคำนึงถึงหลักสำคัญ 4 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่

8.1 ความประหยัด (Economy) โดยทั่วไปต้องคำนึงถึงความประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้คุณภาพของผลงานดีที่สุด

8.2 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โครงการจะต้องมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและบุคคลเป้าหมายมีความพึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้น

8.3 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการที่มีประสิทธิผลต้องดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งหากได้ผลตามวัตถุประสงค์จะถือว่าโครงการมีประสิทธิผล

8.4 ความเสมอภาค (Equity) การใช้จ่ายทรัพยากรในโครงการจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องคล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นธรรมสอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ การเขียนโครงการต้องระบุผู้รับผิดชอบโครงการให้ชัดเจนว่าเป็นใคร มีตำแหน่งใดในโครงการนั้นๆ ควรระบุตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบจริงในโครงการก็จะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งควรเรียงลำดับชื่อผู้รับผิดชอบจากหัวหน้าโครงการเป็นลำดับแรกและผู้ดำเนินโครงการไล่เรียงแต่ละท่านไปจนถึงลำดับสุดท้าย

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ แสดงถึงการควบคุมกำกับดูแลโครงการให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการควรระบุวิธีการควบคุมและประเมินผลให้ชัดเจน รวมทั้งระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินโครงการพร้อมทั้งบอกรูปแบบการประเมินโครงการ เช่น ประเมินก่อน ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการ และระบุเวลาการประเมิน เช่น ทุกๆ 3 เดือน

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ส่วนนี้จะเป็นการบอกถึงว่าเมื่อโครงการที่ทำสิ้นสุดลงจะมีผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบนั้นได้รับในลักษณะอย่างไร ทั้งในปริมาณและคุณภาพ

นอกจากนี้การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมยังมีส่วนประกอบอื่นๆ อีก เช่น หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ผู้เสนอร่างโครงการและเอกสารอ้างอิงตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของโครงการในการนำเสนอ เป็นต้น

การจัดทำโครงการในรูปตารางเหตุสัมพันธ์ (Logical framework)

การจัดทำโครงการในรูปตารางเหตุสัมพันธ์ (Logical framework) เป็นวิธีอธิบายเหตุผลโดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับจุดมุ่งหมายของแผนงานในเชิงเหตุและผลที่ประสานกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน การจัดทำโครงการในรูปตารางเหตุสัมพันธ์ สมพิศ สุขแสน (ม.ป.ป.) อธิบายว่า การจัดทำโครงการในรูปตารางเหตุสัมพันธ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. สาระสำคัญ/คำสรุป (NS = Narrative Summary) คือ การชี้ให้เห็นว่าโครงการจะดำเนินไปได้ต้องมีรายละเอียดสรุปเป็นข้อๆ และในสาระที่สรุปควรตรวจนับได้ในเชิงปริมาณ หัวข้อต่างๆ จะปรากฏในองค์ประกอบแนวตั้ง คือ จุดมุ่งหมายของแผน วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลงานหรือผลผลิตของโครงการ กิจกรรมของโครงการ และปัจจัยหรือทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (OVI หรือ KPI = Objectively Verifiable Indicators หรือ Key Performance Indicators) คือ การชี้ให้เห็นว่ารายการในแต่ละแถวในคอลัมน์ที่ 1 (NS) มีตัวชี้วัดความสำเร็จกำกับอยู่ด้วย เช่น ตัวชี้วัดความสำเร็จของจุดมุ่งหมายของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมและทรัพยากรในโครงการ

3. แหล่งข้อมูลหรือวิธีพิสูจน์ความสำเร็จ (MOV = Means of Verification) คือ การชี้ให้เห็นว่ารายการในแต่ละแถวในคอลัมน์ที่ 3 มีวิธีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลอยู่ด้วย โดยแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ความสำเร็จดังกล่าวจะมีวิธีการตรวจวัดได้อย่างไร หรือระบุแหล่งที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว

4. เงื่อนไขสำคัญของความสำเร็จ (IA = Important Assumption) คือ การชี้ให้เห็นว่ารายการแต่ละแถวในคอลัมน์ที่ 4 มีวิธีพิจารณาเงื่อนไขแห่งความสำเร็จที่สำคัญของรายการต่างๆ เช่น เงื่อนไขสำคัญแห่งความสำเร็จของจุดมุ่งหมายของแผน เงื่อนไขสำคัญแห่งความสำเร็จของวัตถุประสงค์โครงการ เงื่อนไขสำคัญแห่งความสำเร็จของผลงานหรือผลผลิตของโครงการ

เมื่อนำองค์ประกอบแนวตั้งและแนวนอนของ Log frame มาบรรจุในตาราง 5 × 4 จะได้คำอธิบายในเชิงเหตุและผล (Logic) พอสรุปได้ดังตารางที่ 9.1

ตารางที่ 9.1 สรุปสาระในแต่ละช่องของ Log frame

สาระสำคัญโดยสรุป (Narrative Summary: NS)	**ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Objectively Verifiable Indicator: OVI)**	**แหล่งข้อมูลและวิธีพิสูจน์ (Means Of Verification: MOV)**	**เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ (Important Assumption: IA)**
จุดมุ่งหมายของแผน (Program goal) กำหนดเป็นข้อๆ	ตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึงความสำเร็จตามจุดหมายของแผน หรือแผนงาน	แหล่งข้อมูลที่จะวัดได้ถึงการบรรลุความสำเร็จของแผนหรือแผนงาน	เงื่อนไขที่จะช่วยให้จุดมุ่งหมายของแผนบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์ (Purpose) ของโครงการ นำวัตถุ-ประสงค์มาแตกเป็นข้อๆ	ตัวชี้วัดที่จะวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เมื่อโครงการสิ้นสุด	แหล่งข้อมูลที่จะวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์	เงื่อนไขที่จะช่วยให้วัตถุ-ประสงค์ของโครงการบรรลุผลสำเร็จ
ผลงาน (Outputs) หรือผลผลิตของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานหรือผลผลิตเพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์	แหล่งข้อมูลที่จะตรวจวัดผลผลิตหรือผลงาน	ข้อสมมติฐานสำคัญที่ผลงานจะบรรลุตาม Purpose ที่วางไว้
กิจกรรม (Activities) ที่จะดำเนินงานตามโครงการ	- รายละเอียดปัจจัยแต่ละตัวที่ต้องใช้ทำกิจกรรม - ระบุกิจกรรมที่จะต้องทำว่ามีอะไรบ้าง - ระบุช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม	แหล่งแสดงรายการที่ยืนยันว่าได้มีการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดจริง	เงื่อนไขจากปัจจัยภายนอกที่จะทำให้เกิดกิจกรรมของโครงการ
ปัจจัยนำเข้า (Input) หรือทรัพยากร (Resources) ในโครงการ	ระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ใช้จริง	แหล่งข้อมูลที่แสดงรายการการใช้ทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมจริง	ข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพยากรในการดำเนินโครงการ

ตัวอย่างการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Log frame) (โครงการสมมติ)

ชื่อโครงการ: โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ประยุกต์จาก สมพิศ สุขแสน, ม.ป.ป.)

	สาระสำคัญโดยสรุป (NS)	**ตัวชี้วัดความสำเร็จ (OVI)**	**แหล่งข้อมูลและวิธีพิสูจน์ (MOV)**	**เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ (IA)**
จุดมุ่งหมายของแผน (Goal)	ผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น	จำนวนบัณฑิตที่ทำงานในท้องถิ่นร้อยละ 60	การสำรวจจากหน่วยงาน/สถานประกอบการ	หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือชุมชนมีตำแหน่ง-งานรองรับ
วัตถุประสงค์ (Purpose)	1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบริหารจัดการ 2. เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 3. เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีความรู้คู่คุณธรรมตรงตามความต้องการของท้องถิ่น	- จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 90 - จำนวนบัญทิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 - ระดับความพึงพอใจของนายจ้างอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก	การสำรวจข้อมูลจากหน่วยงาน/สถาน-ประกอบการโดยใช้แบบสอบถาม	- นโยบายการจัดการศึกษาของสถาบันมีความต่อเนื่อง - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลงาน (Output)	บัณฑิตสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีคุณภาพ	- จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี GPA ไม่น้อยกว่า 2.5 - บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 60	- การประมวลผลการเรียนของฝ่ายทะเบียนวัดผล - ข้อมูลจากบัณฑิตและสถานประกอบการ	- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน - การเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในภาวะปกติ

ตาราง (ต่อ)

	สาระสำคัญโดยสรุป (NS)	**ตัวชี้วัดความสำเร็จ (OVI)**	**แหล่งข้อมูลและวิธีพิสูจน์ (MOV)**	**เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ (IA)**
กิจกรรม (Activities)	- พัฒนาหลักสูตร - จัดกิจกรรมการสอน - พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - พัฒนาเอกสารตำรา - พัฒนาอาจารย์ - บริการทางวิชาการ/วิจัย - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	สิ้นปี พ.ศ. 2565 - มีหลักสูตรปรับปรุงใหม่ - มีกิจกรรมภาคเรียนละ 2 ครั้ง - มีสื่อฯ บนอินเทอร์เน็ต - มีเอกสารตำราไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา - มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น - มีผลงานวิจัยปีละ 1 เรื่อง - นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ผ่านร้อยละ 100	- ตรวจสอบผลงานจากสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ - สอบถามนักศึกษา - ตรวจสอบจำนวนสื่อฯ - ตรวจสอบเอกสารตำรา - สำรวจข้อมูลจากสาขา - สำรวจข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนวัดผล	- สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จะต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาของแขนงวิชาอย่างจริงจัง - มีความร่วมมือจากหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปัจจัยนำเข้า (Input)	- บุคลากร (ตำแหน่ง) - งบดำเนินการ - งบลงทุน	พ.ศ. 2565 - แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 3 ตำแหน่ง - แขนงวิชาสหกรณ์ 3 ตำแหน่ง - แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 ตำแหน่ง - วัสดุ/ตอบแทน/ใช้สอย = 200,000 บาท - ครุภัณฑ์ = 100,000 บาท	- ข้อมูลจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ - ข้อมูลจากสำนักวางแผน	- ได้รับการสนับสนุนอัตรากำลังจากหน่วยงานต้นสังกัด - สถาบันให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างจริงจัง

รูปแบบการเขียนโครงการทั้งการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมและการจัดทำโครงการในรูปตารางเหตุสัมพันธ์ อาจจะมีหัวข้อและรายละเอียดแตกต่างกันไปตามลักษณะหรือประเภทของโครงการ บางโครงการมีรายละเอียดมาก บางโครงการมีรายละเอียดน้อย บางโครงการอาจต้องเพิ่มเติมหัวข้อที่มีความสำคัญเข้าไป เช่น โครงการทางด้านวิชาการ อาจต้องมีการเพิ่มหัวข้อเอกสารอ้างอิง เป็นต้น ทั้งนี้แล้วแต่ผู้เขียนโครงการจะจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านโครงการหรือผู้ปฏิบัติตามโครงการมีความชัดเจนและเข้าใจโดยง่ายที่สุด

โดยสรุป โครงการที่ดำเนินการเตรียมโครงการแล้ว จะถูกกำหนดโครงร่างหรือข้อเสนอโครงการ (project proposal) และการออกแบบโครงการ (detailed design) ด้วยการเขียนโครงการซึ่งโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ

1. การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม เป็นรูปแบบดั้งเดิมที่นิยมใช้เขียนโครงการโดยทั่วไป รายละเอียดของโครงการจะแจกแจงตามหัวข้อที่กำหนดไว้ คือ 1) ชื่อโครงการ 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 3) หลักการและเหตุผล 4) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5) ระยะเวลาในการดำเนินงาน 6) วิธีดำเนินการ 7) แผนปฏิบัติการ 8) งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ 9) ผู้รับผิดชอบโครงการ 10) การติดตามและประเมินผลโครงการ และ 11) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2. การจัดทำโครงการในรูปตารางเหตุสัมพันธ์ เป็นวิธีอธิบายเหตุผลโดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับจุดมุ่งหมายของแผนงานในเชิงเหตุและผล ช่วยให้ผู้วางแผนสามารถกำหนดจุดมุ่งหมาย (goal) วัตถุประสงค์ (purpose) ผลผลิตหรือผลงาน (output) ที่คาดหวัง ตลอดจนกำหนดกิจกรรมและทรัพยากร (input) ที่จะใช้อย่างรอบคอบ และช่วยให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กิจกรรม 9.2.2

การจัดทำข้อเสนอโครงการแบบประเพณีนิยม (conventional method) มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 9.2.2

การจัดทำข้อเสนอโครงการแบบประเพณีนิยม (conventional method) มีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ คือ

1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
3. หลักการและเหตุผล
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
6. วิธีการดำเนินการ
7. แผนปฏิบัติการ
8. งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตอนที่ 9.3
การบริหาร การควบคุมและการยุติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง

9.3.1 กระบวนการและระบบบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
9.3.2 การควบคุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
9.3.3 การยุติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

แนวคิด

1. กระบวนการและระบบบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นความพยายามที่จะทำให้กิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการบรรลุความสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดไว้ สำเร็จภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย การบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการเริ่มต้น 2) กระบวนการวางแผน 3) กระบวนการดำเนินงาน 4) กระบวนการควบคุม และ 5) กระบวนการปิดงาน
2. การควบคุมโครงการด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ผู้บริหารโครงการทราบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีความก้าวหน้า มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบความเหมาะสมของการดำเนินงานและการบรรลุความสำเร็จของโครงการนั้น
3. การยุติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นขั้นตอนสุดท้ายของขั้นตอนการบริหารโครงการ อาจมาจากการยุติโครงการตามกำหนดเวลาในสภาพปกติหรือยุติโครงการก่อนที่โครงการจะดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งมาจากหลายปัจจัย การยุติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้จัดการโครงการจะต้องรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ ให้ทราบผลการปฏิบัติงานโครงการว่าประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด รวมถึงข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงการให้กับโครงการอื่น

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 9.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายกระบวนการและระบบบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
2. อธิบายการควบคุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้
3. อธิบายการยุติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้


เรื่องที่ 9.3.1
กระบวนการและระบบบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจะเข้าสู่การปฏิบัติตามโครงการ (Project implementation) โดยผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโครงการและที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นโดยทันที เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือให้เป็นไปตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดปัญหาขณะดำเนินโครงการ การดำเนินการป้องกัน (Preventive action) ด้วยการบริหารโครงการวางแผนดำเนินการควบคุมโครงการตั้งแต่การเริ่มดำเนินโครงการไปจนกระทั่งการยุติโครงการ ทั้งนี้ กฤษฎา กิตติโสภโณ (2558, น. 62–70) ได้อธิบายกระบวนการและระบบบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ดังนี้

กระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบโครงการและที่เกี่ยวข้องจะเริ่มบริหารโครงการโดยทันที ด้วยความพยายามที่จะทำให้กิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการบรรลุความสำเร็จใน 3 ลักษณะ คือ สำเร็จภายในระยะเวลา (Schedule) ที่กำหนดไว้ สำเร็จภายใต้งบประมาณ (Budget) ที่ได้รับการจัดสรร และสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Objective หรือ Goal) ที่ต้องการ ซึ่งการที่จะบรรลุความสำเร็จดังกล่าวได้นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการของการบริหารโครงการ (Project management processes) ที่ดีจากขั้นตอนในการจัดการองค์ความรู้ต่างๆ เช่น ขอบเขต คุณภาพ ทรัพยากร เวลา ต้นทุนและกระบวนการต่างๆ ของโครงการประกอบขึ้นมาเป็นโครงการ อันเป็นการกระทำเพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์และความสำเร็จของงานในโครงการ กระบวนการของการบริหารโครงการประกอบด้วย 5 กระบวนการ ดังนี้

1. กระบวนการเริ่มต้น (Initiating processes)
2. กระบวนการวางแผน (Planning processes)
3. กระบวนการดำเนินงาน (Executing processes)
4. กระบวนการควบคุม (Controlling processes)
5. กระบวนการปิดงาน (Closing processes)

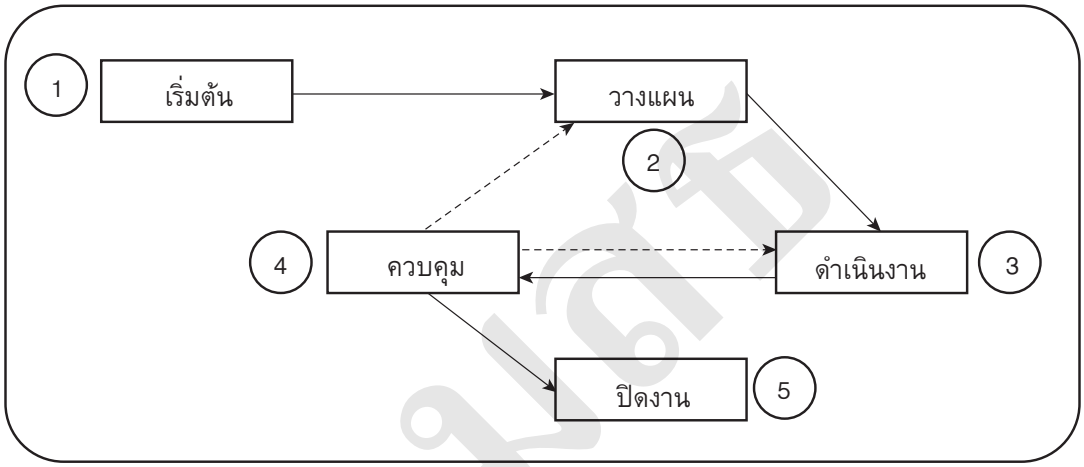

ภาพที่ 9.3 ความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

กระบวนการทั้ง 5 จากภาพที่ 9.3 แต่ละกระบวนการในโครงการจะมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของช่วงเวลาที่ใช้ดำเนินการ เช่น กระบวนการวางแผนสามารถเริ่มต้นดำเนินการไปพร้อมๆ กับกระบวนการเริ่มโครงการ กระบวนการควบคุมจะเกิดขึ้นตลอดทุกช่วงที่มีการดำเนินการในกระบวนการต่างๆ จนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1. กระบวนการเริ่มต้น (Initiating processes) กระบวนการเริ่มต้นโครงการ คือ กระบวนการมอบหมายการทำโครงการอย่างเป็นทางการ ถ้าสามารถที่จะเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะช่วยให้โครงการเชื่อมประสานเข้ากับงานที่กำลังทำอยู่ได้ ผู้บริหารโครงการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของโครงการ ความยากง่ายในการเริ่มต้นโครงการขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของโครงการนั้น ในบางกรณีกระบวนการเริ่มต้นอาจไม่มีความจำเป็นสำหรับโครงการขนาดเล็ก แต่ถ้าโครงการขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินการต่างๆ มากมาย กระบวนการนี้ย่อมมีความสำคัญต่อกิจกรรมที่ต้องทำต่อไป

โครงการส่วนใหญ่จะเริ่มจากกระบวนการเริ่มต้น แต่โครงการบางประเภทไม่สามารถเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการได้ในทันที จำเป็นต้องมีกิจกรรมการดำเนินงานบางประการก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมและค้นหารายละเอียดต่างๆ ในโครงการให้ได้มากที่สุดก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

กรณีตัวอย่าง โครงการเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ จะต้องทำการสำรวจความต้องการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ จัดทำแผนการดำเนินการเบื้องต้นให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการ หรือโครงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย มีการเริ่มต้นโครงการอย่างไม่เป็นทางการได้ระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักแล้วจึงเริ่มเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ เป็นต้น

หลักในการเลือกโครงการเพื่อทำการเริ่มต้นดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

1.1 โครงการที่เป็นจริงได้ (Realism) หมายถึง การพิจารณาหลักความเป็นจริงในด้านการผลิต การตลาด การเงินและความสามารถของบุคลากรที่จะทำงานตามโครงการนั้นได้ ตลอดจนมีความสามารถในการสร้างกำไรได้

1.2 ขีดความสามารถ (Capability) หมายถึง การพิจารณาความสามารถของโครงการในด้านต่างๆ เช่น เงินทุน ความสามารถของพนักงาน ความสามารถในการบริหารเวลา ความสามารถในการขจัดปัญหาและอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกของโครงการ เช่น การนัดหยุดพนักงาน การเปลี่ยนแปลงด้านอัตราดอกเบี้ย การพิจารณาความเสี่ยง ปัญหาของโครงการ เป็นต้น

1.3 มีความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง โครงการต้องสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ได้เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นต้น

1.4 ง่ายต่อการนำไปใช้ (Ease of use) หมายถึง โครงการแต่ละโครงการนั้นต้องง่ายต่อการใช้ กล่าวคือ ใช้เวลาไม่ยาวนานเกินไป ง่ายต่อความเข้าใจ ง่ายต่อการปฏิบัติและง่ายต่อการตีความ

1.5 ต้นทุน (Cost) หมายถึง แต่ละโครงการนั้นจะต้องสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนทั้งหมดและผลประโยชน์ที่เกิดจากต้นทุน ทั้งนี้ต้องใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ทางการเงิน โดยศึกษาถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ระยะเวลาคืนทุนและการวิเคราะห์ผลประโยชน์ต้นทุน

1.6 สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ (Objective accomplishment) หมายถึง โครงการที่เลือกนั้นต้องสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านเชิงปริมาณ (Quantitative) และคุณภาพ (Qualitative)

1.7 การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ (Expert judgment) หมายถึง การใช้ความรู้ ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินหรือประเมินสิ่งที่ได้รับเข้ามาในกระบวนการ โดยผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะสามารถหาได้จากหลายๆ แหล่ง คือ จากหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กรที่ปรึกษา ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ รวมไปถึงลูกค้า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคกลุ่มอุตสาหกรรม

2. กระบวนการวางแผน (Planning process) การวางแผนโครงการ คือ การกำหนดแผนงานการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการโดยมีการใช้ทรัพยากรในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แผนของโครงการ (Project plan) จัดเป็นเอกสารทางการที่ใช้ในการจัดการโครงการ ดังนั้นแผนของโครงการควรจะมีการเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเพื่อการวางแผนการดำเนินงานอื่นๆ ต่อไป แผนโครงการที่ดีนำมาซึ่งผลการดำเนินงานที่ดีตามไปด้วย

ขั้นตอนการวางแผนโครงการ มีดังนี้

2.1 การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จไม่ว่าในการดำเนินโครงการประเภทใด การกำหนดเป้าหมายทำให้มีทิศทางในการทำงานเพื่อให้สำเร็จและได้ในสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายจึงมีความสำคัญต่อการจัดการโครงการ

2.2 การรวบรวมข้อมูล เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโครงการ เพราะการรู้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดีจะช่วยให้การวางแผนโครงการเป็นไปได้ด้วยดี ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ ปัจจัยหรือองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโครงการ ค่าใช้จ่ายในโครงการตามแต่ละกิจกรรมการดำเนินงาน เป็นต้น

2.3 การจัดทำโครงสร้างการจำแนกงาน เป็นการนำเอางานที่มีอยู่ในกิจกรรมมาแยกแยะเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ และการติดตาม ประเมินผล โครงสร้างการจำแนกงานจะช่วยให้สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในโครงการได้เป็นอย่างดี

2.4 การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ วิธีการที่ผู้บริหารกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาถัดไปตามความเหมาะสมของแต่ละงานในแต่ละบุคคล เป็นไปตามหลักการมอบหมายงานดังต่อไปนี้

2.4.1 สร้างพันธสัญญาหรือภาวะผูกพันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือผู้บังคับบัญชาควรมีภาระผูกพันกับงานที่มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาก็ควรที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

2.4.2 มอบหมายงานควรกำหนดวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน

2.4.3 กำหนดหน้าที่ในแต่ละงานอย่างชัดเจน ไม่ควรมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาครั้งละมากๆ

2.5 การจัดทำตารางเวลาการดำเนินงาน เป็นการรวบรวมเอาแผนการเริ่มโครงการและวันที่คาดว่าจะเสร็จในแต่ละกิจกรรม โดยทั่วไปนิยมใช้การวิเคราะห์โครงข่ายที่เรียกว่า PERT/CPM ที่มีการเพิ่มวันที่ดำเนินการลงไปด้วย หรือใช้แผนภูมิแท่งที่เรียกอีกอย่างว่า แผนภูมิแกนท์ (Gantt chart) โดยมีแสดงอยู่ในรูปแบบตารางเวลาหลัก ไม่มีรายละเอียดการดำเนินงาน หรือแสดงตารางเวลาหลักพร้อมทั้งรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ณ เวลานั้นได้อีกด้วย

2.6 การจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรของโครงการ เบื้องต้นคือการจัดทำโครงสร้างองค์กรเพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับการบังคับบัญชาในแต่ละกลุ่มงาน และง่ายต่อการสื่อสารภายในโครงการทำให้เกิดการจัดตั้งทีมงานต่อไป โดยจะต้องระบุถึงบุคคลที่ต้องการในโครงการ ทักษะเฉพาะของบุคลากร การฝึกอบรม การสรรหา ข้อจำกัดด้านกฎหมาย หรือนโยบายและความต้องการอื่นๆ ด้วย ในส่วนของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการโครงการขั้นพื้นฐานมี 2 ประการ คือ งบประมาณ และเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะต้องออกแบบให้ครอบคลุมความต้องการทรัพยากรเฉพาะที่ต้องการ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ การทดสอบ การใช้ห้องทดลอง หรือการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และวัสดุพิเศษอื่นๆ

2.7 การกำหนดแนวทางการประสานงาน โดยการจัดทำแผนการติดต่อสื่อสารในโครงการโดยเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และข้อมูลที่จำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงความสิ้นเปลืองอันเนื่องมาจากความไม่มีสาระของข้อมูล แผนการบริหารการสื่อสาร คือ เอกสารต่างๆ ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่ทันสถานการณ์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ก่อนหน้านี้ได้ โดยมีโครงสร้างการจัดส่งข้อมูล ประกอบด้วย รายงานสถานะ ข้อมูล ตารางเวลาเอกสารทางเทคนิค เป็นต้น ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร ซึ่งเอกสารต่างๆ เหล่านี้จะต้องเต็มไปด้วยรายละเอียด รูปแบบ และสาระที่มีประโยชน์ต่อโครงการ

2.8 การวางแผนควบคุมและติดตาม เป็นภารกิจที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกกิจกรรมในโครงการ ซึ่งแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การติดตามงาน และการแก้ไขปรับปรุงงาน ว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปตามแผนหรือไม่ การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนที่กำหนดไว้หรือไม่ ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ เป็นต้น

การวางแผนควบคุมภายใน มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

- การควบคุมปัจจัยการทำงาน
- การควบคุมกระบวนการ
- การควบคุมผลงาน

การวางแผนควบคุมภายนอก มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

- การควบคุมผลลัพธ์
- การควบคุมผลกระทบ
- การควบคุมสภาพแวดล้อม

2.9 การกำหนดแผนหรือวิธีประเมินโครงการ เป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสรุปผลว่าโครงการนั้นๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด แผนการประเมินโครงการจะระบุวิธีการประเมินโครงการที่ใช้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การประเมินโครงการก่อนดำเนินการ 2) การประเมินโครงการระหว่างการดำเนินการ 3) การประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ และ 4) การประเมินประสิทธิภาพการประเมินโครงการอย่างมีระบบ โดยการประเมินโครงการดังกล่าวย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการได้ตระหนักถึงคุณภาพของโครงการที่กำหนดขึ้นเพื่อที่จะสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้องเหมาะสม และส่งผลให้โครงการนั้นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

3. กระบวนการดำเนินงาน (Executing processes) การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนโครงการที่กำหนดไว้เป็นเรื่องยากเพราะการทำงาน ลักษณะโครงการเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการในระหว่างการดำเนินงาน ดังนั้นผู้บริหารโครงการจึงควรมีทักษะในการบริหารขั้นพื้นฐาน เช่น ความเป็นผู้นำการ ติดต่อสื่อสาร การเจรจา เป็นต้น และทีมงานในโครงการต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับผลที่ได้จากการทำโครงการ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปรับปรุงการทำงานได้ทันท่วงทีในกรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามแผนโครงการ ลักษณะการดำเนินโครงการที่ดี มีดังนี้

3.1 เป็นไปตามแผนของโครงการ คือ ดำเนินการภายใต้เวลา ต้นทุน ทรัพยากร ขอบเขต และคุณภาพตามแผนที่กำหนดไว้

3.2 มีความชัดเจน คือ สามารถติดตามตรวจสอบความคืบหน้า หรือความสำเร็จเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรมได้ตลอดเวลา

3.3 ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คือ ดำเนินงานภายใต้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

3.4 มีการบริหารจัดการที่ดี คือ ผู้บริหารโครงการมีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานโครงการประกอบกับสมาชิกในโครงการมีทักษะในการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ทำให้ทุกอย่างทำงานอย่างเป็นระบบตลอดวงจรชีวิตของโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ

3.5 มีความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน คือ ความลงตัวของการพยายามทำทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในส่วนงานจัดซื้อจัดหาที่จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดเตรียมทรัพยากร ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

4. กระบวนการควบคุม (Controlling process) กระบวนการควบคุมโครงการ หมายถึง การติดตามการทำงานในทุกการดำเนินงานโครงการตั้งแต่โครงการเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ทำให้ทราบว่าการทำงานเป็นไปตามแผนของโครงการหรือไม่ การควบคุมโครงการจะต้องสอดคล้องกับการดำเนินงานแต่ละชนิดเพราะการควบคุมที่มากเกินไปอาจทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานบางอย่างและอาจส่งผลกระทบต่องบประมาณในการดำเนินงานนั้นด้วย อันเนื่องมาจากโครงการเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดนั่นเอง เพราะได้ใช้เวลาไปกับการควบคุมตรวจสอบที่มากเกินไป การควบคุมการดำเนินงานในการจัดการโครงการประกอบด้วย

4.1 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงของโครงการ เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นให้กลับสู่สภาวะปกติ เพื่อดำเนินโครงการต่อไปหรือสร้างแนวทางของโครงการขึ้นใหม่โดยยึดหลักการของการวัดคุณภาพ

4.2 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต จะพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นที่ตกลงกันไว้แล้ว และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงขอบเขตที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น จากนั้นก็จะดำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นจริง การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตต้องดำเนินการร่วมกันกับกระบวนการอื่นๆ เช่น การควบคุมตารางเวลา การควบคุมต้นทุน การควบคุมคุณภาพโครงการ

4.3 การควบคุมตารางเวลา ต้องมีระบบงานเอกสาร ระบบติดตามและระดับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนี้การควบคุมตารางจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงตารางเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับเพื่อการดำเนินการจัดการต่อไป สิ่งที่ขาดเสียมิได้ คือ การวัดสมรรถนะ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยในการประเมินความผันแปรที่เกิดขึ้น ส่วนสำคัญของการควบคุมตาราง คือ การตัดสินใจถ้าความผันแปรของตารางต้องการการแก้ไข

4.4 การควบคุมต้นทุน เป็นการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับงบประมาณของโครงการ เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากค่าปกติ (Baseline) ของต้นทุนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับ การติดตามสมรรถนะของต้นทุนเพื่อให้เกิดความแน่ใจ ป้องกันความผิดพลาดแล้ว ควรแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ

4.5 การควบคุมคุณภาพ คือ กิจกรรมและเทคนิคในระดับปฏิบัติการ ซึ่งนำมาใช้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพ สามารถสรุปเป็นขั้นตอนของกระบวนการควบคุมคุณภาพได้ดังนี้

- กำหนดมาตรฐานลักษณะเฉพาะทางคุณภาพ
- การตรวจสอบ และ/หรือการทดสอบผลการผลิต/การปฏิบัติงาน

– การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับข้อกำหนดทางคุณภาพเพื่อค้นหาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

– การปฏิบัติการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหา

4.6 การควบคุมความเสี่ยง โดยใช้แผนการบริหารความเสี่ยง ค้นหาวิธีการป้องกันความเสี่ยง เปรียบเทียบความแปรปรวนและค้นหาสาเหตุที่มาของความแปรปรวน การประเมินผลที่เกิดขึ้นของความเสี่ยง การระบุและจัดทำเอกสารรายงานความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป

5. กระบวนการปิดงาน (Closing processes) การเสร็จสิ้นโครงการ คือ การยุติ ยกเลิก สิ้นสุดการดำเนินโครงการโดยมีขั้นตอนการปิดโครงการเป็นไปตามลำดับ ดังนี้ คือเริ่มจากการตรวจเช็กผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดงาน เสร็จแล้วประชุมเพื่อสรุปและปิดกิจกรรมการดำเนินงาน ยอมรับการส่งมอบงาน จัดทำรายงานปิดโครงการประเมินผลโครงการ โครงการเสร็จสมบูรณ์และสุดท้ายคือส่งมอบโครงการ

ระบบการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ภายหลังจากที่โครงการได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการการจัดการโครงการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบโครงการและที่เกี่ยวข้องก็จะเกิดขึ้นทันที โดยพยายามที่จะทำให้กิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการบรรลุความสำเร็จใน 3 ลักษณะ คือ สำเร็จภายในระยะเวลา (Schedule) ที่กำหนดไว้ สำเร็จภายใต้งบประมาณ (Budget) ที่ได้รับการจัดสรร และสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Objective หรือ Goal) ที่ต้องการ ซึ่งการที่จะบรรลุความสำเร็จดังกล่าวได้นั้น จะต้องอาศัยการจัดระบบการบริหารที่ดีอันประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ดังนี้

1. ระบบย่อยการจัดหน่วยงาน (Facilitative organizational subsystem) เป็นการจัดโครงสร้างเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและสายงานของคณะผู้ดำเนินโครงการ เพื่อความชัดเจนและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานร่วมกัน

2. ระบบย่อยการควบคุมโครงการ (Project control subsystem) เป็นการจัดระบบกลไกและมาตรการต่างๆ เพื่อให้โครงการบรรลุความสำเร็จตามกำหนดระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีการตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และการรายงานผล การดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน จุดเน้นสำคัญของการจัดระบบย่อยการควบคุมโครงการก็คือ การตรวจสอบงานให้มีการปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

3. ระบบย่อยการบริหารจัดการสารสนเทศโครงการ (Project management information subsystem) เป็นการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและนำไปใช้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

4. ระบบย่อยการวางแผน (Planning system) เป็นการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน การกำหนดระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ เช่น คน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

5. ระบบย่อยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Human subsystem) เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อการทำงานร่วมกันตามโครงการของบุคลากร เพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

สรุป โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการแล้วจะเริ่มบริหารโครงการจากกระบวนการบริหารโครงการ ประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการเริ่มต้น 2) กระบวนการวางแผน 3) กระบวนการดำเนินงาน 4) กระบวนการควบคุม และ 5) กระบวนการปิดงาน โดยพยายามที่จะทำให้กิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการบรรลุความสำเร็จใน 3 ลักษณะ คือ 1) สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2) สำเร็จภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และ 3) สำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารโครงการจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหาร และจัดการกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการให้ไปด้วยกันและเข้ากันอย่างเหมาะสม

กิจกรรม 9.3.1

กระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรประกอบด้วยกี่กระบวนการ อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 9.3.1

กระบวนการของการบริหารโครงการประกอบด้วย 5 กระบวนการ ดังนี้

1. กระบวนการเริ่มต้น (Initiating processes)
2. กระบวนการวางแผน (Planning processes)
3. กระบวนการดำเนินงาน (Executing processes)
4. กระบวนการควบคุม (Controlling processes)
5. กระบวนการปิดงาน (Closing processes)

เรื่องที่ 9.3.2
การควบคุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนควบคุมโครงการ ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการระหว่างการดำเนินงานตามโครงการเป็นระยะ ทั้งนี้การติดตามโครงการ (Project monitoring) เป็นกิจกรรมที่ทำในระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้ข้อมูลการใช้ปัจจัยของแต่ละกิจกรรมในโครงการ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ขณะดำเนินโครงการ ข้อมูลที่ได้จากการติดตามจะมีประโยชน์ในแง่ของการควบคุมกำกับโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการประเมินผลโครงการ (Project evaluation) เป็นการประเมินผลในระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ (On-going evaluation) เป็นระยะๆ ส่วนใหญ่ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการประเมินผลได้มาจากรายงานการติดตามโครงการ สำหรับสิ่งที่จะต้องประเมินคือกระบวนการดำเนินงาน (Implementation process) ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ รวมถึงวิเคราะห์ผลลัพธ์โครงการในแง่ปริมาณตามเป้าหมายและมีคุณภาพได้มาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ เกษม ศิริสุโขดม (2550) อธิบายการควบคุมโครงการด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรดังนี้

ความหมายการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การติดตามโครงการ (Project monitoring) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) การดำเนินงาน (Process) และผลการดำเนินงาน (Output) เกี่ยวกับโครงการเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback system) สำหรับการกำกับ ทบทวนและแก้ปัญหาขณะดำเนินโครงการ

การประเมินผลโครงการ (Project evaluation) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value judgment) เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า การดำเนินงานและผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นสารสนเทศสำหรับการปรับปรุง การดำเนินโครงการ สรุปผลสำเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการต่อไป


การติดตามและการประเมินผล (Monitoring & evaluation) เป็นคำที่มักจะใช้ควบคู่กัน การติดตามการประเมินจะช่วยให้ผู้บริหารโครงการทราบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีความก้าวหน้า มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปโดยการสนับสนุนจากผู้บริหารได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบความเหมาะสมของการดำเนินงานและการบรรลุความสำเร็จของโครงการนั้น “การติดตาม” และ “การประเมิน” เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินมาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถกำกับ ทบทวนและพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จึงหมายถึงกลไกและเครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ความสัมพันธ์ของการติดตามและการประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กัน โดยการติดตามโครงการช่วยแก้ปัญหาระหว่างการดำเนินงานในขณะที่การประเมินผลโครงการช่วยตัดสินคุณค่างานและผลของโครงการสำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินโครงการเพื่อจะได้บังเกิดผลตามเป้าหมาย ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการติดตามงานของโครงการจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการได้


การติดตามและการประเมินผลมีความสัมพันธ์กัน อาจกล่าวได้ว่าการติดตามเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสนับสนุนการประเมินผล ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตามจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศในการประเมิน โดยใช้ร่วมกับสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น โครงการที่มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องแล้ว จะทำให้การประเมินโครงการนั้นๆ ทำได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าโครงการที่ไม่มีการติดตามหรือติดตามอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมิน แสดงดังภาพที่ 9.4

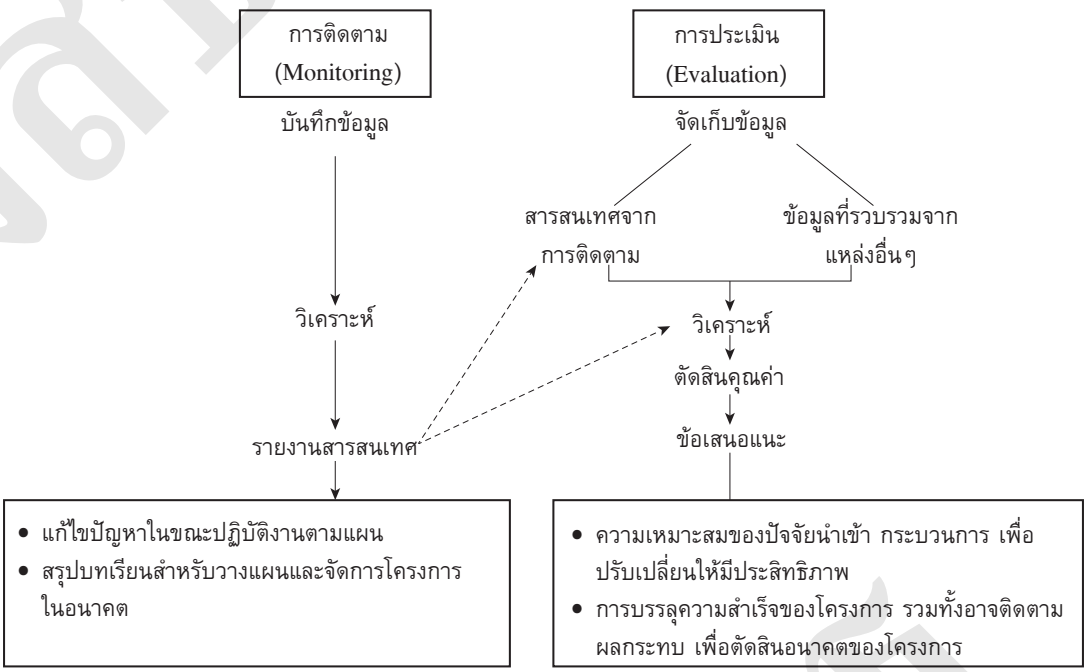

ภาพที่ 9.4 ความสัมพันธ์ของการติดตามและการประเมินโครงการ

ความแตกต่างระหว่างการติดตามและการประเมินผลโครงการ

การติดตามและการประเมินโครงการ เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากการติดตามโครงการ สามารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการได้ แต่การติดตามและการประเมินผลโครงการก็ยังมีความแตกต่างเช่นกัน ทั้งในเรื่องจุดมุ่งหมายและการนำผลไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนขอบเขตของการติดตามและประเมินผล ดังแสดงในภาพที่ 9.5 ซึ่งถ้ากล่าวโดยภาพรวมแล้ว ความแตกต่างที่สำคัญคือ การติดตามมีขอบเขตแคบกว่าการประเมินผล

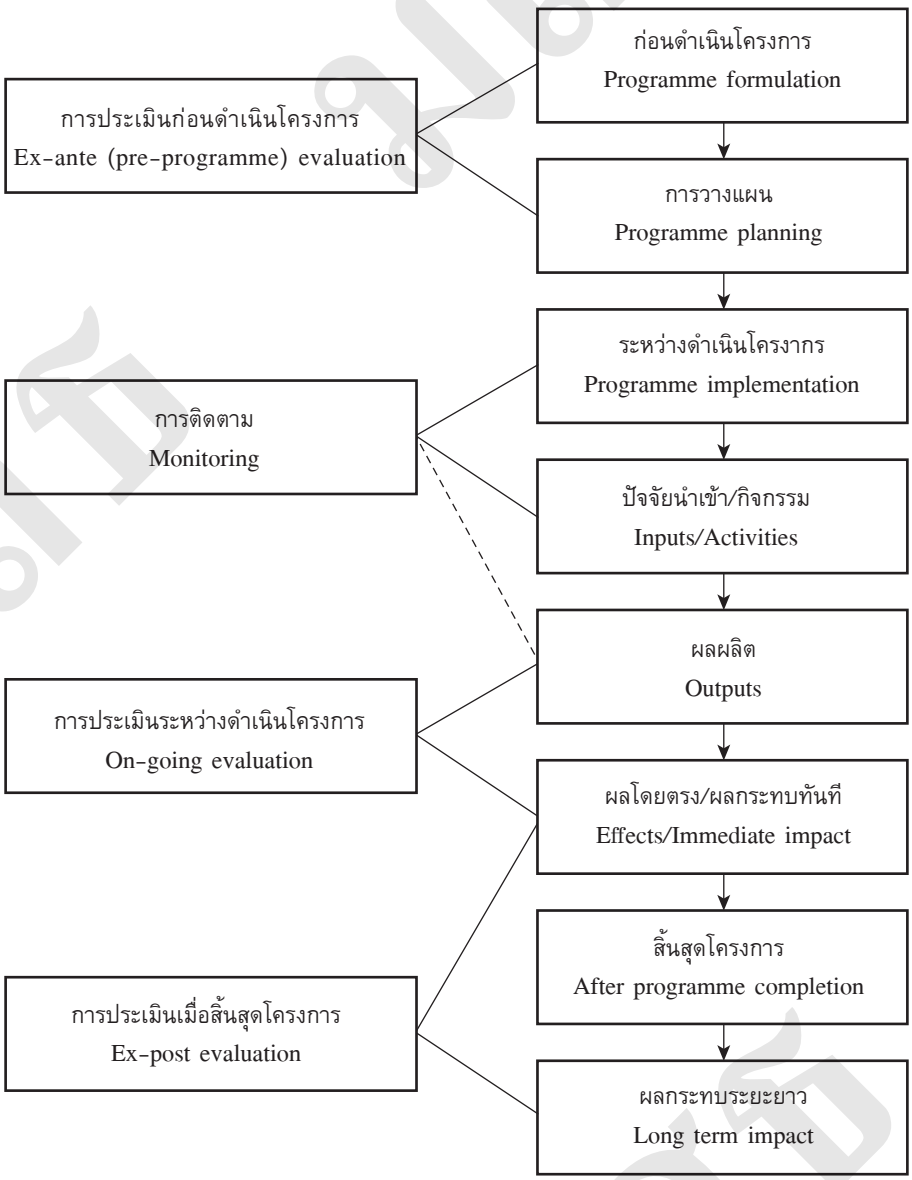

ภาพที่ 9.5 เปรียบเทียบการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา

การติดตามโครงการ มักเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของโครงการนั้นๆ ที่คอย “กำกับ” ให้งานเป็นไปตามกรอบของแผนที่กำหนดไว้ ส่วนการประเมินโครงการอาจใช้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของโครงการทำการ “ตัดสิน” ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และโดยทั่วไปนิยมให้เจ้าหน้าที่ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก “ตัดสิน” ความสำเร็จของโครงการ นอกจากนี้การติดตามและประเมินโครงการยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับในด้านช่วงเวลาปฏิบัติ วิธีการและผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งสรุปได้ในตารางที่ 9.2

ตารางที่ 9.2 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามโครงการกับการประเมินโครงการ

หัวข้อ	การติดตาม (Monitoring)	การประเมินผล (Evaluation)
ข้อมูล	- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลของโครงการ	- ข้อมูลจากการติดตามสามารถมาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประเมินเพื่อตัดสินคุณค่าของโครงการ
ผู้รับผิดชอบ	- บุคลากรในหน่วยงาน	- บุคลากรในหน่วยงานและบุคลากรนอกหน่วยงาน
ช่วงเวลาปฏิบัติ	- เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุกเดือน ทุกไตรมาส เป็นต้น	- เป็นช่วงๆ เช่น ระหว่างดำเนินงาน สิ้นสุดโครงการและหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว ฯลฯ
วิธีการ	- เป็นการติดตามงานโดยใช้แผนเป็นกรอบอ้างอิง ถือเป็นส่วนสำคัญสำคัญของการบริหารจัดการ	- เป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์/มาตรฐาน มักครอบคลุมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
ผู้ใช้ประโยชน์	- ผู้ปฏิบัติ (เน้น) ผู้บริหาร	- ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร (เน้น)

จากตารางที่ 9.2 และภาพที่ 9.5 แสดงให้เห็นว่าการติดตามโครงการมีขอบเขตแคบกว่าการประเมินผล หรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมินผลเท่านั้น จากภาพที่ 9.5 จะเห็นว่าการติดตามอยู่ในช่วงเวลาการดำเนินโครงการ โดยเน้นพิจารณาปัจจัยกิจกรรมต่างๆ ของโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ส่วนผลที่ได้จะเป็นเรื่องรอง ในภาพจึงได้ใช้เส้นประไว้ สำหรับการประเมินโครงการสามารถดำเนินการได้ในทุกระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการแล้ว สำหรับความแตกต่างระหว่างการติดตามกับการประเมินโครงการ

สรุปได้ว่า การประเมินโครงการต้องมีการตัดสินผลทุกครั้ง ในขณะที่การติดตามโครงการจะเน้นด้านการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ มากกว่าจะคำนึงถึงผลที่ได้ของโครงการนั่นคือจะเน้นประสิทธิภาพมากกว่าประสิทธิผล

ลักษณะการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องอาศัยการประเมินผลโครงการเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการตัดสินคุณค่าของการพัฒนาโครงการ ทำให้ทราบว่าแผนที่วางไว้ประสบผลสำเร็จหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นควรมีการพัฒนา ปรับปรุงโครงการด้านใดบ้างเพื่อให้บรรลุความต้องการ ดังนั้นเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์การประเมินโครงการจำเป็นต้องใช้เทคนิคและกระบวนการในการประเมินผลโครงอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่สอดคล้องและมีความสมเหตุสมผล เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546) อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของการประเมินผลโครงการได้ตามช่วงเวลาของการประเมิน สามารถแบ่งได้ 8 ประเภท ดังนี้

1. การประเมินความต้องการจำเป็น (Needs assessment) เป็นการประเมินความต้องการจำเป็นของโครงการในเบื้องต้น ก่อนที่จะจัดทำโครงการใดๆ เป็นการประเมินที่มีประโยชน์ต่อการวางนโยบายและการวางแผน เพื่อให้ได้แนวคิดของการจัดโครงการที่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้

2. การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility study) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่จะดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัย เงื่อนไขที่จำเป็นต่อความสำเร็จของโครงการ เช่น ด้านกำลังคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3. การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรป้อนเข้าสู่โครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อโครงการหรือไม่ เช่น การประเมินกำลังคน วัตถุดิบ อุปกรณ์และงบประมาณ เป็นต้น

4. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการดำเนินการตามที่กำหนด ทำการประเมินในขณะที่โครงการกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อใช้ผลการปรับปรุง หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ของโครงการ

5. การประเมินผลผลิต (Output evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ คุ้มค่าเพียงใด เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ ยุติ ปรับปรุงหรือขยายโครงการต่อไป

6. การประเมินผลกระทบ (Impact evaluation) เป็นการประเมินผลที่จะก่อให้เกิดสิ่งอื่นใดตามมาหรือไม่ ซึ่งเป็นผลทางบวกและทางลบ เพื่อประโยชน์ประกอบการตัดสินใจยกเลิกหรือดำเนินโครงการต่อไป

7. การประเมินการติดตาม (Follow up evaluation) เป็นการประเมินเมื่อโครงการสิ้นสุดไประยะหนึ่งแล้ว เช่น ประเมินหลังโครงการสิ้นสุดไปแล้ว 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการ

8. การประเมินงานประเมิน (Meta evaluation) เป็นการพิจารณาตัดสินคุณภาพการประเมินเพื่อทำให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมิน

ขั้นตอนการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การประเมินผลโครงการมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในด้านข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจปรับปรุงหรือยุติโครงการ การประเมินโครงการควรให้มีลักษณะที่เอื้ออำนวยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในขั้นตอนการดำเนินโครงการ ในการประเมินผลแต่ละครั้ง ผู้ประเมินจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของการประเมินผลโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาความเป็นมาของโครงการ โดยการศึกษารายละเอียดโครงการด้านความเป็นมาของโครงการ สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปสู่ประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดต่อไป

2. กำหนดรูปแบบและประเภทการประเมินผล โดยผู้ประเมินเป็นผู้กำหนดรูปแบบและประเภทการประเมินผลว่าต้องการประเมินไปเพื่อใคร หรือใครเป็นผู้ใช้ผลการประเมิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มาจากการศึกษาโครงการมาก่อนมีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้สนับสนุนโครงการ เป็นต้น

3. การศึกษาเค้าโครงการ โดยการจำแนกโครงการออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

3.1 Inputs ที่ตั้งใจจะใช้ในโครงการ

3.2 Activities ที่ตั้งใจจะทำในโครงการ

3.3 Outputs ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

3.4 Purpose ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจาก Outputs

3.5 Goal ผลสืบเนื่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อจาก Purpose

4. การจำแนกผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยการจำแนกออกเป็นส่วนๆ ในลักษณะเทียบเคียงกับขั้นตอนที่ 3 การจำแนกในขั้นตอนนี้ก็เพื่อนำไปใช้เปรียบเทียบกับขั้นตอนที่ 3 ในการกำหนดประเด็นและตัวชี้วัดเป็นการคิดไว้ล่วงหน้าว่าผลการดำเนินงานจะออกมา ดังนี้

4.1 Inputs ที่ใช้ไปจริง

4.2 Activities ที่ทำจริง

4.3 Outputs ที่ได้จริง

4.4 Effect ที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับ Purpose

4.5 Impact ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับ Goal

5. การกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด โดยทำการประเมินผลโดยการเทียบระหว่างสิ่งที่คิด (ขั้นตอนที่ 3) กับสิ่งที่ทำ (ขั้นตอนที่ 4) มีวิธีการดังนี้

5.1 กำหนดประเด็นและตัวชี้วัดในระดับ Inputs ถึง Outputs

5.1.1 การกำหนดประเด็น ก็คือ กำหนดหัวข้อโดยสรุปที่เราจะทำการประเมินผลในแต่ละระดับ

5.1.2 การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผล ระดับ Inputs ถึง Outputs โดยการกำหนดตัวชี้วัด คือ ตัวที่จะบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของประเด็นต่าง ๆ โดยการเทียบระหว่างสิ่งที่คิด (ที่จำแนกไว้ในขั้นตอนที่ 3) กับสิ่งที่ทำ (ที่จำแนกไว้ในขั้นตอนที่ 4) การประเมินผลในระดับ Inputs ถึง Outputs เป็นช่วงของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ จะประเมินผลโดยไม่ใช่แผนแบบ ซึ่งลักษณะของตัวชี้วัดจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลที่เกิดขึ้น (ทำ) กับเป้าหมายหรือแผน (คิด) หรือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เช่น ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วน ซึ่งตัวชี้วัดจะแยกเป็นแต่ละระดับตาม model การประเมินผลที่เลือก

5.2 การกำหนดประเด็นและตัวชี้วัดระดับผลกระทบ (Effect และ Impact) ด้วยการวัดผลกระทบ เป็นการวัดผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการปฏิบัติงานตามโครงการ ดังนี้

5.2.1 การกำหนดประเด็นในระดับผลกระทบ ใช้ Purpose และ Goal ของโครงการที่กำหนดไว้มากำหนดเป็นประเด็นที่จะประเมินผล

5.2.2 การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลกระทบ มี 2 วิธี คือ

1) การใช้แผนแบบการประเมินผล ตัวชี้วัดจะเป็นลักษณะการดูการเปลี่ยนแปลงจาก Purpose และ Goal ที่ตั้งไว้โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดังนี้

(1) ก่อนกับหลังไม่มีกลุ่มควบคุม

(2) ก่อนกับหลังมีกลุ่มควบคุมทั้งในและนอกโครงการ

(3) ในกับนอกโครงการ (หลังโครงการ)

การใช้แผนแบบการประเมินผลทุกแผนแบบควรจะต้องมีการทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง เช่น การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ (t-test)

2) การไม่ใช้แผนแบบการประเมินผล โดยสร้างแบบจำลองทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis)

6. การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและให้ความเห็นเชิงประเมินผล กระทำได้ดังนี้

6.1 การรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมิอะไรบ้าง ด้วยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล จะต้องครอบคลุมทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัดที่กำหนด ซึ่งจำนวนชุดของข้อมูลที่จะนำมาเปรียบเทียบกันนั้นจะขึ้นอยู่กับแผนแบบที่เลือกไว้

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้แล้ว ผู้ประเมินต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลออกมาตามวัตถุประสงค์ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

7. การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการ กระทำได้ดังนี้


7.1 การประเมินผลเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency evaluation) เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลได้ (Outputs) ที่เกิดขึ้นกับปัจจัย (Inputs) ที่ใช้ไปว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่ โดยคิดเป็นต่อหน่วยของค่าใช้จ่าย และต่อหน่วยของเวลา ตัวอย่างของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เช่น B/C ratio ในการดำเนินงานโครงการ ถ้าปัจจัย (Inputs) ที่ใช้ไปก่อให้เกิดผลได้ (Outputs) โดยได้ผลต่อหน่วยลงทุนสูงสุด คือ เสียต้นทุนต่อหน่วยต่ำสุด (Minimum cost) เสียเวลาน้อยกว่าที่กำหนด และได้ผลได้ (outputs) ตรงตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ถือว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

7.2 การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการวิเคราะห์ขอบเขตของโครงการทั้งการวัดในเชิงปริมาณหรือวัดในเชิงคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับความสอดคล้องและประโยชน์ที่ได้รับ การประเมินประสิทธิผลควรรวมถึงการประเมินความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจของชุมชนที่มีต่อผลที่ได้รับของโครงการ ถ้าเป็นไปได้ควรประเมินความคุ้มทุนในแง่ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost-effectiveness) ด้วย

8. การเขียนรายงานการประเมิน ผู้ประเมินต้องเขียนรายงานการประเมินเมื่อการประเมินได้เสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเข้าใจการประเมินโดยเฉพาะช่วยให้ผู้บริหารมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการในระยะต่อไปหรือเพื่อยุติโครงการ

สรุป การควบคุมโครงการเป็นการติดตามการทำงานในทุกการดำเนินงานโครงการตั้งแต่โครงการเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ทำให้ทราบว่าการทำงานเป็นไปตามแผนของโครงการหรือไม่ ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กัน โดยการติดตามโครงการช่วยแก้ปัญหาระหว่างการดำเนินงาน ในขณะที่การประเมินผลโครงการช่วยตัดสินคุณค่างานและผลของโครงการสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานระหว่างการดำเนินโครงการเพื่อจะได้บังเกิดผลตามเป้าหมาย ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการติดตามงานของโครงการจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการได้ การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน คือ

1) ศึกษาความเป็นมาของโครงการ
2) กำหนดรูปแบบและประเภทการประเมินผล
3) การศึกษาเค้าโครงการ
4) การจำแนกผลการดำเนินงานตามโครงการ
5) การกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด
6) การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและให้ความเห็นเชิงประเมินผล
7) การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการ
8) การเขียนรายงานการประเมิน

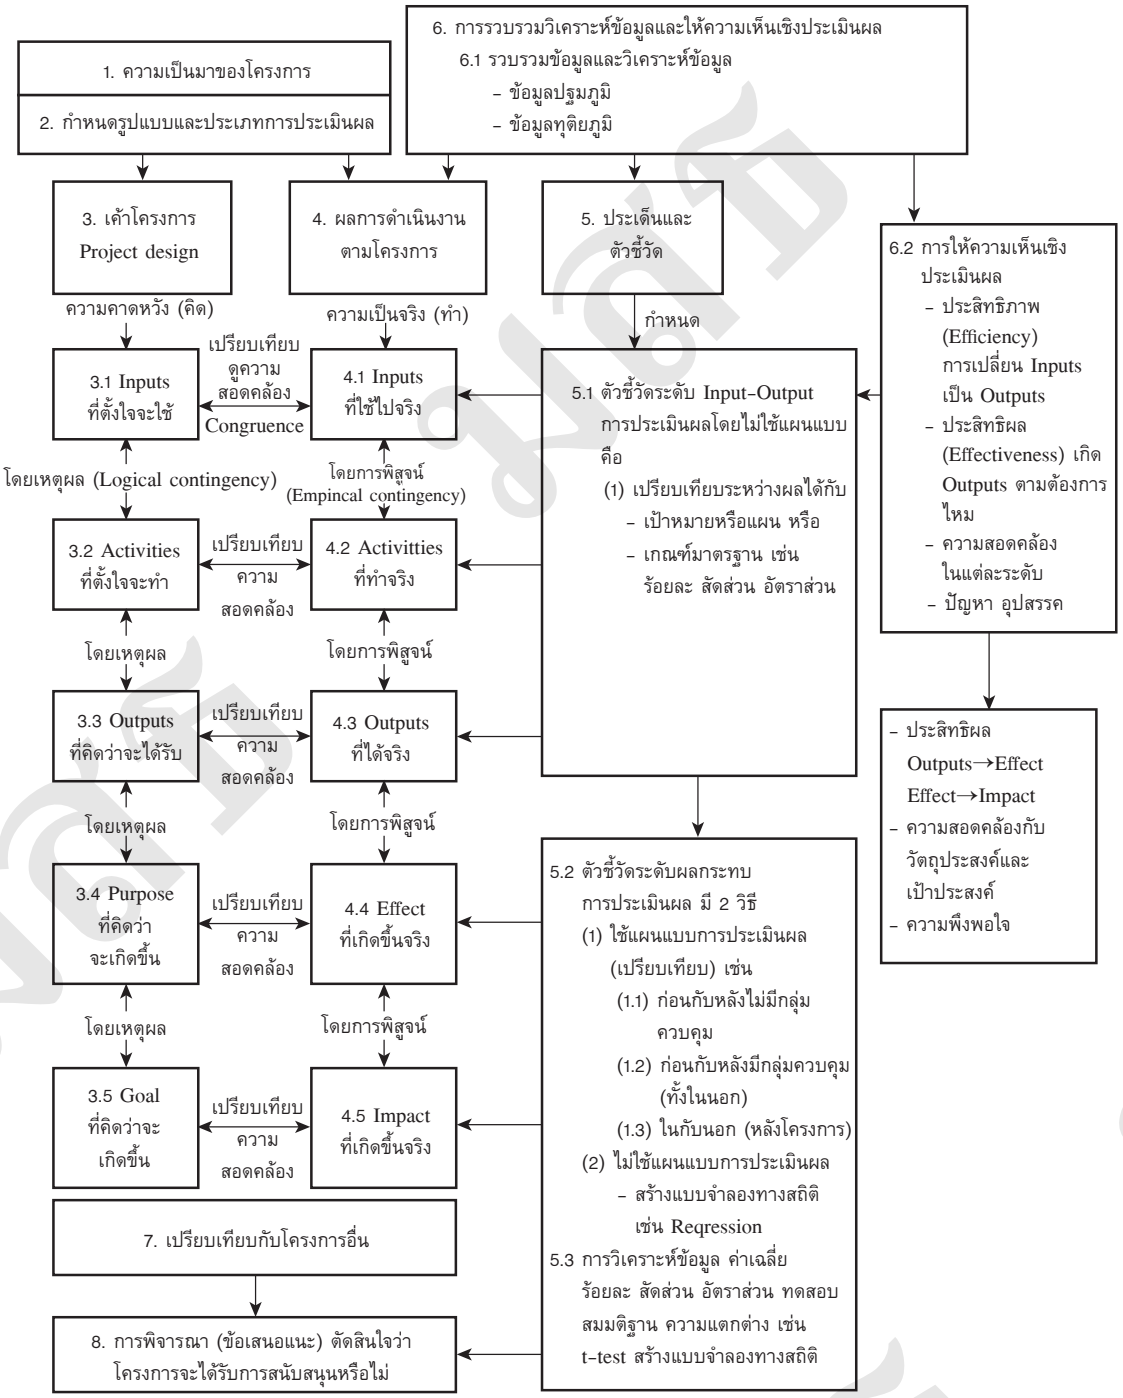

ภาพที่ 9.6 ขั้นตอนหรือกระบวนการประเมินผลโครงการ

ที่มา: เกษม ศิริสุโขดม. (2550, น. 37). ปรับปรุงจาก ประชุม. (2529, น. 78).

กิจกรรม 9.3.2

ขั้นตอนของการประเมินผลโครงการแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 9.3.2

ขั้นตอนของการประเมินโครงการ แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาความเป็นมาของโครงการ
2. กำหนดรูปแบบและประเภทการประเมินผล
3. การศึกษาเค้าโครงการ
4. การจำแนกผลการดำเนินงานตามโครงการ
5. การกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด
6. การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและให้ความเห็นเชิงประเมินผล
7. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการ
8. การเขียนรายงานการประเมิน

เรื่องที่ 9.3.3
การยุติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การสิ้นสุดโครงการ (Project termination) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารโครงการ โดยการดำเนินการของโครงการได้สิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้จัดการโครงการจะต้องรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ (Project decision-making) เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานโครงการว่าประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดการปฏิบัติงานสำหรับโครงการ

ความหมายการยุติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ประชุม รอดประเสริฐ (2535) อธิบายความหมายการยุติโครงการ (Project termination) หรือการปิดโครงการ (Project closing) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารโครงการ เมื่อโครงการสิ้นสุดลงตามกำหนดเวลาโดยประธานโครงการจะต้องรายงานผลการประเมินผลโครงการ (Evaluation report) ต่อผู้บริหารระดับสูงตามสายบังคับบัญชา

ปกรณ์ ปรียากร (2557, น. 9) อธิบายความหมายการยุติโครงการเป็นขั้นตอนการสรุปงานขั้นสุดท้าย การตรวจสอบความเรียบร้อยหรือความสมบูรณ์ จากนั้นจึงจะดำเนินการยุติโครงการพร้อมกับการส่งมอบและถ่ายโอนโครงการ (Project completion & handover) ให้กับหน่วยงานที่จะดำเนินงานในภาวะปกติเพื่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อไป

กฤษฎา กิตติโสภโณ (2558, น. 90–91) อธิบายความหมายการยุติโครงการ คือ การยกเลิกหรือสิ้นสุดการดำเนินโครงการ โดยมีขั้นตอนการปิดโครงการเริ่มจากการตรวจเช็กผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดงานแล้วเสร็จ มีการประชุมเพื่อสรุปและปิดกิจกรรมการดำเนินงาน การจัดทำรายงานปิดโครงการ การประเมินผลโครงการ และสุดท้ายคือส่งมอบโครงการ

จากความหมายต่างๆ ข้างต้น สรุปได้ว่า “การยุติโครงการ” หมายถึง การสิ้นสุดโครงการ อาจด้วยสาเหตุใดก็ตาม การยุติโครงการเป็นขั้นตอนสุดท้ายของขั้นตอนการบริหารโครงการ โดยเป็นขั้นการตรวจสอบความเรียบร้อยหรือความสมบูรณ์ จากนั้นจึงดำเนินการยุติโครงการพร้อมกับการส่งมอบให้กับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปปรับปรุงต่อ ทั้งนี้ประธานโครงการจะเป็นผู้เสนอรายงานการปิดโครงการ การประเมินผลโครงการ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูงตามสายบังคับบัญชาได้ทราบ

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการยุติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การยุติโครงการเป็นขั้นตอนที่สำคัญในวงจรของโครงการหรือการบริหารโครงการเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยทั่วไปการยุติโครงการมีทั้งแบบการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือตามแผนโครงการที่วางไว้ แต่เนื่องจากการดำเนินโครงการมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาอุปสรรคภายในโครงการ ทั้งนี้โครงการอาจมีการยุติได้ในลักษณะที่โครงการยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเวลาที่กำหนด ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการยุติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรดังนี้

1. โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ผลงานตามที่ต้องการ ตามงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด เป็นการยุติโครงการตามกำหนดเวลาในสภาพปกติ มีการร่วมงานโครงการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. โครงการอาจมีการยกเลิกการดำเนินงานก่อนที่โครงการจะดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนดไว้ เมอรีดธและแมนเต็ล (Meredith and Mantel, 2000) อธิบายว่า การยกเลิกโครงการมาจากปัจจัยดังนี้

2.1 การวางแผนโครงการ

2.1.1 การกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการที่เร่งรัดเกินไป

2.1.2 การกำหนดงบประมาณดำเนินงานโครงการต่ำเกินกว่าจะดำเนินงานให้สำเร็จได้

2.1.3 ขาดการศึกษาความเป็นไปได้ (Reasibility study) ของโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่ โครงการที่มีกิจกรรมที่ซับซ้อนหรือโครงการใหม่

2.1.4 ขาดการวางแผนในการดำเนินโครงการ ทำให้ขาดความชัดเจนของที่มาของโครงการ ขาดความมั่นใจในการริเริ่มโครงการ

2.2 การบริหารคณะทำงานโครงการ

2.2.1 ผู้บริหารโครงการไม่มีความชำนาญในการบริหาร

2.2.2 ขาดความสัมพันธ์และการสื่อสารภายในคณะทำงานที่ดี

2.2.3 ทีมงานไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาสำคัญ

2.2.4 ขาดการมีส่วนร่วมผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ จึงนำไปสู่การยกเลิกโครงการเพราะผลผลิตจากโครงการไม่เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริง

2.2.5 ขาดการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากระดับบริหาร อาจจะเนื่องจากไม่มีเวลาไม่ได้รับความสนใจเช่นเดิม ซึ่งทำให้โครงการนี้เกิดความเสี่ยงในการที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือพันธกิจหรือยุทธศาสตร์ของนโยบายหรือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อาจจะเปลี่ยนไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

2.3 การประสานงาน

2.3.1 ขาดการประสานงานกับองค์การแม่

2.3.2 ขาดการประสานงานกับผู้ใช้หรือผู้รับบริการหรือสาธารณชนเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ

2.3.3 ขาดการประสานงานกับองค์กรหรือบุคลากรของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

2.3.4 ขาดการกำกับติดตามและควบคุมการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและเหมาะสม โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีกิจกรรมซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และไม่ได้นำผลการติดตามผลมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอย่างเพียงพอ

2.5 ด้านเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการ

2.5.1 เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้ในการดำเนินโครงการไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วน เพราะไม่ได้ใส่ใจกับความจำเป็นและลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วนจึงต้องยกเลิกไปดำเนินโครงการที่ลำดับความสำคัญสูงๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแทน

2.5.2 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้ลดลง ทำให้คุณค่าของโครงการและประสิทธิภาพในการบริหารโครงการถูกจำกัดลง

2.5.3 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการจากความต้องการของผู้บริหารโครงการรายละเอียดของโครงการตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการหรือความจำเป็นมีผลการประเมินแล้วไม่คุ้มค่า

2.5.4 โครงการหมดความจำเป็นต่อกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่จึงยกเลิกโครงการไปตามสถานการณ์

2.5.5 การเสร็จสิ้นโครงการเมื่อผิดเงื่อนไขหรือสัญญา กล่าวคือ ดำเนินการไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือสัญญาที่กำหนดไว้ทั้งในแง่ของงบประมาณ ระยะเวลา คุณภาพของผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนการยุติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเมื่อจำเป็นต้องยุติลง ไม่ว่าจะมาจากการเสร็จสิ้นโครงการ หรือโครงการไม่ประสบความสำเร็จ จะมีขั้นตอนการยุติโครงการดังนี้

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากโครงการ แผนงานโครงการที่ใช้ได้หรือไม่ได้และปัญหาอุปสรรคที่พบและแนวทางแก้ไข รวมทั้งข้อมูลสำคัญจากการดำเนินโครงการเพื่อนำไปปรับปรุงโครงการอื่นๆ

2. ประชุมเพื่อกำหนดแผนการยุติโครงการโดยการตรวจสอบว่ามีงานอะไรต้องทำในการปิดโครงการ ใครรับผิดชอบกิจกรรมใดในโครงการ การยุติโครงการเริ่มเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร และส่งมอบโครงการอย่างไร

3. รับแผนการยุติโครงการ

4. เตรียมการโครงการตามแผนและกำหนดตารางเวลางานที่ต้องทำในการยุติโครงการ

5. การปฏิบัติตามแผนการยุติโครงการ ประกอบด้วยงาน ดังนี้

1) ส่งมอบผลงานและหลักฐานให้กับองค์กร หน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้บริหารโครงการ

2) จัดส่งบุคลากรและทรัพยากรของโครงการคืนต้นสังกัด

3) ปิดบัญชีการเบิกจ่ายงบประมาณและทรัพยากร

4) ปิดสำนักงานโครงการ

6. จัดทำรายงานขั้นสุดท้ายของโครงการ ควรมีประเด็น ดังนี้

1) โครงการมีวัตถุประสงค์อะไร ผลของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไร เหตุใดจึงมีความแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของโครงการ

2) ผลการบริหารโครงการในทางปฏิบัติทำได้หรือไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใดจึงมีปัญหาในการบริหารโครงการ รวมทั้งมีการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

3) ผู้บริหารโครงการควรระบุว่าโครงสร้างองค์กรมีส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารโครงการอย่างไร และควรบอกว่าแนวทางการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จควรมีเทคนิคการบริหารโครงการอย่างไร

การนำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไปใช้ประโยชน์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เสร็จสิ้นโครงการแล้ว จะนำความรู้หรือผลลัพธ์ของโครงการไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน ดังนี้

1. การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย ความรู้ที่ได้จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไปใช้ในกระบวนการกำหนดนโยบาย แนวทาง กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นหรือระดับหน่วยงาน นโยบายที่ดีจะต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ แนวทางและกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ การ

ใช้ประโยชน์ด้านนโยบายจะรวมทั้งการนำองค์ความรู้ไปสังเคราะห์เป็นนโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย (Policy options) แล้วนำนโยบายไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์

2. การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ นวัตกรรมที่ได้จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ทางสังคม เกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ โดยการนำเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ได้จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การสร้างตราสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต

4. การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่ การนำกระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลง แนวทางการส่งเสริม อันเป็นผลมาจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์การขยายผลต่อชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอื่น

5. การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ การนำองค์ความรู้จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ด้านวิชาการผ่านการนำเสนอสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการสอนและสื่อสารสนเทศต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำผลลัพธ์ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไปต่อยอดเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กิจกรรม 9.3.3

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยุติก่อนการดำเนินการจนสิ้นสุดโครงการ

แนวตอบกิจกรรม 9.3.3

โครงการอาจมีการยกเลิกการดำเนินงานก่อนที่โครงการจะดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งมาจากปัจจัยดังนี้

1. ขาดการศึกษาความเป็นไปได้ (Reasibility study) ของโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่ โครงการที่มีกิจกรรมที่ซับซ้อนหรือโครงการใหม่

2. ขาดการวางแผนในการดำเนินโครงการ ทำให้ขาดความชัดเจนของที่มาของโครงการ ขาดความมั่นใจในการริเริ่มโครงการ

3. ขาดการมีส่วนร่วมผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ จึงนำไปสู่การยกเลิกโครงการเพราะผลผลิตจากโครงการไม่เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริง

4. ขาดการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากระดับบริหาร อาจจะเนื่องจากไม่มีเวลา ไม่ได้รับความสนใจเช่นเดิม ซึ่งทำให้โครงการนี้เกิดความเสี่ยงในการที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ หรือพันธกิจหรือยุทธศาสตร์ของนโยบายหรือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อาจจะเปลี่ยนไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

5. ขาดการประสานงานกับองค์กรหรือบุคลากรของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

6. ขาดการกำกับติดตามและควบคุมการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและเหมาะสมโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีกิจกรรมซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

7. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้ลดลง ทำให้คุณค่าของโครงการและประสิทธิภาพในการบริหารโครงการถูกจำกัดลง

8. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการจากความต้องการของผู้บริหารโครงการ รายละเอียดของโครงการตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการหรือความจำเป็นมีผลการประเมินแล้วไม่คุ้มค่า

9. โครงการหมดความจำเป็นต่อกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่จึงยกเลิกโครงการไปตามสถานการณ์

10. การเสร็จสิ้นโครงการเมื่อผิดเงื่อนไขหรือสัญญา กล่าวคือ ดำเนินการไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือสัญญาที่กำหนดไว้ทั้งในแง่ของงบประมาณ ระยะเวลา คุณภาพของผลการดำเนินงาน

ตอนที่ 9.4
กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.4 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง

9.4.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐ
9.4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาคเอกชน
9.4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐร่วมกับเอกชน

แนวคิด

1. กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมการเกษตรในองค์การภาครัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยหน่วยงานของภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญทางการเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากันเอง
2. กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในองค์การภาคเอกชน เป็นโครงการที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยหน่วยงานของภาคเอกชน เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจภายในองค์กร มีการกำหนดนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจภาคเอกชนชัดเจน และการดำเนินโครงการต้องผ่านการอนุมัติโครงการผ่านการเห็นชอบจากประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท
3. กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐร่วมกับเอกชน เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภายใต้การดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ มีการบูรณาการความรู้ และนวัตกรรม จนกระทั่งนำไปสู่การเป็นสังคมแบบบูรณาการฐานความรู้ร่วมกัน

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาตอนที่ 9.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายลักษณะโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐได้
2. อธิบายลักษณะโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาคเอกชนได้
3. อธิบายลักษณะโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐร่วมกับเอกชนได้

เรื่องที่ 9.4.1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐ

ลักษณะโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของภาครัฐ

วงจรโครงการขององค์การภาครัฐ (ปกรณ์ ปรียากร, 2557, น. 10–12) อธิบายว่า เป็นข้อกำหนดที่ได้จากนโยบายของรัฐบาลในด้านการบริหารรัฐกิจและการบริหารการพัฒนาเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์รัฐบาลและกลยุทธ์ของหน่วยงานของรัฐถือเป็นจุดศูนย์กลางของวงจรโครงการ จากนั้นจึงมีการดำเนินงานตามวาระหรือตามขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการวางแผน การประเมิน และการจัดทำโครงการ (Planning, appraisal and design) อันประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ

1.1 การระบุและกำหนดแนวคิดโครงการ (Project identification and formulation)

1.2 การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ และการประเมินความเหมาะสมโครงการ (Feasibility studies and appraisal)

1.3 การออกแบบหรือการวางแผนในรายละเอียดด้านต่างๆ ของโครงการ (Project design)

2. ขั้นตอนการคัดเลือก การอนุมัติ และการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงาน (Selection, approval and activation) อันประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ

2.1 การคัดเลือกและอนุมัติโครงการ (Selection and approval)

2.2 การเตรียมการด้านต่างๆ หรือการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดที่จำเป็นก่อนการดำเนินงาน (Project activation)

3. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ การควบคุม การยุติและการส่งมอบ (Project operation, control and handover) อันประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ

3.1 การปฏิบัติการ (Implementation)


3.2 การกำกับดูแลและควบคุม (Supervision and control)

3.3 การยุติและการส่งมอบโครงการ (Completion and handover)

4. การประเมินผลและการกลั่นกรองในรายละเอียด (Evaluation and refinement) อันประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ

4.1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (Follow-up evaluation)

4.2 การปรับนโยบายและแผน (Refinement of policy and planning)

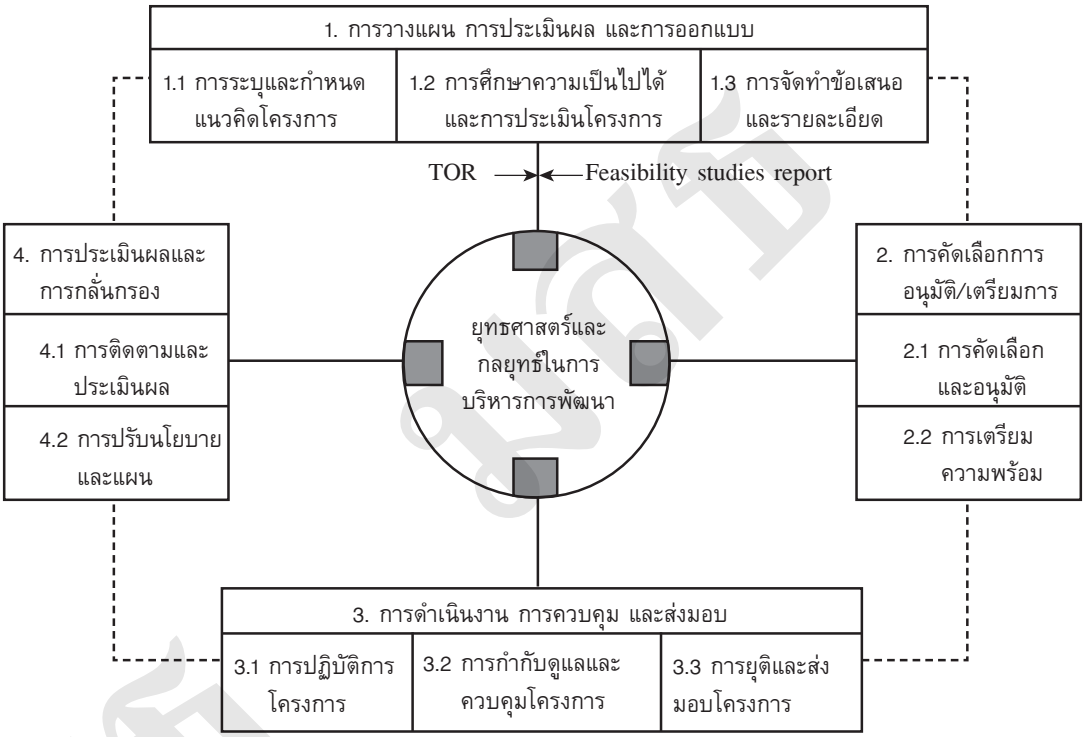

ภาพที่ 9.7 วงจรขององค์การภาครัฐ

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐเป็นโครงการที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำหนดโครงการขึ้นจากนโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กร มาจากแผน/ยุทธศาสตร์หรือแนวคิดที่จะพัฒนาหรือแก้ปัญหาทางการเกษตรที่เกิดขึ้น รวมถึงการบริหารโครงการ การติดตามและประเมินผลด้วยหน่วยงานจากภาครัฐ ตัวอย่างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐ ดังนี้

1. **ชื่อโครงการ:** โครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. **หน่วยงานที่รับผิดชอบ:** สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
3. **หลักการและเหตุผล:**

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนที่สำคัญแนวทางหนึ่ง ได้แก่ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับไปสู่การทำเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมและเร่งขยายผล แนวคิดทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

สภาเกษตรกรแห่งชาติมีกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเกษตรกรในระดับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนั้นๆ และเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลในอำเภอนั้นๆ ในการรับข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และเสนอความต้องการแก้ไขปัญหา เพื่อเชื่อมโยงส่งไปยังสภาเกษตรกรจังหวัด/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ดำเนินการประมวลข้อเท็จจริงของปัญหา จัดทำข้อเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหา เป็นการจัดการปัญหาจากล่างสู่บน ในขณะเดียวกันสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดก็สามารถดำเนินนโยบาย โครงการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผ่านกลไกสภาเกษตรกรจังหวัดลงสู่เครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอ และสภาเกษตรกรตำบลลงสู่เกษตรกรจากบนลงล่างเช่นเดียวกัน ดังนั้นสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลการเกษตรตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบเกษตรรมยั่งยืน พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร อีกทั้งสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับประยุกต์ใช้พัฒนากิจกรรมเกษตรในฟาร์ม ตลอดจนรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

4. วัตถุประสงค์:

4.1 เพื่อสร้างเกษตรกรสัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ ตำบลละ 1 ศูนย์/ราย

4.2 เพื่อขยายผลการทำเกษตรจากศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ ตำบลละ 1 ศูนย์ สู่เกษตรกรในหมู่บ้าน เป้าหมายตำบลละ 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 ราย

5. เป้าหมาย: เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลละ 1 ศูนย์/ราย รวม 3 ปี จำนวน 5,139 ศูนย์ 1 ราย

6. ระยะเวลา: รวม 3 ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562–2564

7. วิธีดำเนินการ:

7.1 กิจกรรมที่ 1 สร้างเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลทั่วประเทศ ตำบลละ 1 ศูนย์

7.1.1 ขั้นที่ 1 สร้างกลไกเพื่อดำเนินโครงการ

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบส่วนกลาง ซึ่งมีองค์ประกอบรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ ผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวม 21 คน โดยประชุมปีละ 6 ครั้ง

2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ซึ่งมีองค์ประกอบรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน จังหวัดละ 35 ราย โดยประชุมปีละ 6 ครั้ง

7.1.2 ขั้นที่ 2 คัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลทั่วประเทศ ตำบลละ 1 ศูนย์

7.1.3 ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลที่คัดเลือกไว้ให้มีความพร้อมเป็นศูนย์ต้นแบบเพื่อการเผยแพร่ความรู้

7.1.4 ขั้นที่ 4 จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจแนวทางดำเนินโครงการและติดตามผลการดำเนินโครงการ โดยดำเนินการจัดประชุมสัมมนาแก่เกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.2 กิจกรรมที่ 2 ขยายผลการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.2.1 ขั้นที่ 1 คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย

1) พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านขยายผลโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลละ 1 หมู่บ้าน รวม 5,439 หมู่บ้าน

2) จัดอบรมหลักสูตร “การสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร” แก่อาสาสมัครช่วยสำรวจข้อมูล จำนวน 5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ราย รวม 5,439 ราย หลักสูตร 3 วัน

3) อาสาสมัครดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยอาสาสมัครปฏิบัติงานสำรวจหมู่บ้านละ 1 คน ระดมความคิดเห็นสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของเกษตรกรและนำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน

7.2.2 ขั้นที่ 2 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่

1) จัดประชุมเกษตรกร เพื่อเริ่มดำเนินกิจกรรมเกษตรในหมู่บ้านขยายผลแก่เกษตรกร รวม 3 ปี 5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 ราย รวม 163,170 ราย หลักสูตร 4 วัน

2) มิติเกษตรกรรม ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตในหมู่บ้านตามชนิดพืช/ปศุสัตว์/สัตว์น้ำ หรือตามลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืนที่จะดำเนินการ เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.2.3 ขั้นที่ 3 การติดตามความก้าวหน้าโครงการ สภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการ ดำเนินโครงการ เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จังหวัดละ 2 ราย จำนวน 77 จังหวัด รวม 154 ราย ออกปฏิบัติงานติดตามผลการปฏิบัติงานรวม 5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน

8. แผนปฏิบัติงาน:

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมายเกษตรกร (คน)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานรับผิดชอบ
			ปี 62	ปี 63	ปี 64	
กิจกรรมที่ 1 สร้างกลไกเพื่อดำเนินโครงการและสร้างศูนย์สัมมาชีพต้นแบบระดับตำบล						
ขั้นที่ 1 สร้างกลไกเพื่อดำเนินโครงการ						
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ	21 คน ปีละ 6 ครั้ง	1,254,960	418,320	418,320	418,320	สกช. สกจ.
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการระดับจังหวัด	35 คน ปีละ 6 ครั้ง	44,561,700	14,853,900	14,853,900	14,853,900	คกก.โครงการ
ขั้นที่ 2 คัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบระดับตำบล	5,439 ศูนย์/ตำบล	-	-	-	-	
ขั้นที่ 3 พัฒนาศูนย์สัมมาชีพต้นแบบระดับตำบล	5,439 ราย	4,296,600	1,432,200	1,432,200	1,432,200	สกจ.
ขั้นที่ 4 จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจแนวทางดำเนินโครงการและติดตามผลการดำเนินโครงการ	หลักสูตร 2 วัน	16,791,360	5,597,120	5,597,120	5,597,120	สกจ.
กิจกรรมที่ 2 ขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ						
ขั้นที่ 1 คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย พัฒนาองค์ความรู้และกำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา						
1.1 พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านขยายผลโครงการตำบลละ 1 หมู่บ้าน	5,439 หมู่บ้าน	-	1,813 หมู่บ้าน	1,813 หมู่บ้าน	1,813 หมู่บ้าน	คกก. โครงการ สกจ.
1.2 จัดอบรมแก่อาสาสมัคร	5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 ราย รวม 163,170 ราย	83,766,600	27,922,200	27,922,200	27,922,200	สกจ. กษ. สกจ.

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมายเกษตรกร (คน)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานรับผิดชอบ
			ปี 62	ปี 63	ปี 64	
1.3 อาสาสมัคร สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรและรับสมัครเกษตรกรไปศึกษาดูงาน	5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 ราย รวม 54,390 ราย	20,870,400	69,568,000	69,568,000	69,568,000	
ขั้นที่ 2 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ จัดประชุมชาวบ้านเพื่อเริ่มดำเนินกิจกรรมเกษตรในหมู่บ้านขยายผล	5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 ราย รวม 163,170 ราย และรวมตัวจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร 5,439 กลุ่ม/องค์กร แยกเป็น 3 ปี	471,508,200	157,169,400	157,169,400	157,169,400	พนักงาน สกจ. สมาชิก สกจ.
ขั้นที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ติดตามความก้าวหน้าหมู่บ้านขยายผลโครงการ	77 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน รวม 154 คน ปฏิบัติงาน 5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 วัน	4,851,000	1,617,000	1,617,000	1,617,000	
รวมกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2		**835,736,370**	**278,578,790**	**278,578,790**	**278,578,790**	

9. งบประมาณโครงการ: เป็นเงิน 835,736,370 บาท

(แปดร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

10. ตัวชี้วัด:

10.1 เชิงปริมาณ มีเกณฑ์วัดดังนี้

10.1.1 ร้อยละ 70 ของเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล สามารถพัฒนากิจกรรมเกษตรในฟาร์มได้อย่างน้อย 3 กิจกรรม

10.1.2 ร้อยละ 70 ของหมู่บ้านเป้าหมาย สามารถขยายผลทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

10.2 เชิงคุณภาพ มีเกณฑ์วัดดังนี้

10.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้านขยายผลสามารถดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมให้บริการสมาชิก รวม 3 ปี 3,263 องค์กรเฉลี่ยปริมาณธุรกิจองค์กรละ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 48.95 ล้านบาท

10.2.2 ร้อยละ 70 ของเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายขยายผลสามารถลดรายจ่ายทางการเกษตร โดยสามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ยปีละ 14,400 บาท/ครัวเรือน รวม 114,219 ราย มูลค่า 1,644 ล้านบาท

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

11.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลดความเสี่ยงจากการผลิตเชิงเดี่ยวเกิดความมั่งคงในอาชีพ

11.2 เกษตรกรสามารถพัฒนาองค์ความรู้การทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเทคโนโลยี/นวัตกรรมไปปรับประยุกต์ใช้ต่อยอดกิจกรรมเกษตรที่ทำอยู่เดิม

11.3 เกิดความร่วมมือของเกษตรกรในพื้นที่รวมกลุ่มดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้น

11.4 เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม 9.4.1

โครงการส่งเสริมการเกษตรในองค์การภาครัฐ มีส่วนประกอบใดบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 9.4.1

โครงการส่งเสริมการเกษตรในองค์การภาครัฐ ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้

1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. หลักการและเหตุผล
4. วัตถุประสงค์
5. เป้าหมาย
6. ระยะเวลา
7. วิธีดำเนินการ
8. แผนปฏิบัติงาน
9. งบประมาณโครงการ
10. ตัวชี้วัด
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เรื่องที่ 9.4.2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาคเอกชน

ลักษณะโครงการขององค์การภาคเอกชน


ลักษณะโครงการขององค์การภาคเอกชนอธิบายได้เป็นวงจรโครงการ โดย ปกรณ์ ปรียากร (2557, น. 8–9) อธิบายว่าวงจรโครงการขององค์การภาคเอกชน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนต่อเนื่องกัน คือ

1. ขั้นตอนการกำหนดแนวคิดโครงการ (Conceptualization or initiate project ideas) กิจการธุรกิจขนาดใหญ่จะมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีความเป็นมืออาชีพ (Professional managing director) เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดแนวคิดโครงการต่างๆ (Project ideas) เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดโครงการ (Terms of reference or TOR)

2. ขั้นตอนการวางแผนโครงการ (Project planning) เป็นการนำเงื่อนไขหรือข้อกำหนดหรือ TOR ที่วางไว้ไปวางแผนโครงการเบื้องต้น ติดตามด้วยการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านต่างๆ หลังจากนั้นจึงเสนอผลการประเมินโครงการให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในโครงการต่อไป

3. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ (Project implementation) เป็นการมอบหมายให้ทีมงานภายในองค์กรภาคเอกชนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่ผู้บริหารกำหนด ทั้งนี้มีผู้จัดการโครงการ (Project manager) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานร่วมกับทีมงาน

4. ขั้นตอนการยุติโครงการ (Project termination) เป็นการสรุปงานขั้นสุดท้าย ตรวจสอบความเรียบร้อยหรือความสมบูรณ์ จากนั้นจึงจะดำเนินการยุติโครงการพร้อมกับการส่งมอบและถ่ายโอนโครงการ (Project completion & handover) ให้กับทีมงานที่จะดำเนินงานในภาวะปกติเพื่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อไป

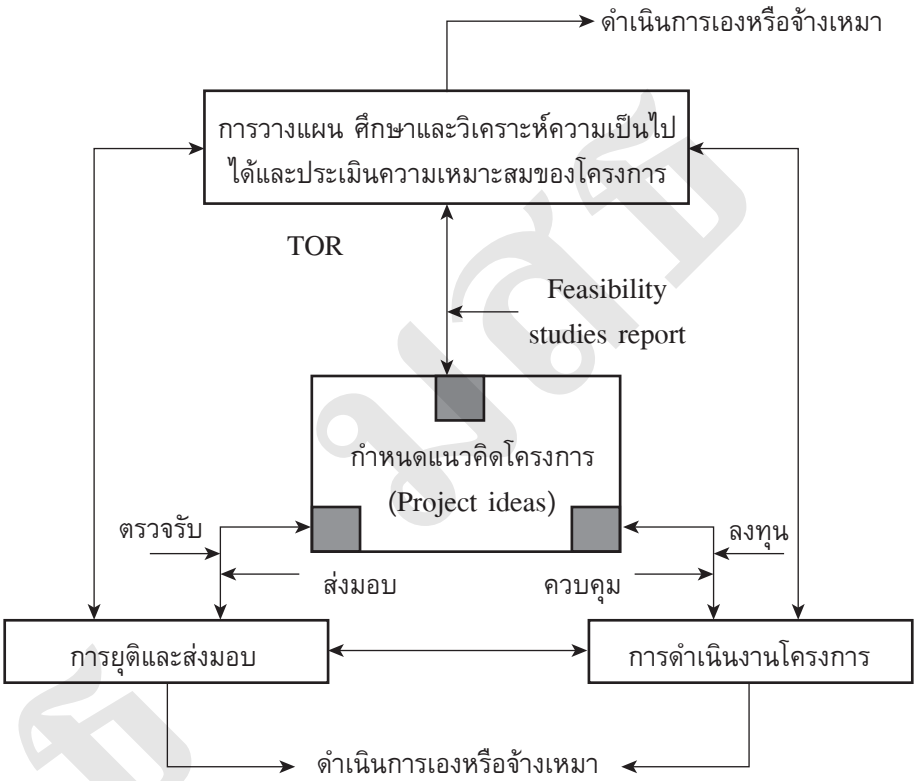

ภาพที่ 9.8 วงจรขององค์การภาคเอกชน

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในองค์การภาคเอกชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในองค์การภาคเอกชนเน้นการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบพันธสัญญาในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน (อัจฉรา จิตตลดากร และคณะ, 2551) การทำโครงการการเกษตรแบบมีสัญญา เป็นการพัฒนาการเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรมีหลักประกันในการประกอบอาชีพ ได้รับเทคนิควิทยาการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต และเพิ่มช่องทางการตลาด ช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงด้านการตลาด นอกจากนี้การเกษตรแบบมีสัญญาช่วยให้พ่อค้า ผู้ส่งออก หรือโรงงานแปรรูปได้รับผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ตัวอย่างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในองค์การภาคเอกชน ดังนี้

1. **ชื่อโครงการ:** โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบพันธสัญญาในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ:** บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. **ที่มาและความสำคัญ:**

บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำธุรกิจภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้แปรรูปและผู้ขาย โดยเฉพาะเกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญแต่เกษตรกรมักขาดอำนาจต่อรองทางการตลาด และไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการที่มีการประสานงานหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตโดยเกษตรกรต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมด เช่น ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสียหายทางกายภาพ กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ผิดหลักวิชาการและราคา ตลอดจนความความล้มเหลวในด้านการเพาะปลูกต่างๆ วิธีการหนึ่งที่จะช่วยเกษตรกรลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและมีตลาดที่รับซื้อที่แน่นอน คือ การเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract farming) ซึ่งรูปแบบการเกษตรแบบพันธสัญญานี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าและเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งเกษตรกรและผู้รับซื้อ และแม้ว่ารูปแบบการเกษตรแบบพันธสัญญาจะมีการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรนำรูปแบบไปใช้ประโยชน์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่เกษตรกรรายย่อยจำนวนมากยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มที่และมีผู้ที่นำระบบการเกษตรแบบพันธสัญญาไปใช้ประโยชน์โดยขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ขาดการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายธุรกิจรวมทั้งการขาดที่ปรึกษาที่ดี ดังนั้น บริษัทริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้จัดทำโครงการทางการเกษตรแบบมีสัญญาโดยบริษัททำข้อตกลงผ่านทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน โดยกำหนดข้อตกลงด้านราคา กฎระเบียบ วันที่เก็บเกี่ยว และวิธีการซื้อ ซึ่งอาจเป็นการซื้อแบบเหมารวมหรือคละ และแบ่งเกรดคุณภาพจากนั้นเกษตรกรผลิตข้าวโพดหวานตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนดแล้วนำส่งโดยตรงให้บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทั้งนี้บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบมีสัญญาในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรแบบพันธสัญญาให้กับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

4. วัตถุประสงค์:

4.1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรแบบพันธสัญญาให้กับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

4.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวโพดฝักอ่อนจากการส่งเสริมการเกษตรแบบพันธสัญญา

5. วิธีดำเนินการ:

5.1 บริษัทฯ ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบพันธสัญญาในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

5.2 บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำการเซ็นสัญญากับเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ โดยบริษัททำข้อตกลงผ่านทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน โดยกำหนดข้อตกลงด้านราคา กฎระเบียบ วันที่เก็บเกี่ยวและวิธีการซื้อ ซึ่งอาจเป็นการซื้อแบบเหมารวมหรือคละและแบ่งเกรดคุณภาพจากนั้นเกษตรกรผลิตข้าวโพดตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนดแล้วนำส่งโดยตรงให้บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

5.3 บริษัทฯ ทำสัญญากับเกษตรกรโดยตรงโดยการให้สินเชื่อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด พร้อมกับคำแนะนำตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนการขนส่งผลผลิต

5.4 บริษัทฯ ทำสัญญาผู้รวบรวม (คนกลาง) โดยคนกลาง 1 คนอาจมีเกษตรกรซึ่งเป็นคู่ค้ามากกว่า 100 คน ทั้งนี้บริษัทฯ จัดสรรเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรในรูปสินเชื่อ และคำแนะนำทางเทคนิคเท่านั้น

ส่วนคนกลางอาจให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่เกษตรกรในสังกัด เช่น การเตรียมดิน ปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวและการขนส่งแล้วแต่กรณี

5.5 บริษัทฯ ประชุมคณะติดตามและประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาโครงการ

5.6 สรุปผลการดำเนินโครงการ

6. วันที่ดำเนินโครงการ:

วันที่ 1 มีนาคม–30 กันยายน 2550

7. สถานที่ดำเนินโครงการ:

บ้านลาดทอง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

8. งบประมาณโครงการ:

1,500,000 บาท

9. การติดตามและประเมินผลโครงการ:

โดยสรุปบทเรียนร่วมกับเกษตรกร เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และเพื่อพัฒนาการเกษตรพันธสัญญาในทุกมิติ

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

10.1 เกษตรกรเกิดองค์ความรู้ และเข้าใจในห่วงโซ่คุณค่าหลักการและวิธีการ Contract farming ทำให้ไทยมีการพัฒนาทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนเพิ่มขึ้น

10.2 บริษัทฯ สามารถปรับโควตาและช่วยเหลือแก่เกษตรกรในโครงการได้อย่างทั่วถึง

10.3 บริษัทสามารถปรับราคารับซื้อผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนให้เหมาะสมกับตลาดและมีข้อมูลด้านราคาที่เป็นปัจจุบัน

กิจกรรม 9.4.2

โครงการส่งเสริมการเกษตรในองค์การภาคเอกชน มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 9.4.2

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาคเอกชน ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้

1. ชื่อโครงการ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ที่มาและความสำคัญ
4. วัตถุประสงค์
5. วิธีดำเนินการ
6. วันที่ดำเนินโครงการ
7. สถานที่ดำเนินโครงการ
8. งบประมาณโครงการ
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เรื่องที่ 9.4.3
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐร่วมกับเอกชน

ลักษณะโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐร่วมกับเอกชน

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางการเกษตรให้กับเกษตรกรด้วยกระบวนการความร่วมมือ เริ่มตั้งแต่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตร ให้มีทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นคณะทำงาน เพื่อดำเนินการขั้นเตรียมการทั้งการประมาณการผลผลิต การประสานกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อวางแผนโครงการ การกำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการมาตรการจูงใจและการบริหารโครงการ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกัน

1. เป็นโครงการที่สนองนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความต้องการภายในองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะใช้สำหรับแก้ปัญหาทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ การดำเนินการมีการบูรณาการความรู้และนวัตกรรมจนกระทั่งนำไปสู่การเป็นสังคมแบบบูรณาการฐานความรู้ร่วมกัน

2. มีการตั้งวัตถุประสงค์โครงการสำหรับการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรสำหรับเกษตรกร รวมถึงการกำหนดมีวิธีการดำเนินโครงการที่เหมาะสม และสามารถแก้ปัญหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ร่วมกัน

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรต้องเป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบทั้งจากคณะทำงานของหน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการบริษัทภาคเอกชน รวมทั้งมีการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานโครงการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ความร่วมมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่โครงการส่งเสริมการเกษตรภายหลังจากได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการร่วมกัน

4. รายงานผลการวิจัยร่วมกัน โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอาจเป็นรายงานรูปแบบหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือผสมผสานรูปแบบการรายงานกัน

5. การเสนอรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อโครงการแล้วเสร็จหัวหน้าโครงการนำเสนอรายงานให้กับคณะกรรมการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อทราบผลการดำเนินโครงการ

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐร่วมกับเอกชน

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐร่วมกับเอกชน เป็นโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยอาศัยความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

สถาบันการเงิน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวที่ล้นตลาด และเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่สำคัญ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) ดังนี้

1. ชื่อโครงการ: โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

2. หลักการและเหตุผล:

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปี และปัจจุบันพบว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดภาครัฐได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาเพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ไม่ถูกต้องและเพิ่มพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง เพื่อให้มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพียงพอกับความต้องการ และกระจายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดและดำเนินการเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ โดยสนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับเกษตรกรในการลดรอบการปลูกข้าว อันเป็นการสร้างสมดุลอุปสงค์อุปทาน เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการปรับแผนการผลิตให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

3. วัตถุประสงค์:

3.1 เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

3.2 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง

3.3 เพื่อให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ

4. เป้าหมาย: พื้นที่ดำเนินการจำนวน 2 ล้านไร่

5. พื้นที่ดำเนินการ:

ดำเนินการในพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งทดแทนพื้นที่นาปรังในเขตชลประทาน และพื้นที่นาอื่นๆ ที่มีแหล่งน้ำตลอดฤดูเพาะปลูก 33 จังหวัด

ภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี

ภาคกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสระบุรี

ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี

6. ระยะเวลาดำเนินการ: กันยายน 2561–กันยายน 2562

7. วิธีการดำเนินงาน:

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตร เพื่อดำเนินการปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตรภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต ประกอบด้วย คณะทำงานด้านต่างๆ จำนวน 4 คณะ ได้แก่

1) คณะทำงานคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญหรือมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ

2) คณะทำงานด้านการประสานงานการตลาดสำหรับเกษตรกร

3) คณะทำงานด้านส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

4) คณะทำงานด้านการกำหนดมาตรการแรงจูงใจในการผลิตตามแผนการผลิตทางการเกษตร ในการนี้คณะทำงานปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 การเตรียมการ หน่วยงานภายใต้คณะทำงานด้านการประสานงานการตลาดสำหรับเกษตรกรได้ร่วมกันดำเนินการ ดังนี้

7.1.1 การกำหนดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมการค้าภายใน ประสานกับภาคเอกชนในการเจรจาการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา วางระบบข้อมูลด้านการตลาดสำหรับกระจายจุดรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจในด้านราคาและตลาด

7.1.2 การวางแผนการรับซื้อสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมการค้าภายในร่วมกับภาคเอกชน วางแผนการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยประสานภาคเอกชนและสหกรณ์การเกษตรในการตกลงความร่วมมือกันทางด้านการตลาด (MOU) ในปริมาณผลผลิต คุณภาพของสินค้า ราคารับซื้อในเบื้องต้น ราคาตามกลไกตลาดที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

7.1.3 การพัฒนาศักยภาพแหล่งรวบรวมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาศักยภาพการรวบรวมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสถาบันเกษตรกรให้สถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรที่เป็นกลไกด้านการตลาดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้องค์ความรู้ด้านการตลาด สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและการเสริมสภาพคล่องแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรในการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพ

7.2 การกำหนดพื้นที่เป้าหมายและเขตส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา หน่วยงานภายใต้คณะทำงานคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญหรือมีผลต่อระบบเศรษฐกิจได้ร่วมกันดำเนินการ ดังนี้

7.2.1 การจัดทำขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย กรมชลประทานวิเคราะห์จัดทำขอบเขตพื้นที่เป้าหมายที่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนวางแผนและสนับสนุนการจัดสรรน้ำเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2 การสำรวจความต้องการเบื้องต้น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมชลประทานร่วมกันสำรวจความต้องการเบื้องต้นของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายและกำหนดเขตส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

7.2.3 การกำหนดผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่ในแต่ละระดับ เพื่อขับเคลื่อนและบริหารจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับกลุ่มผู้ผลิต ระดับ จังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ (ส่วนกลาง)

7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ได้แก่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ประธาน ศ.พ.ก. ระดับจังหวัด ประธานแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ผู้แทนสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ผู้แทนสมาคมการค้าพืชไร่ เกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) ทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการของจังหวัดและสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาระดับกระทรวง

2) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและบริหารจัดการการผลิต จนถึงการรับซื้อ ผลผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสถาบันเกษตรกร บริษัท/ผู้ประกอบการ

3) สนับสนุนให้มีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างเกษตรกรกับสถาบัน เกษตรกร บริษัท/ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม โดยระบุผู้รับซื้อ/ราคาซื้อ/ปริมาณรับซื้อ

4) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่เกษตรกร

5) ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ

6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาระดับกระทรวงมอบหมาย

7.4 การประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การจัดเวทีชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ให้ข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก การใช้พันธุ์ที่เหมาะสมและวิธีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

7.5 การขับเคลื่อนโครงการฯ โดยจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สถาบันการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และภาคเอกชน (ผู้รับซื้อผลผลิต ผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร)) เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เขตชลประทาน และแหล่งน้ำทั่วไป

7.6 การติดตามประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันประเมินผลโครงการ สรุปบทเรียนร่วมกับเกษตรกร เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในทุกมิติ

8. แผนปฏิบัติงาน:

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ		
1.1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชป. พด. กสก. และ กสส. เป็นต้น	ก.ย. 61	ชป. พด. กสก. และ กสส.
1.2 ประสานงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้นของเกษตรกร	1 ก.ย.–15 ต.ค. 61	ชป. พด. กสก. และ กสส.
1.3 วางแผนการตลาดและกำหนดราคากลาง	ต.ค. 61	กสส. สศก. ปศ. คน. และภาคเอกชน
1.4 จัดทำรายละเอียดกำหนดพื้นที่เป้าหมายและเขตการส่งเสริม	ต.ค. 61	ชป. พด. กสส. สปก. และ กสก.
2. การประชาสัมพันธ์ รับสมัครและขอรับสินเชื่อ	15 ต.ค.–15 พ.ย. 61	กสก. กสส. และ ธ.ก.ส.
3. การดำเนินงานในพื้นที่		
3.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจ และรับสมัครเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร	15 ต.ค.–15 พ.ย. 61	กสก. กสส. ชป. กข. และ พด.
3.2 ถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1 พ.ย. 61–15 ม.ค. 62	กสก. กสส. ชป. พด. และภาคเอกชน (บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์)

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ
3.3 จัดเวทีเพื่อวางแผนการตลาดร่วมกัน และแนะนำช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยการใช้แอปพลิเคชัน	ต.ค. 61	กสส. สศก. คน. กสก. ชป. ทีม ผู้จัดการพื้นที่ และภาคเอกชน
4. ประเมินผลและรายงาน	ต.ค. 61–ก.ย. 62	สศก.

9. งบประมาณ: จำนวน 416,678,000 บาท

10. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ:

หน่วยงานหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานสนับสนุน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัย ภาคเอกชนผู้ผลิตปัจจัยการผลิต และรับซื้อผลผลิต

11. การติดตามประเมินผล: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันประเมินผลโครงการ สรุปบทเรียนร่วมกับเกษตรกร เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในทุกมิติ

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

1) เพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านตัน สามารถลดการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่น

2) เกษตรกรได้มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการทำนาและลดการระบาดทำลายของแมลงศัตรูข้าวนำไปสู่การจัดระบบการปลูกและการผลิตสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

13. ผลผลิต (Output): เกษตรกรใน 33 จังหวัด ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาได้อย่างถูกต้อง

14. ผลลัพธ์ (Outcome):

1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 150,000 ครัวเรือน ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นไร่ละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท คิดเป็นผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี

2) อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ลดการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่นๆ ทดแทน

กิจกรรม 9.4.3

องค์ประกอบหัวข้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐร่วมกับเอกชน ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 9.4.3

องค์ประกอบหัวข้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาครัฐร่วมกับเอกชน ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. ชื่อโครงการ
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์
4. เป้าหมาย
5. พื้นที่ดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
7. วิธีการดำเนินงาน
8. แผนปฏิบัติงาน
9. งบประมาณ
10. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13. ผลผลิต (Output)
14. ผลลัพธ์ (Outcome)

บรรณานุกรม

กฤษฎา กิตติโสภโณ. (2558). *การจัดการโครงการขั้นสูง (Advanced Project Management).* เอกสารประกอบการสอน ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2561). โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา. *คู่มือโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา.* สืบค้นจาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER057/GENERAL/DATA0002/00002080.PDF

เกษม ศิริสุโขดม. (2550). *การประเมินผลโครงการ.* ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. สืบค้นจาก http://mail.oae.go.th/assess.pdf

ดิเรก ฤกษ์หร่าย. (2527). *การส่งเสริมการเกษตร: หลักและวิธีการ.* กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปกรณ์ ปรียากร. (2557). *การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสำเร็จ* (พิมพ์ครั้งที่ 16). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เสมาธรรม.

ประชุม รอดประเสริฐ. (2535). *การบริหารโครงการ* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เนติกุลการพิมพ์.

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. (2546). *การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติ* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมบัติ ธำรงค์ธัญวงค์. (2546). *นโยบายสาธารณะ* (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สมพิศ สุขแสน. (ม.ป.ป.). *"Log Frame": การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์.* สืบค้นจาก https://hss.moph.go.th/fileupload_doc_slider/2016-11-30--389.pdf

มยุรี อนุมานราชธน. (2546). *การบริหารโครงการ* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฤดี นิยมรัตน์. (2559). *การจัดการโครงการ.* เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการโครงการของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ-สวนสุนันทา.

หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร. (ม.ป.ป.) *เอกสารโสตทัศน์ชุดวิชา 91109* (เล่มที่ 1, หน่วยที่ 1-8). สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อัจฉรา จิตตลดากร, ทวีศักดิ์ ภู่หลำ, หฤษฎี ภัทรดิลก, ชยาพร วัฒนศิริ, ดลพร บุญพารอด, นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต และนายชัฐพล สายะพันธ์. (2551). *โครงการการศึกษารูปแบบและปัจจัยความสำเร็จของการเกษตรแบบมีสัญญาในการผลิตพืชของไทย.* รายงานฉบับสมบูรณ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สืบค้นจาก http://v-reform.org/wp-content/uploads/2012/08/Models-and-key-successes-of-contract-farming.pdf

Khalid, S. M. N., & Sherzed, S. (2019). *Agricultural Extension Manual for Extension Workers.* The Manual is produced under Food and Agriculture Organization of the United Nation. p. 42.

Meredith J. R., & Mantel, S. J. (2000). *Project Management: A Managerial Approach* (4th ed.). New York: John Willey & Sons Inc.
